



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
13/06/2024

Município Cotegipe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cotegipe	Responsável Márcia da Silva Sá Teles
Contato Luciano Dourado Gomes Baptista	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal (Utilização de saldo)

Endereço
Sede do Município

Convênio 51/22	Processo 069.1486.2023.0006099-93	Nº de Parcelas Utilização de saldo	Parcela Vistoriada Utilização de saldo
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio R\$ 933.332,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 394.190,16

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Cotegipe, onde foram vistoriados os serviços de utilização de saldo da obra de reforma do Estádio Municipal de Cotegipe, objeto do convênio nº 51/2022, no valor total de R\$ 394.190,16 (trezentos e noventa e quatro mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), sendo o saldo remanescente no valor de R\$ 362.183,29 (trezentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) e como contrapartida o valor de R\$ 32.006,87 (trinta e dois mil seis reais e oitenta e sete centavos), constatamos que a obra encontra-se em andamento, conforme descrição abaixo:
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO	CONVÊNIO 51/22		
	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Muro a ser construido	124.495,22	124.495,22	100,00%
Sanitário público	60.758,32	30.379,16	50,00%
Área de estacionamento na frente do estádio municipal	149.595,15	105.350,20	70,46%
Iluminação do campo	59.341,47	0,00	0,00%
TOTAL	394.190,16	260.224,58	66,01%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a utilização do saldo do convênio nº 51/22, no valor de R\$ 394.190,16 (Trezentos e noventa e quatro mil,cento e noventa reais e dezesseis centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo bragança	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 14/06/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes.	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coord. de Obras/SUDES
CAD: 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES

Claudio Jorge F. Bragança

Relatório fotográfico referente aos serviços de utilização de saldo da reforma
do Estádio Municipal de Cotegipe/Ba, convênio nº 51/2022.

Foto 01 – VISÃO DO MURO RECUPERADO

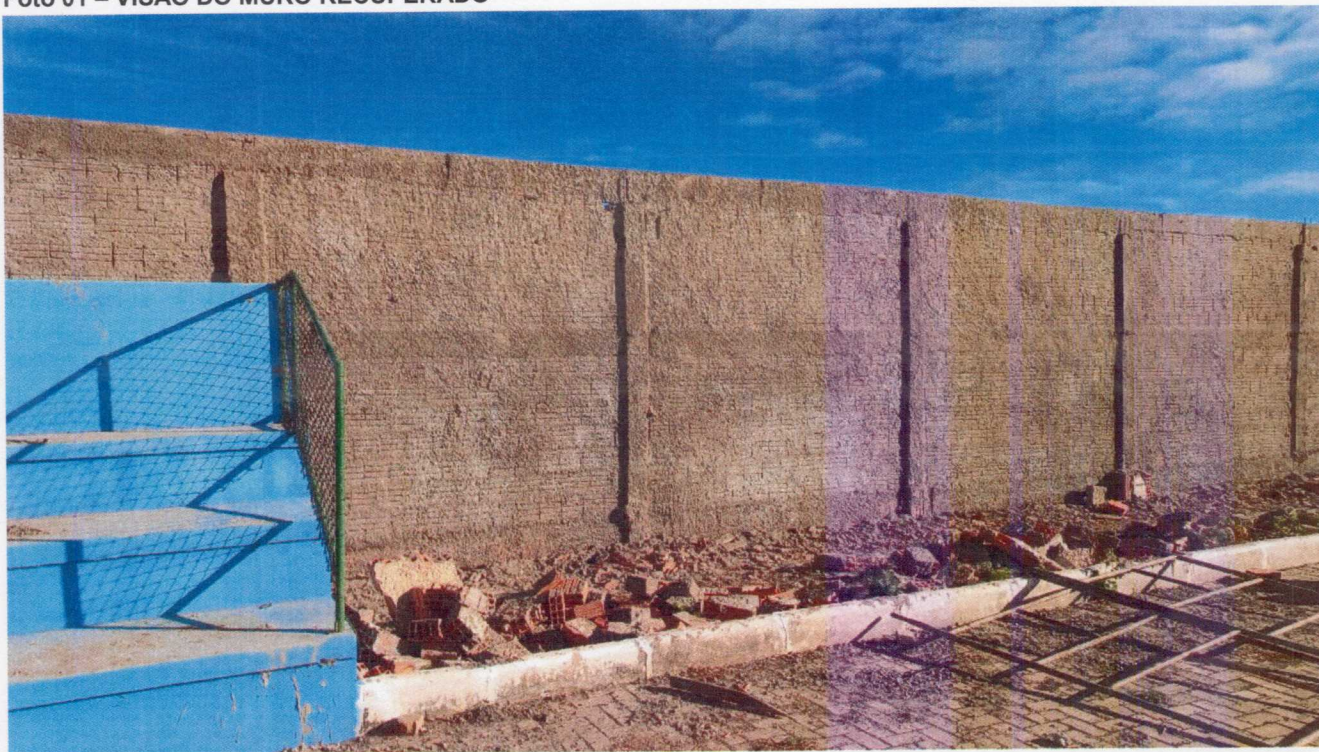


Foto 02 – VISÃO DA PAVIMENTAÇÃO




Di

Relatório fotográfico referente aos serviços de utilização de saldo da reforma
do Estádio Municipal de Cotegipe/Ba, convênio nº 51/2022.

Foto 03 – VISÃO DA CANTINA E SANITÁRIO PÚBLICO



Foto 04 – VISÃO DO SANITÁRIO

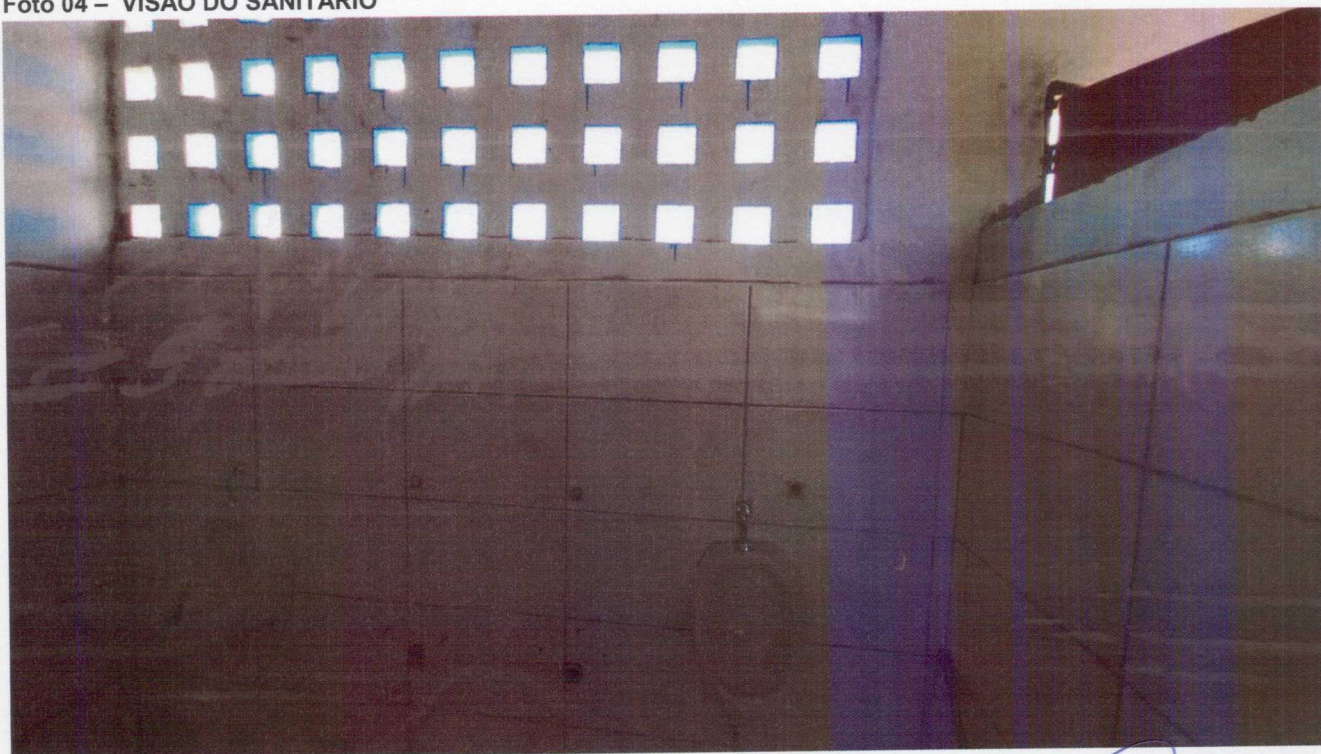

[Handwritten signature]
