

	Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte Superintendência de Desportos do Estado da Bahia Diretoria de Operações de Espaços Esportivos Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção Vistoria de Convênio	FLS.
		Data da Vistoria 03/09/2024

Município		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra		Responsável Jornando Vilasboas Alves	
Contato: Carine Santana do Carmo		Cargo: Arquiteta	
Objeto: Construção de Areninha-Utilização de saldo			
Endereço: Sede do município			
Convênio 34/2022	Processos 069.1479.2022.0001277-99 069.1486.2023.0003033-04	Utilização de saldo	Parcela vistoriada 2ª Vistoria
Publicação no D.O. E. 14/05/2022	Valor da Obra R\$ 972.677,56	Valor do saldo 32.105,60 (saldo) + 66.698,84 (contrapartida)= R\$ 98.804,44	

DADOS TÉCNICOS:

Em visita ao Município de Bom Jesus da Serra, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bom Jesus da Serra, objeto do convênio nº 34/22 no valor de R\$ 972.677,56 (novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra está em andamento.


Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec	Porc. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.446,27	1.446,27	100,00%	1.446,27	1.446,27	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	37.060,71	32.056,59	86,50%	37.060,71	32.056,59	86,50%
3	PESC. PILAR	1.052,51	1.052,51	100,00%	1.052,51	1.052,51	100,00%
4	VIGA BALDRAME	6.126,10	6.126,10	100,00%	6.126,10	6.126,10	100,00%
5	SUPERESTRUTURA	3.270,57	2.958,36	90,45%	3.270,57	2.958,36	90,45%
6	VIGAS E CINTAS	3.546,89	3.546,89	100,00%	3.546,89	3.546,89	100,00%
7	LAJE	2.896,67	2.896,67	100,00%	2.896,67	2.896,67	100,00%
8	PAREDES E PAINEIS	8.666,87	8.666,87	100,00%	8.666,87	8.666,87	100,00%
9	COBERTURA	4.418,82		0,00%	4.418,82	0,00	0,00%
10	ESQUADRIAS	5.321,92		0,00%	5.321,92	0,00	0,00%
11	RESVESTIMENTO, PAREDES E PISOS	13.506,62	6.985,29	51,72%	13.506,62	6.985,29	51,72%
12	PISOS	2.271,64		0,00%	2.271,64	0,00	0,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	2.140,76	269,36	12,58%	2.140,76	269,36	12,58%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4.097,70		0,00%	4.097,70	0,00	0,00%
15	LOUÇAS E METAIS	2.757,63		0,00%	2.757,63	0,00	0,00%
16	SERVIÇOS FINAIS	222,76		0,00%	222,76	0,00	0,00%
	TOTAL	98.804,44	66.004,91	66,80%	98.804,44	66.004,91	66,80%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprido os serviços de utilização de saldo do convênio nº34/22, no valor de R\$ 98.804,44 (noventa e oito mil, oitocentos quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Responsável: Nelson Rocha	ANALISTA TÉCNICO	Data do Relatório 04/09/2024
Coordenador de Obras Serviços e Manutenção: LUIZ A.A BRANTES	ARQUITETO- CAU- BA-12275-0 Cadastro- 69.520 107	


Nelson Rocha
Engenheiro Civil / SUDESB
CAD:92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico

FOTO 01 – VISTA DAS PAREDES


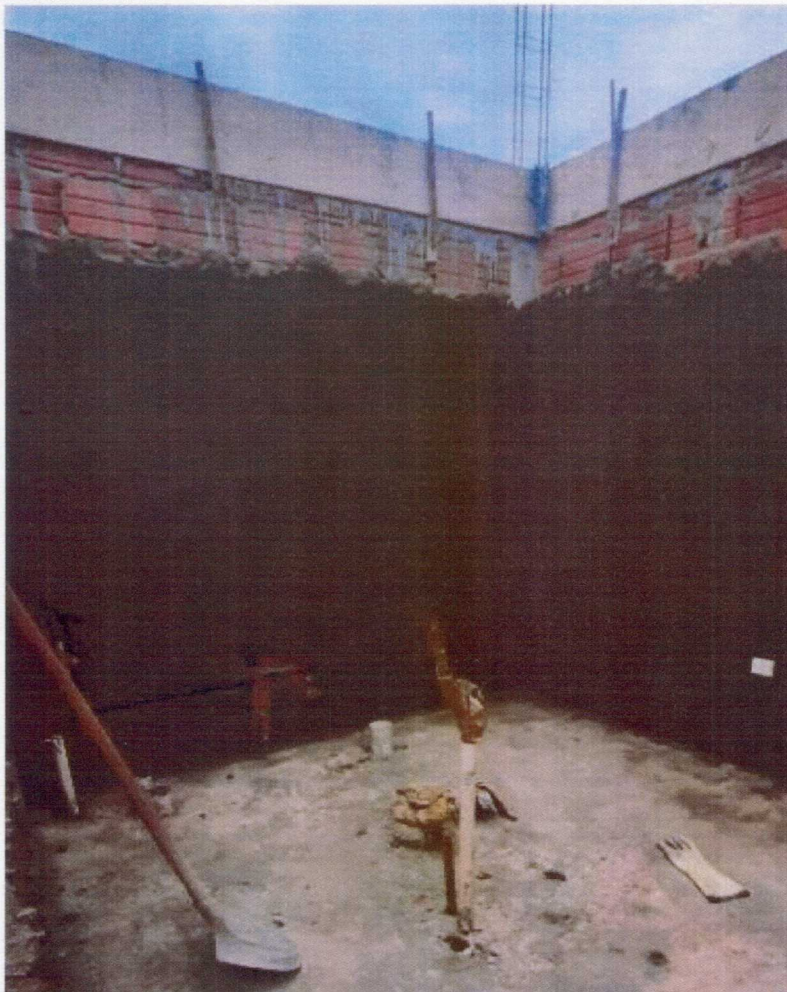


FOTO 02 – VISTA DA LAJE

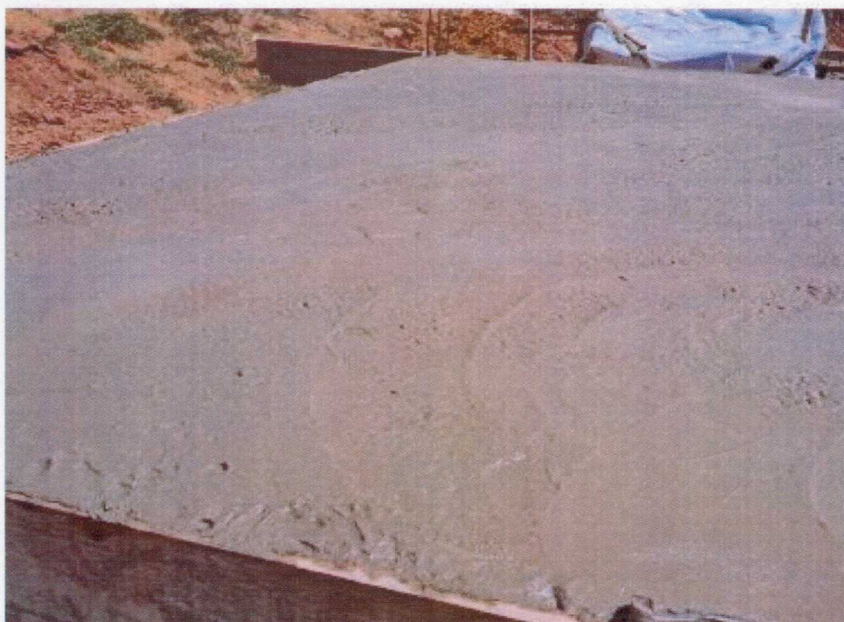

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FOTO 02 – VISTA FRONTAL

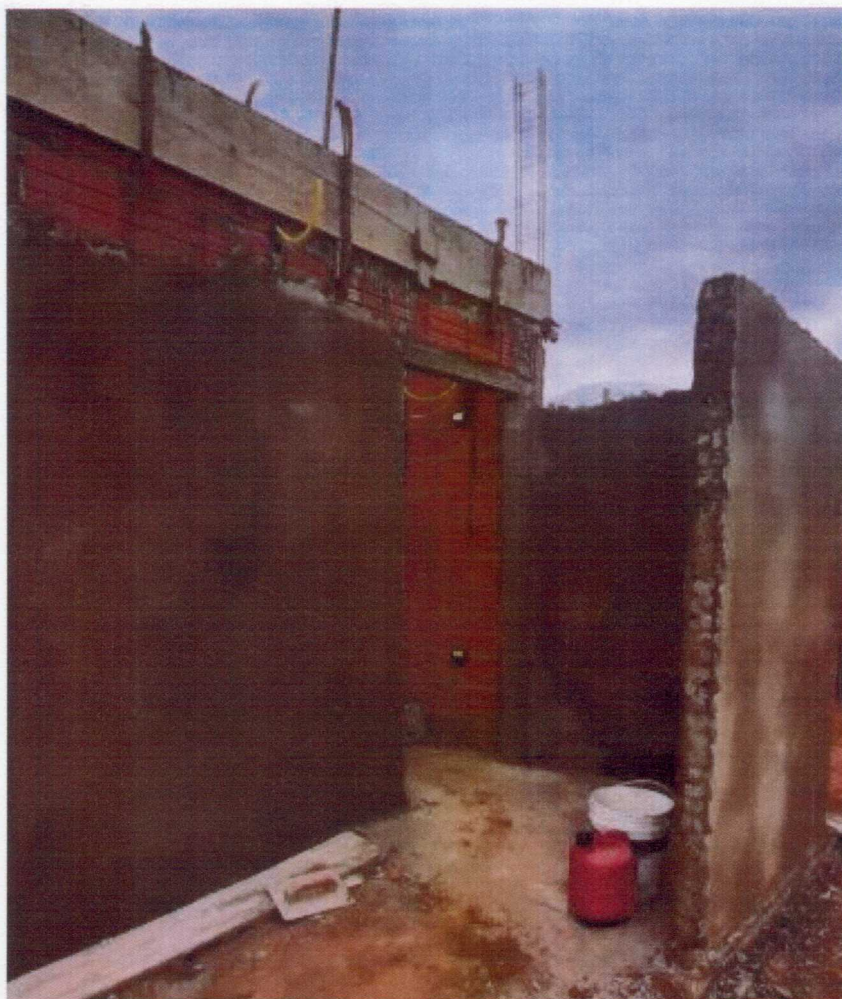


FOTO 02 – VISTA LATERAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
