



TCSA Porto Sul

9º Relatório de Execução



Comitê Técnico de Execução - CTE



Foto: Rui Rezende

Período: 01/12/2024 a 31/05/2025

9º Relatório de Execução

TCSA Porto Sul

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 9º Relatório de Execução acerca das obrigações estipuladas em cumprimento do TCSA, referentes às ações previstas no Eixo 1 – Planejamento Territorial (item 1), Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental Integrada (itens 10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29), Eixo 6 - Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna e Flora (itens 30 e 33) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a proposição de atualização do Plano de Ações (ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II).

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo III) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33; acumulados. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes de cronograma, especialmente em virtude do gerenciamento de qualquer projeto.

Em outubro de 2024 foi concedida pelos COMPROMITENTES, a não objeção para contratação direta da Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), para execução da recomposição vegetal de 49 hectares em unidade de Conservação Federal, proposta pelo ICMBio no âmbito do item 33 conforme plano de ação apresentado pela Instituição para execução dos recursos destinados à aplicação em Unidades de Conservação Federais.

Em dezembro de 2024 foi concedida pelos COMPROMITENTES, a não objeção para inclusão da construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), a partir da unificação dos itens 30, 31 e 32 do Plano de Ação, Anexo 3 do TCSA Porto Sul, passando a ser apenas item 30 com a seguinte redação: Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM). Foi aprovado ainda o remanejamento de recursos no montante de R\$ 3.243.288,20 oriundos do item 7 (R\$ 780.000,00) e de rendimentos (2.463.288,20) para complementar a previsão orçamentária para execução da nova ação.

Com relação ao Protocolo de Fiscalização, esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no IBAMA o processo 02006.001564/2021-78 para assinatura do Termo de Adesão. Foram acatadas pela SEMA as sugestões de ajustes no instrumento de adesão encaminhadas pelo IBAMA, entretanto, recebemos nova solicitação de ajuste informando que conforme entendimento interno, a espécie de ato negocial tratada é um Acordo de Cooperação Técnica e não Termo de Adesão e Compromisso, portanto o processo encontra-se em trâmite visando instrução para análise da definição do ato negocial.

Ratificamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da CLÁUSULA 29ª, que houve variação cambial em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços dos itens 13, 14 e 15, base 2018, comprometendo a aquisição do conjunto de equipamentos que compõem as especificações dos itens supracitados, exigindo a deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para adequação e suplementação com recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em conta) dos aportes anuais para sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª.

Não obstante, registramos o comprometimento de R\$ 29.146.003,36 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e seis mil três reais e trinta e seis centavos) correspondentes a 63,63% (sessenta e três vírgula sessenta e três por cento) do montante de R\$ 45.807.319,54 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

No que concerne ao total de despesas pagas, registramos o correspondente a R\$ 23.580.097,59 (vinte e três milhões, quinhentos e oitenta mil noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), equivalentes a 51,48% (cinquenta e um vírgula quarenta e oito por cento) do montante depositado pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

Quadro 1 - Descrição das Ações – (Execução / Concluídos)

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
1	ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Não houve avanço na proposta de junção com item 2, portanto foi elaborado um TDR específico.	-
	ITEM 02: Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	Não houve avanço na proposta de junção com item 1, portanto está sendo analisada a melhor metodologia para execução.	-
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	Contrato firmado <i>Equipamentos instalados</i>	080/2021-ATIVA
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	Contrato firmado <i>7ª manutenção prevista para junho/2025</i>	
	ITEM 05: Aquisição de Equipamentos para Coleta de Dados da Qualidade da Água	Aquisições em fase de conclusão	-
	ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	Contrato firmado	167/2023- PCT
	ITEM 07: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Ação cancelada, recurso remanejado para novo item 30	-
	ITEM 08: Aquisição de serviço de imagens de alta resolução	Aquisição se mostrou inviável, o recurso deverá ser remanejado	-
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	Contrato firmado	105/2021- GEOAMBIENTE
3	ITEM 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação unificada com o item 12	106/2021-AVANSYS (Mudou para NETRA)
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	Contrato concluído	121/2021-AVANSYS
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	Contratação unificada com o item 10	106/2021-AVANSYS (Mudou para NETRA)
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	Concluído	063/2021, 064/2021, 073/2021

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual.	Aquisições em andamento	-
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	Finalizando doações	-
	ITEM 16: Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	Concluído	-
	ITEM 17: Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	Finalizando aquisições, aguardando indicação de aquisições para o saldo restante	
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Concluído Contrato n.º 049/2022 concluído	019/2021 Peixoto Monteiro Eng. Ltda - 049/2022 ENGETELA COM e SERV EIRELI
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Concluído	121/2023 - GMC Construções
	ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Contratação unificada, objetivando a realização de um planejamento territorial integrado. Contrato em execução conforme planejado	197/2023 - Seleção Natural
	ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande		
	ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha		
	ITEM 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 29: Destinação de recursos para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	Plano de aquisições e contratações apresentado pelo ICMBio em execução	-

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
6	ITEM 30: Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)	Em 02/05/2025 foi assinado contrato e iniciada a execução com duração prevista de execução em 2 anos e 26 produtos a serem entregues.	117/2025 - Margem Arquitetura
6	ITEM 33: Contratação de serviço de recomposição de vegetação	Ação foi subdividida em duas: 1 - ICMBio - contratação direta da UFSB para executar projeto de recuperação em conclusão e 2 – INEMA - Processo de contratação em andamento para recuperação de 50ha	-
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	Repasse efetuados, conforme programação de execução.	005/2021 - Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia

Quadro 2 – Demonstrativo dos Valores Executados: Comprometidos e Pagos:

Ei xo	Item / Ações	Valor estimado (R\$) Anos 1, 2, 3, 4, 5 e 6	Valor Comprometido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	198.300,00	166.050,00	166.050,00	PCD Hidrológicas
		99.150,00	107.775,00	107.775,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
		7.140,00	18.474,00	0,00	SENSOR
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	232.500,00	270.100,05	270.100,01	PCD Pluviométricas
		116.250,00	179.625,00	113.824,99	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
	ITEM 05: UMRs para coleta de dados da qualidade da água	608.090,00	254.224,25	254.224,25	Veículo 4x4
			6.164,58	3.414,58	Frete, impostos, despachantes
			3.921,75	3.921,75	IPVA - veículos terrestres
			32.176,00	32.176,00	Motores para embarcação
			41.600,00	0,00	Voadeira
			28.600,00	28.600,00	Reboque rodoviário
	ITEM 06: Monitoramento da Água	390.000,00	340.000,00	268.600,00	Monitoramento da qualidade da água - serviço PJ-contrato 167/2023
	ITEM 08: Imagens de alta resolução	924.808,12	0,00	0,00	
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	2.210.558,43	1.836.519,47	1.345.468,03	Geoprocessamento - HARPIA contrato 105/2021
3	ITEM 10: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para desenvolvimento do painel de monitoramentos.	1.582.089,92	1.778.338,35	539.797,59	Projeto Painel de Monitoramento (Integrado ao Geobahia) - contrato 106/2021
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	3.209.299,08	4.062.152,52	3.809.122,11	Desenvolvimento de sistemas - SEIA - contrato 121/2021

	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	3.533.205,54	3.674.809,76	3.482.282,80	Projeto GEOBAHIA - Desenvolvimento de software - contrato 106/2021
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	1.792.702,77	35.970,74	35.970,74	02 (duas) Mesas digitalizadoras
			52.527,00	52.527,00	03 (três) Switch tipo borda
			258.065,39	258.065,39	Solução de Segurança WAF
			10.000,00	10.000,00	Solução de Segurança WAF
			87.190,10	87.190,10	01 (um) Switch core 48 portas
			137.816,00	137.816,00	01 (um) Switch core 24 portas
			22.500,00	18.000,00	Switch Instalação/Treinamento/ ST
			275.000,00	275.000,00	01 (um) Storage
			155.000,00	155.000,00	01 (um) Storage
			134.505,00	134.505,00	01 (um) Switch Core
			84.240,00	84.240,00	01 (um) Switch Servidor
			12.000,00	6.000,00	Serviços Switches
			82.844,21	82.844,21	Gerenciador de logs
			10.000,00	9.000,00	Instalação/Treinamento/ Suporte Técnico de hardware
					Instalação/Treinamento/ Suporte Técnico de hardware

4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal e estadual.	1.353.785,40	23.213,92	23.213,92	01 (um) Computador (workstation)
			476.712,00	476.712,00	02 (dois) Veículos pick-up 4x4
			416,04	416,04	Despachante
			42.090,00	42.090,00	01 (um) Quadriciclo
			2.630,00	2.630,00	Serviços de frete para 01 (um) Quadriciclo
			169.775,00	169.775,00	25 (vinte e cinco) Computadores
			11.999,00	11.999,00	01 (um) Notebook - GEO
			4.400,00	4.400,00	02 (duas) Impressoras
			26.550,00	26.550,00	10 (dez) Tablet
			28.000,00	28.000,00	25 (vinte e cinco) Monitores
			82.000,00	82.000,00	10 (dez) Notebook
			7.280,00	7.280,00	01 (um) scanner
			82.650,00	82.650,00	01 (um) Receptor GNSS
			4.900,00	4.900,00	01 No Break 3Kva
			16.644,00	16.644,00	02 (duas) Impressoras Portáteis
			2.800,00	2.800,00	10 (dez) Powerbank (para Tablet)
			15.582,00	15.582,00	02 (dois) Notebook Avançado
			21.384,00	21.384,00	03 (três) Notebook Intermediário
			17.562,00	17.562,00	Desktop e note - geoprocessamento
			45.200,00	45.200,00	Drones 04 (quatro) INEMA
			8.800,00	8.800,00	Capacitação Drones
			22.532,00	22.532,00	04 (quatro) Notebook Intermediário
			562,59	562,59	Adesivos
			23.575,80	23.575,80	Serviços de frete, armazenagem, lic. e IPVA 02 Veículos 4x4
			2.981,40	2.981,40	Monitor
			500,00	500,00	Licenças de softwarw
			8.800,00	8.800,00	Motoserra
			38.962,10	38.962,10	Drone
			73.162,32	73.162,40	Armadilha fotográfica
			4.388,20	4.388,20	Câmera fotográfica digital

	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	843.240,42	715.068,00	715.068,00	03 (três) Veículos pick-up 4x4
			110.560,60	110.560,60	veículo passeio
			22.190,00	22.190,00	motocicleta
			4.082,00	1.097,00	HD + MESA + No break
			11.434,00	11.434,00	desktoorp GEO
			59.518,01	55.568,01	Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de acidente, licenciamento e IPVA para 03 (três) Veículos pick-up 4x4
			741,25	741,25	Aquisição de peças para manutenção-veículo placa RES-7E49 (INEMA)
			1.850,00	1.850,00	Serviço de mão de obra para manutenção do veículo Mitsubishi-L200 Placa RES-7E49 para o INEMA
			6.903,00	6.903,00	Desktop e Notebook
			3.388,00	3.388,00	TV
			4.149,00	4.149,00	GPS
4	ITEM 16: Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	467.921,00	233.999,94	233.999,94	Câmera videomonitoramento rodoviário
			47.245,70	47.245,70	Instalação/Treinamento/ Suporte técnico de hardware – serviço PJ
			142.900,00	142.900,00	Desktop e Notebook
			9.000,00	9.000,00	Fone de ouvido
			6.298,00	6.298,00	Impressora/scanner
			13.290,00	13.290,00	No Break/Estabilizador
			3.190,00	3.190,00	No Break/Estabilizador
			2.945,00	2.945,00	Webcam
			26.853,12	26.853,12	Ar-Condicionado
			3.299,00	3.299,00	NO BREAK/Estabilizador
			47.100,00	47.100,00	Fechadura eletrônica
	ITEM 17: Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	781.222,00	155.700,00	155.700,00	03 (três) quadriciclos
			30.400,00	30.400,00	02 (dois) reboque rodoviário de 1 eixo para voadeira 8

					metros
			22.600,00	22.600,00	02 (dois) reboque rodoviário pa/ quadriciclo
			3.840,00	3.840,00	04 (quatro) No Break 1300 VA
			3.500,00	3.500,00	07 (sete) No Break 500 VA
			285,34	285,34	02 (duas) Caixas térmicas
			4.359,60	4.359,60	04 (quatro) Binóculos
			11.300,00	11.300,00	01 (um) Drone
			5.380,00	5.380,00	02 (duas) Câmeras subaquáticas
			6.958,00	6.958,00	02 (duas) Câmeras CANON
			47.960,00	47.960,00	08 (oito) Notebooks
			69.381,00	69.381,00	09 (nove) Desktops intermediários
			8.409,80	8.409,80	aquisição 02 projetores
			8.155,00	8.155,00	01 (um) Desktop avançado
			7.653,80	7.653,80	impressora laserjet
			3.592,00	3.592,00	impressora multifuncional
			47.066,48	47.066,48	taxa licenciamento - 04 veículos
			9.900,00	9.900,00	serviço de frete seguro quadriciclo
			221.121,20	221.121,20	aquisição 03 veículos strada
			2.100,00	2.100,00	saco estanque, lanternas e outros
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	2.134.790,00	255.590,00	255.590,00	Contrato 119/2021 - Projetista/fiscal para cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha
			1.273.539,10	1.273.539,10	Contrato 049/2022 - Serviço de eng. p/ cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha
	ITEM 19: Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	850.007,34	778.412,09	778.412,09	OBRA - contrato 121/2023
	ITEM 22/23/25/26 e 27: Revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	2.089.520,00	2.082.611,40	851.612,54	Plano de Manejo - Consultoria PJ
			39.519,94	0,00	Plano de Manejo - Consultoria
	ITEM 24: Demarcação	25.000,00	0,00	0,00	Design gráfico PJ

	física e sinalização do PE da Serra do Conduru				
	ITEM 29: Apoio à Ucs federais do Corredor - PMBE-Lontras	1.083.195,00	1.020.028,06	901.713,06	Aquisição de 03 Mitsubishi L200
6	ITEM 30: Contratação de serviço de Engenharia para implantação do CETAS Sul e CETAM	460.000,00	444.200,00	0,00	Elaboração dos Projetos Executivos (Produto 1, 2 e 3 entregues)
	ITEM 33: Recomposição de vegetação	1.399.776,44	697.800,00	0,00	Diagnósticos ambientais PJ
					Reflorestamento/Manejo de vegetação PJ
7	ITEM 34: Repasse de recurso p/ a implementação de um Observatório Socioambiental.	450.559,67	375.466,40	375.466,40	Repasse ao Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
	Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)	4.505.596,68	4.580.731,95	4.280.470,63	Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 002/2020
	Tarifa de Serviços Bancário			2.330,60	Acumulado em 31/05/2024
TOTAL ==>		31.273.614,54	29.146.003,36	23.580.097,59	51,48%

DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS

Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14^a e 15^a, o PRIMEIRO e o SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos de fiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro (CIPPA/Porto Seguro), a Delegacia de Proteção Ambiental/Ilhéus (DPA/Ilhéus) e os Municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus e o ICMBio formalizaram a adesão ao referido PROTOCOLO.

Cumprе ressaltar que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) indicou o interesse de promover a assinatura de Termo de Adesão ao supracitado PROTOCOLO, contudo ainda não concluiu as tratativas, aguardando definição sobre questionamento do IBAMA acerca da espécie de ato negocial solicitado via Ofício 402/2024/SUPES-BA. Cumprе registrar que os Termos de Adesão, em questão, estão relacionados ao Processo SEI nº 027.13520.2021.0000742-14 que trata do Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada.

Com relação à CLÁUSULA 9^a, parágrafo único, vale ressaltar que os dados já produzidos até o momento são lançados nos sistemas informatizados permitindo desta forma, que sejam observados pelas equipes técnicas tempestivamente nas situações em que haja necessidade de consultá-los.

Com relação à CLÁUSULA 11^a cumprе informar que ações estão sendo executadas no sentido de atender aos subitens: I, II e III e parágrafos: primeiro, segundo e terceiro. O SIGWeb Geobahia, cuja manutenção e evolução foi executada através do Contrato 106/2021, disponibiliza os dados/indicadores ambientais produzidos e utilizados pelo INEMA, relativos a todo o território do estado da Bahia, incluindo a área de abrangência do Porto Sul. Os dados relativos ao monitoramento do decrémento de vegetação nativa, produzidos através do projeto Harpia, estão disponíveis no SIGWeb Geobahia.

O Projeto de Painel de Monitoramento encontra-se em execução, com recurso alocado por meio do Contrato 106/2021, integrado ao SIGWeb Geobahia. Atualmente, o projeto do Painel de Monitoramento encontra-se em fase de desenvolvimento do primeiro *dashboard* de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV), e em levantamento de requisitos do *dashboard* de Áreas Protegidas.

O INEMA tem disponibilizado, ao Observatório Socioambiental, os dados de monitoramento da vegetação (Harpia) e disponibilizou os dados de ASV (Autorização de Supressão Vegetal). Foram solicitadas também informações de outorgas e áreas embargadas, as quais o INEMA está viabilizando a disponibilização. Além disso O projeto de Painel de Monitoramento prevê a disponibilização de demais dados à Sociedade.

Quanto à CLÁUSULA 13ª, parágrafo único, informamos que a listagem de informações foi encaminhada por e-mail nas seguintes datas: 15/12/2021, 18/02/2022, 01/07/2022, 13/10/2022, 26/01/2023, 08/09/2023, 11/12/2023, 08/03/2024, 10/06/2024, 11/09/2024. 07/01/2025 e 30/04/2025.

Ademais, em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 16ª, informamos a realização pelo SEGUNDO COMPROMISSÁRIO das ações de fiscalização nos municípios incluídos na Região de Referência do TCSA Porto Sul, quais sejam: Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Barro Preto, Aurelino Leal, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itapitanga, Maraú e Ubaitaba. Foram obtidos através da consulta aos Sistemas SEI e CERBERUS, em pesquisa realizada para os meses de janeiro a maio de 2025, o quantitativo de 25 denúncias recepcionadas, sendo deste quantitativo, 03 identificadas, conforme Lei Complementar nº 140/2011, como de competência municipal e direcionadas mediante envio de Ofício, conforme previsto no PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul. Cabe registrar, ainda, que foram recebidas 22 demandas judiciais do Ministério Público Federal e Estadual, em análise e atendimento pelos técnicos da fiscalização tanto da sede quando da Unidade Regional Sul.

Adiciona-se a este levantamento a realização de 01 operação planejada, nos temas Florestal e Fauna, nos municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, sendo realizadas por técnicos da Unidade Regional - UR Sul e equipe técnica da Sede do INEMA, ocorreu também a ação de sensibilização com a passagem da Caravana do Defeso das Espécies Marinhas, visando um trabalho de educação ambiental e a entrega qualificada do calendário do defeso 2025, junto à comunidade de Ponta da Tulha, em Ilhéus.

Sobre o PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul, após o Workshop ocorrido nos dias 27 e 28/02/2024, houve a tentativa de mobilização dos municípios envolvidos para a devida atualização do Protocolo, fato não ocorrido a contento pois houve dificuldade de mobilização via consócio vinculado ao Programa GAC - Gestão Ambiental Compartilhada e na sequência ocorreram as eleições municipais, restando necessária nova articulação junto ao GAC para retomada da atualização do protocolo ou repactuação com os municípios que descontinuaram após resultado das eleições municipais. Em reunião realizada em 15/04/2025 foi solicitado pelo CTE o apoio do MPBA no sentido de mobilizar as entidades que aderiram ao Protocolo para uma reunião de alinhamento.

DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO

Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Item IV o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO realizou o depósito no montante de **R\$ 9.007.837,59** (nove milhões, sete mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), realizado em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) em 30/07/2024 e a segunda complementar no valor de R\$ 4.007.837,59 (quatro milhões, sete mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) em 27/08/2024, devidamente corrigidos, referente ao 5º desembolso previsto com valor nominal de R\$ 6.758.395,02 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos) conforme cópia dos extratos abaixo:



Extrato de conta corrente - Autorizável

 G3340117144743471
 01/08/2024 17:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519 X
 Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.373.731	5.000.000,00 C	5.000.307,29 C
				341.6547 07392063000180 BAHIA MINERACA			

02/09/2024, 14:52

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G332021441592814010
 02/09/2024 14:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.948.764	4.007.837,59 C	4.007.861,56 C
				341.6547 07392063000180 BAHIA MINERACA			

Considerando os desembolsos anteriores o total desembolsado até a presente data corresponde ao montante de **R\$ 45.807.319,54** (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), contemplando as devidas correções e os itens I, II, III, IV e V da Cláusula 27ª do TCSA.

Cabe informar que em 20/05/2025 foi enviado para a BAMIN com cópia para os compromitentes e demais compromissários, o Ofício nº 006/2025 SEMA/CTE solicitando o pagamento do 6º desembolso pelo fato de ter sido atendida a meta de 51,48% de execução do valor até então depositado pela empresa.

DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO

O QUARTO COMPROMISSÁRIO recebeu o Relatório de Acompanhamento Parcial referente ao 2º semestre de 2024, das atividades desenvolvidas pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, tendo sido aprovada a prestação de contas apresentada pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento da CLÁUSULA 25ª, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul.

O próximo e último aporte de recurso previsto será liberado após pagamento da 6ª parcela de desembolso e aprovação do Relatório referente ao 1º semestre de 2025. Até o momento foi repassado o montante de R\$ 375.466,40 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) ao OBSERVATÓRIO SOCIAL.

DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

A Prestação de Contas recepcionada em 10/06/2025, formalizada pela Carta nº 380/2025 expedida pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), em determinação da CLÁUSULA 33ª do TSCA, contendo os documentos financeiros referentes ao período compreendido entre 01 de dezembro de 2024 a 31 de maio de 2025.

Após ingresso na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 3519-X, das parcelas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, depositadas pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO totalizando o montante de **R\$45.807.319,54** (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), contabilizados em duas carteiras de aplicação financeira a rentabilidade líquida obtida foi de **R\$6.745.306,17** (seis milhões setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e seis reais e dezessete centavos) acumulados em 31 de maio de 2025.

As tarifas bancárias cobradas a cada pagamento efetuado totalizam em 31/05/2025 o montante de **R\$ 2.333,60** (dois mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos); que na prestação de contas da FUNBIO são deduzidos dos rendimentos auferidos para apuração dos rendimentos líquidos.

Financeiro – Detalhamento Mensal (em R\$)

Período	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
ago/20	6.758.395,02	84.417,42	9.756,83	153,00	-	9.603,83	-	159,44	6.852.416,27
set/20	-	-	6.686,34	-	-	6.686,34	-	159,44	6.859.102,61
out/20	-	-	10.750,38	-	-	10.750,38	-	159,44	6.869.852,99
nov/20	-	-	12.075,99	-	5.175,54	6.900,45	-	159,44	6.876.753,44
1a PC	6.758.395,02	84.417,42	39.269,54	153,00	5.175,54	33.941,00	-		6.876.753,44
dez/20	-	-	14.413,63	-	-	14.413,63	-	159,44	6.891.167,07
jan/21	-	-	12.136,21	-	-	12.136,21	-	159,44	6.903.303,28
fev/21	-	-	9.669,16	8,20	-	9.660,96	75.093,28	109,26	6.837.870,96
mar/21	-	-	17.141,48	-	-	17.141,48	-	109,26	6.855.012,44
abr/21	-	-	15.397,16	8,20	-	15.388,96	35.970,74	478,80	6.834.430,66
mai/21	-	-	7.559,35	-	-	7.559,35	570.234,34	7.722,86	6.271.755,67
2a PC	-	-	76.316,99	16,40	-	76.300,59	681.298,36		6.271.755,67

jun/21	-	-	23.144,03	11,60	-	23.132,43	535.598,49	4.368,86	5.759.289,61
jul/21	-	-	19.933,14	6,80	-	19.926,34	393.546,87	5.462,84	5.385.669,08
ago/21	9.011.193,36	1.029.935,25	24.508,42	16,40	-	24.492,02	8.000,00	10.041.129,10	15.443.289,71
set/21	-	-	60.674,42	8,20	-	60.666,22	242.445,42	4.391,72	15.261.510,51
out/21	-	-	73.957,08	3,40	-	73.953,68	261.889,99	180,80	15.073.574,20
nov/21	-	-	92.653,49	3,40	40.401,46	52.248,63	87.226,07	628,79	15.038.596,76
3a pc	9.011.193,36	1.029.935,25	294.870,58	49,80	40.401,46	254.419,32	1.528.706,84		15.038.596,76
dez/21	-	-	117.769,07	64,20	-	117.704,87	578.983,57	4.017,66	14.577.318,06
jan/22	-	-	104.293,50	67,60	-	104.225,90	1.540.229,32	1.983,08	13.141.314,64
fev/22	-	-	102.752,75	59,00	11.251,03	91.442,72	573.856,37	194,85	12.658.900,99
mar/22	-	-	119.753,04	19,80	-	119.733,24	357.754,10	1.548,23	12.420.880,13
abr/22	-	-	98.429,90	51,20	-	98.378,70	1.011.966,54	1.001,50	11.507.292,29
mai/22	-	-	123.899,46	39,60	87.932,01	35.927,85	239.274,42	1.890,91	11.303.945,72
4a pc	-	-	666.897,72	301,40	99.183,04	567.413,28	4.302.064,32		11.303.945,72
jun/22	-	-	115.071,60	28,00	1.683,67	113.359,93	319.737,42	313,94	11.097.568,23
jul/22	-	-	111.483,82	56,00	21.376,95	90.050,87	687.189,39	555,53	10.500.429,71
ago/22	-		114.515,62	31,40	-	114.484,22		760,27	


		-					565.874,36		10.049.039,57
set/22	-	-	105.546,92	67,60	-	105.479,32	644.091,37	2.755,92	9.510.427,52
out/22	-	-	94.279,33	31,40	-	94.247,93	367.547,34	1.006,84	9.237.128,11
nov/22	-	-	91.609,24	31,40	75.557,88	16.019,96	341.193,64	1.068,39	8.911.954,43
5a pc	-	-	632.506,53	245,80	98.618,50	533.642,23	2.925.633,52		8.911.954,43
dez/22	-	-	99.038,05	64,20	-	98.973,85	695.421,77	9.047,32	8.315.506,51
jan/23	9.011.193,36	2.148.108,10	76.296,39	11,60	3.796,30	72.488,49	419.530,29	120,23	19.127.766,17
fev/23	-	-	139.133,67	26,20	-	139.107,47	446.013,76	748,03	18.820.859,88
mar/23	-	-	199.384,78	28,00	-	199.356,78	391.430,90	628,99	18.628.785,76
abr/23	-	-	150.174,71	31,40	-	150.143,31	366.988,37	798,52	18.411.940,70
mai/23	-	-	214.062,99	26,60	116.513,91	97.522,48	359.264,88	651,82	18.150.198,30
6a pc	9.011.193,36	2.148.108,10	878.090,59	188,00	120.310,21	757.592,38	2.678.649,97	N/A	18.150.198,30
jun/23	-	-	199.314,16	44,40	-	199.269,76	384.675,34	563,10	17.964.792,72
jul/23	-	-	192.242,88	49,80	-	192.193,08	700.816,06	1.828,56	17.456.169,74
ago/23	-	-	211.892,26	95,60	-	211.796,66	583.753,32	1.524,45	17.084.213,08
set/23	-	-	166.932,51	41,00	6.234,39	160.657,12	462.072,91	915,28	16.782.797,29
out/23	-	-	169.019,21	80,60	-	168.938,61	605.896,51	1.949,60	16.345.839,39

nov/23	-	-	159.843,27	59,40	154.030,06	5.753,81	169.375,07	656,38	16.182.218,13
7a PC	-	-	1.099.244,29	370,80	160.264,45	938.609,04	2.906.589,21	N/A	16.182.218,13
dez/23	-	-	148.529,23	71,00	-	148.458,23	1.094.029,46	2.979,63	15.236.646,90
jan/24	-	-	155.120,19	71,00	-	155.049,19	209.766,12	629,44	15.181.929,97
fev/24	6.758.395,02	1.997.844,42	161.356,24	31,40	-	161.324,84	490.241,13	974,78	23.609.253,12
mar/24	-	-	213.837,83	47,80	5.497,23	8.292,80	460.766,63	444,63	23.356.779,29
abr/24	-	-	194.359,87	39,60	-	194.320,27	409.030,31	469,52	23.142.069,25
mai/24	-	-	197.528,10	43,00	150.369,30	47.115,80	1.001.827,20	237.966,71	22.187.357,85
8a PC	6.758.395,02	1.997.844,42	1.070.731,46	303,80	155.866,53	914.561,13	3.665.660,85	N/A	22.187.357,85
jun/24	-	-	178.789,65	90,80	5.733,06	172.965,79	662.455,88	254,77	21.697.867,76
jul/24	5.000.000,00	-	208.357,10	95,60	-	208.261,50	652.671,21	90.967,49	26.253.458,05
ago/24	1.758.395,02	2.249.442,57	234.034,07	69,00	-	233.965,07	483.907,29	81,14	30.011.353,42
set/24	-	-	240.363,73	26,60	-	240.337,13	119.579,90	167,85	30.132.110,65
out/24	-	-	269.294,34	97,00	-	269.197,34	595.356,72	126,75	29.805.951,27
nov/24	-	-	226.464,01	47,80	179.346,86	47.069,35	242.024,82	2.360,50	29.610.995,80
9a PC	6.758.395,02	2.249.442,57	1.357.302,90	426,80	185.079,92	1.171.796,18	2755.995,82	N/A	29.610.995,80

dez/24	-	-	217.271,67	41,60	-	217.230,07	348.697,72	468,51	29.479.528,15
jan/25	-	-	312.049,42	79,20	-	311.970,22	512.900,65	2.812,49	29.278.597,72
fev/25	-	-	295.796,50	23,20	-	295.773,30	163.635,24	2.085,88	29.410.735,78
mar/25	-	-	288.764,65	39,60	-	288.725,05	184.658,37	1.885,88	29.514.802,46
abr/25	-	-	287.136,07	38,20	-	287.097,87	435.084,79	R\$ 46,13	29.366.815,54
mai/25	-	-	328.379,94	56,00	232.089,43	96.234,51	488.188,33	25,15	28.974.861,72
10a.PC	-	-	1.729.398,25	277,80	232.089,43	1.497.031,02	2.133.165,10	N/A	28.974.861,72
TOTAL	38.297.571,78	7.509.747,76	7.844.628,85	2.333,60	1.096.989,08	6.745.306,17	23.577.763,99	N/A	
	45.807.319,54		6.745.306,17						
SALDO DISPONÍVEL (Saldo Consolidado+ saldo em conta corrente)									29.410.735,78
Pagamentos Acumulados			Aporte Acumulado				PAGAMENTOS ACUMULADO (incluindo Tarifas Serv Bancário)		% de Execução /Aporte
			Após 5º Desembolso BAMIN		45.807.319,54	23.580.097,59		51,48%	

Resumo Financeiro – Detalhamento por Período das Prestações de Contas

RESUMO - APORTES X EXECUÇÃO	Prestação de Contas	Período	Aporte Acumulado	Total Executado no Período	Pagamentos Acumulados	% de Execução / Aporte
	1ª	AGO/2020 a NOV/2022	6.842.812,44	153,00	153,00	0,00%
	2ª	DEZ/2020 a MAI/2021		681.314,76	681.467,76	9,96%
	3ª	JUN/2021 a NOV/2021	16.883.941,05	1.528.756,64	2.210.224,40	13,09%
	4ª	DEZ/2021 a MAI/2022		4.302.365,72	6.512.590,12	38,57%
	5ª	JUN/2022 a NOV/2022		2.925.879,32	9.438.469,44	55,90%
	6ª	DEZ/2022 a MAI/2023	28.043.242,51	2.678.838,37	12.117.307,81	43,21%
	7ª	JUN/2023 a NOV/2023		2.906.960,01	15.024.267,82	53,58%
	8ª	DEZ/2023 a MAI/2024	36.799.481,95	3.665.964,65	18.690.232,47	50,79%
	9ª	JUN/2024 a NOV/2024	45.807.319,54	2.756.422,62	21.446.655,09	46,82%
	10ª	DEZ/2024 a MAI/2025		2.133.442,90	23.580.097,99	51,48%

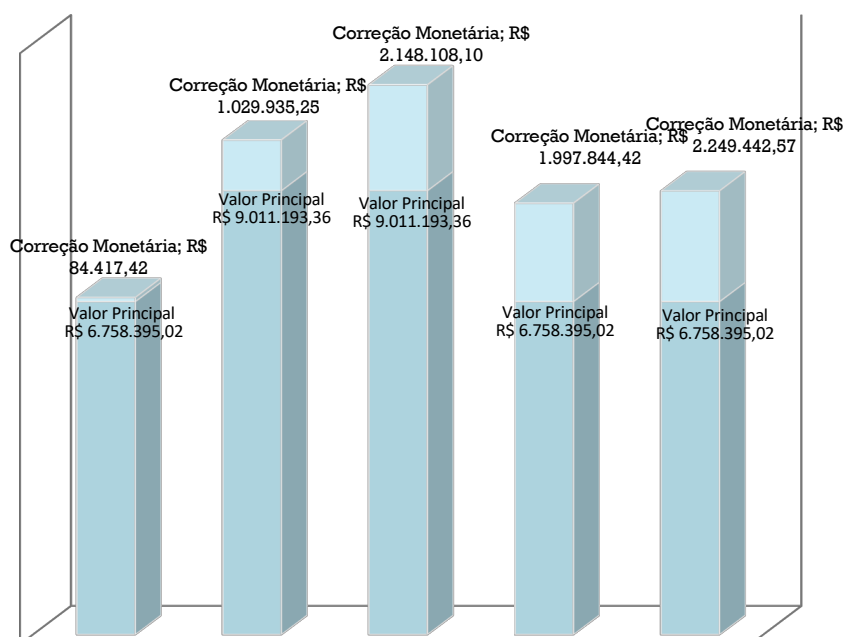Gráfico 1 – Aportes Efetivados 1º ao 5º (em R\$)


No período de 01 de dezembro de 2024 a 31 de maio de 2025 foram realizados pagamentos no montante de **R\$2.133.442,90** (dois milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), que somados aos anteriores na ordem de R\$21.446.655,09 (vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), totalizam **R\$23.580.097,99** (vinte e três milhões quinhentos oitenta mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos); correspondendo a 51,48% (cinquenta e um vírgula quarenta e oito por cento) o total de despesas pagas em relação ao total de aportes.

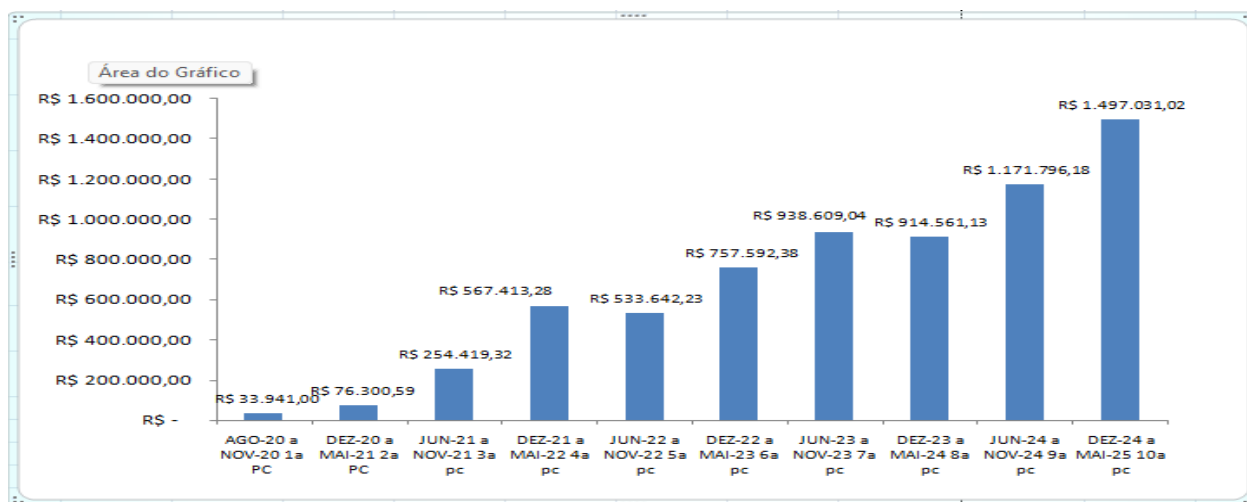
Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação (em R\$)


Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado (em R\$):

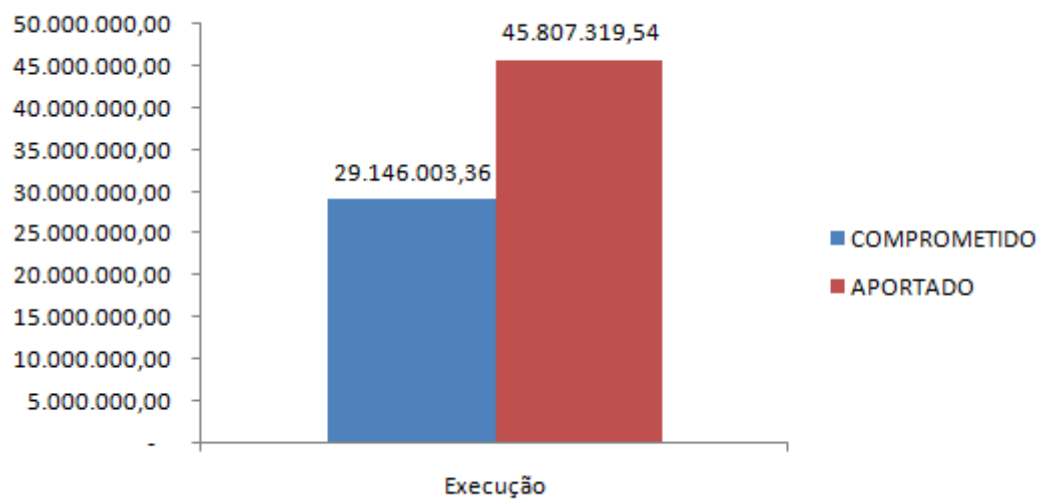


Gráfico 4 – Total Executado x Aportado x Comprometido (em R\$):

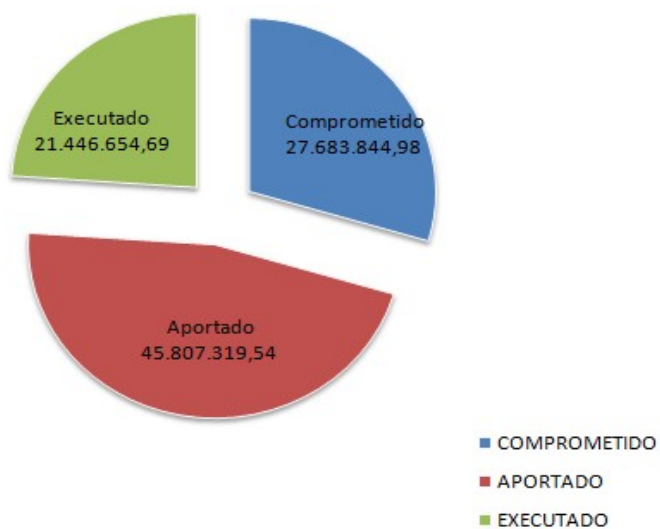


Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA

TOTAIS	R\$
APORTADO	45.807.319,54
COMPROMETIDO	29.146.003,36
EXECUTADO	23.580.097,59
% Comprometido X Aportado	63,63%
% Executado X Aportado	51,48%

DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Harpia, no período de novembro de 2021 (início do projeto) à 31 de maio de 2025.

Contextualização do Projeto

O Projeto Harpia tem por objetivo o monitoramento da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, compreendendo as seguintes atividades: interpretação visual e restituição de imagens orbitais através do software TerraAmazon 7, processamento, tratamento de imagens orbitais, validação da qualidade do mapeamento e produção de documentos técnicos (relatórios e pareceres técnicos). A área de abrangência dos trabalhos está compreendida pelos tiles (parte das cenas) do satélite Sentinel2 e que se sobrepõem à faixa Leste da Lei da Mata Atlântica da Bahia.

Atividades Previstas

Lote 1 – Produção do dado vetorial de vegetação nativa de referência do monitoramento (tempo zero do monitoramento – t0)

Este lote é composto pelos produtos 1 e 2, sendo eles:

- Produto 1

As atividades inerentes à entrega deste produto incluem a interpretação visual de imagens de orbitais (Sentinel2) fornecidas pelo INEMA, prontas para análise a ser realizada através do software TerraAmazon 7. Este produto tem como objetivo produzir dado vetorial de vegetação nativa de referência do monitoramento (tempo zero do monitoramento – T0).

- Produto 2

Compreende o reconhecimento e validação em campo dos produtos vetoriais produzidos. Deverão ser realizadas pelo menos 02 (duas) campanhas de 10 (dez) dias cada para levantamentos de campo na área de mapeada, objetivando a validação dos produtos vetoriais produzidos para toda a área de abrangência do projeto, garantindo a qualidade da informação, controlando erros de omissão e comissão, através da análise dos pontos de levantamento de campo previamente levantados.

Lote 2 – Monitoramento da supressão de vegetação, por interpretação visual de imagens orbitais

Este lote é composto pelos produtos 3, 4 e 5, sendo eles:

- Produto 3

Este produto é composto por interpretação visual das imagens Sentinel2 coletadas entre a data da máscara do monitoramento (tabela 1 – coluna data imagem T0) e o momento do quase tempo real. Este produto tem como objetivo compatibilizar temporalmente os dados de decremento produzidos, de tal maneira que o monitoramento quase tempo real tenha maior acurácia temporal dos polígonos gerados.

- Produto 4

Envolve a interpretação visual de imagens orbitais (monitoramento quase em tempo real) – dados vetoriais e relatório técnico mensal. Este produto é composto por interpretação visual das imagens Sentinel2 coletadas quase tempo real. Este produto tem como objetivo acompanhar o decremento de vegetação nativa na área de abrangência do projeto.

As entregas referentes ao monitoramento quase em tempo real serão feitas por cenas previamente definidas pelo INEMA, considerando os dados históricos de desmatamento até o período anterior ao que será interpretado, de forma regular, enquanto perdurar o contrato. A frequência de mapeamento será semanal, seguindo a frequência de geração de dados pelos satélites.


- Produto 5

As atividades inerentes à entrega deste produto incluem a elaboração de pareceres técnicos que detalhem e subsidiem as ações da fiscalização com informações para a instrução do processo (administrativo e/ou judicial). Tais documentos serão produzidos sob demanda, sendo estimado 6 (seis) pareceres no período de 12 (doze) meses, visando confrontar os resultados parciais ou totais do monitoramento de decremento da vegetação relacionando-os com os resultados de operações planejadas, denúncias ambientais.

Evolução das Entregas

Conforme descrito nos relatórios de entregas, apensados a este documento, o processo de evolução dos produtos previstos no escopo do projeto vem sendo garantido. Na execução do projeto, foram concluídos aproximadamente 55% do escopo, composto por cinco produtos, conforme detalhado na imagem abaixo: 100% do Produto 1 (Remanescente de Vegetação Nativa), 0% do Produto 2 (Reconhecimento e Validação de Campo), 100% do Produto 3 (Legado), 43,4% do Produto 4 (Quase Temporal) e 56,67% do Produto 5 (Pareceres Técnicos).

Estrutura Analítica do Projeto – Harpia Porto Sul

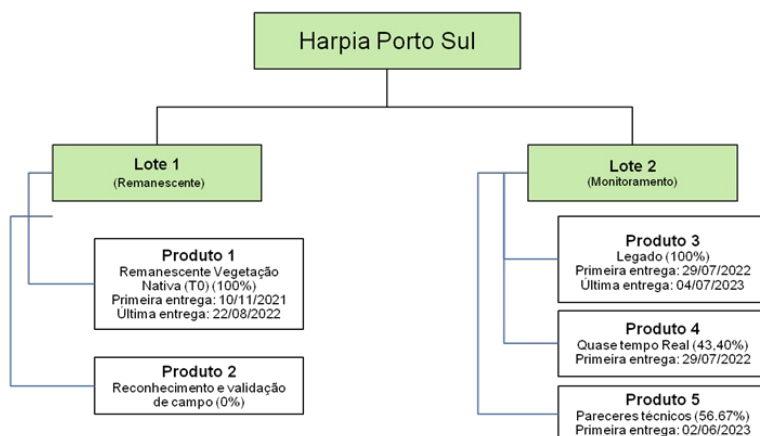

Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel de Monitoramento

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Painel de Monitoramento.

Contextualização do Projeto

Pretende-se que o Painel de Monitoramento Ambiental viabilize a visualização de dados autorizados ao longo do tempo referentes aos atos ambientais concedidos pelo INEMA de forma individualizada conforme a natureza de cada um destes. Além disso, o módulo possibilitará a geração de informações a partir desses dados, aprimorando assim a análise e a tomada de decisões no contexto ambiental.

Atividades Previstas

O projeto prevê a criação de painéis distintos, conforme listados abaixo, cada um com temáticas específicas, que possibilitarão o monitoramento detalhado dos atos ambientais. Considerando a restrição de tempo disponível para o desenvolvimento, será priorizado o atendimento aos painéis conforme a ordem estabelecida pelo ponto focal de negócio. Dessa forma, o projeto será desenvolvido até o limite do tempo disponível, e caso não seja possível concluir todos os painéis previstos, a prioridade será dada aos de maior relevância, sendo os de menor prioridade não desenvolvidos neste ciclo, conforme a necessidade de otimização dos recursos e prazos.

- I. Painel de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa & Desmatamento Ilegal
- II. Painel de Áreas Protegidas
- III. Painel de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR)
- IV. Recursos Hídricos

Essa abordagem assegura que as demandas mais urgentes sejam atendidas de forma eficaz dentro do prazo estipulado, garantindo a entrega de um sistema robusto e de valor para o INEMA.

Evolução das Entregas

O projeto do Painel de Monitoramento teve início em 14 de novembro de 2024, com Luiz Araújo designado como ponto focal na área de negócios. As prioridades foram devidamente estabelecidas, e a equipe iniciou a fase de levantamento de requisitos, para o painel de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV) & Desmatamento Ilegal, além da estruturação básica do sistema. Esse estágio inicial visa garantir que as necessidades essenciais sejam atendidas e que a base técnica do sistema esteja sólida, permitindo uma evolução progressiva conforme o andamento do projeto.

Na execução do projeto Painel de Monitoramento de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV), o time concluiu 88% do escopo essencial e 10% do escopo desejável. Enquanto para a execução do Painel de Monitoramento de Áreas Protegidas, o time concluiu 29% do essencial e 0% do desejável.

Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto SEIA.

Contextualização do Projeto

O SEIA (Sistema Estadual de Informações Ambientais) é um instrumento único de informações, capaz de proporcionar agilidade no atendimento ao cidadão e garantir a gestão eficiente dos processos ambientais por parte do governo do Estado da Bahia.

O SEIA consolidou-se como a ferramenta responsável pela operacionalização e modernização da gestão ambiental na Bahia, não só por permitir o trâmite online e centralizado dos atos autorizativos e dos cadastros ambientais, mas também por apoiar os processos de monitoramento e fiscalização ambiental, fornecendo informações relevantes para a gestão do meio ambiente.

Para proceder com uma melhoria tecnológica no SEIA, com relação aos dados geográficos do CEFIR, foi necessária a remodelagem básica do banco de dados do módulo CEFIR, em seus dados espaciais, com o intuito de melhorar o desempenho, manutenibilidade e escalabilidade, e otimizar recursos. Esta etapa tem sido denominada de Estabilização do CEFIR e é predecessora e necessária para que o sistema esteja compatível à integração com o SIGWEB Geobahia.

Além disto, o projeto visa desenvolver o Módulo de Dados Concedidos (Tipologia Autorização de Supressão de Vegetação - ASV) de forma a possibilitar a geração de dados a serem utilizados em relatórios gerenciais e, posteriormente, no projeto de Painel de Monitoramento, aperfeiçoando a gestão ambiental pelo Estado.

Atividades Previstas

O escopo das atividades desenvolvidas foi dividido em 02 (dois) grupos, conforme a seguir: Estabilização do CEFIR e Desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos.

Em relação à etapa de “Estabilização do CEFIR” foram previstas atividades relacionadas ao planejamento da remodelagem básica e a migração de tabelas. Em relação ao desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos (ASV), foram previstas atividades relacionadas à correção de erros e a inclusão de novos campos que permitirão a implementação de relatórios gerenciais.

Evolução das Entregas

Na execução do projeto de Dados Concedidos de ASV, foram concluídos 100% do escopo essencial e 12% do escopo desejável, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1	Essencial		
100%	NA	NA	
1.1	Estruturação Básica - Infraestrutura		
100%	05/07/2022	27/09/2022	
1.2	Criação do Formulário de Dados Concedidos em Novo Módulo		
100%	03/01/2023	09/08/2024	
1.3	Ajustes e Evoluções na Tela de Análise Técnica de Processos		
100%	30/09/2022	17/05/2024	
1.4	Ajustes e Evoluções na Tela de Aprovação de Análise Técnica de Processos de Atos ASV		
100%	03/05/2024	28/05/2024	
1.5	Criação de Relatório Gerencial em Novo Módulo		
100%	03/05/2024	09/08/2024	
2	Desejável		
12%	NA	NA	
2.1	Evolução nas Telas de Notificação de Prazo		
28%	NA	NA	
2.2	Ajustes e Evoluções na Tela de Aprovação de Análise Técnica de Processos de Atos ASV		
0%	NA	NA	

Quanto ao projeto da remodelagem básica do CEFIR, 100% das atividades do time Porto Sul foram finalizadas, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1	Equipe Porto Sul	
100%	22/11/2024	20/02/2024
1.1	Migração do Banco de Dados	
100%	22/11/2021	14/07/2023
1.2	Melhorias Evolutivas no SEIA	
100%	21/02/2022	22/08/2022
1.3	Testes COTIC	
100%	14/07/2023	18/10/2024

Os produtos ainda não foram colocados em produção, pois a COTIC procederá com os ajustes necessários para garantir a adequação ao SEIA.

Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Geobahia, no período de setembro de 2021 (início do projeto) a maio de 2025.

Contextualização do Projeto

O Geobahia tornou-se uma ferramenta indispensável à realização das atividades das áreas do INEMA. Na direção de um caminho ainda mais promissor, o projeto envereda para uma concepção que extrapola o entendimento de um SIG convencional para visualização e manipulação de dados e acrescenta a vertente das temáticas do negócio voltadas para a análise e interpretação de dados, definindo interfaces específicas de acordo com o perfil de usuário. Com o amplo leque de atividades do Instituto, que passa pelas atividades de Regulação, Fiscalização, Monitoramento, Unidades de Conservação e Biodiversidade e Gestão das Águas, as diferentes áreas técnicas que possuem a componente espacial fortemente presente em suas ações, foi necessário pensar em um modelo de negócio de SIG web que estivesse integrado e agregasse valor ao negócio do INEMA. Para isso, algumas diretrizes foram consideradas no projeto Geobahia, tais como: a gestão inteligente da informação espacial, segurança da informação, aumento do desempenho e implementação de interfaces/ módulos personalizados. Tais diretrizes visam alcançar um cenário de gestão integrada da informação espacial, até então não explorado nas instituições públicas da Bahia, a partir da utilização de ferramentas *Open Source*.

Atividades Previstas

O projeto previu a atualização tecnológica do SigWebGeobahia, bem como o desenvolvimento de novas funcionalidades, como as listadas a seguir:

- Atualização tecnológica dos módulos do Geobahia;
- Atualização da interface de usuário possibilitando melhor organização das informações e melhor experiência dos usuários no uso das ferramentas e módulos do Geobahia;
- Desenvolvimento de análise automatizada de consultas espaciais;
- Criação de novas ferramentas de apoio à análise técnica ambiental;
- Disponibilização de temas e serviços ambientais;
- Módulo de Administração, para gestão dos dados e controles de usuários e permissões.

Evolução das Entregas

Na execução do projeto Geobahia, o time concluiu 100% do escopo essencial e 51% do escopo desejável, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1	Escopo essencial	
	100%	
1.1	Melhorar interação com as camadas do mapa	
	100%	
1.2	Layout de impressão (escopo essencial)	
	100%	
1.3	Ferramentas de geoprocessamento	
	100%	
1.4	Desativar o Geobahia I3Geo	
	100%	
1.5	Construção da landing pages para divulgação do Geobahia	
100%	20/09/2022	27/03/2023
	OES: 006/2022	
1.6	Aplicação Geodados	
	100%	
1.7	Módulo de administração	
	100%	
1.8	Dados Concedidos - ASV no Geobahia	
	100%	
2	Melhorias desejáveis	
	54%	
2.1	Melhorar interação com as camadas do mapa	
	40%	
2.2	Ferramentas de geoprocessamento	
	62%	
2.3	Aplicação Geodados	
	100%	
2.4	Ferramentas de Análise	
	66%	
2.5	Implementar ferramenta de medição que gere estatística para gestão da usabilidade do sistema	
0%	NA	NA
	OES:	
2.6	Substituir o I3Geo pelo Geobahia	
	50%	
2.7	Solução para download das camadas dinâmicas do CEFIR	
0%	NA	NA
2.8	Leitura e exibição dos dados espaciais do CEFIR (com remodelagem)	
0%	NA	NA

Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.

A execução do Contrato n.º 049/2022 (serviços de cercamento da poligonal do PEPT), no valor total de R\$1.358.039,10 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, trinta e nove reais e dez centavos), firmado com a empresa Engetela Comércio e Serviços Ltda., já acrescido de um aditivo para a elaboração do georreferenciamento do cercamento do Parque, foi concluída com o cercamento de aproximadamente 25,8 (vinte e cinco vírgula oito) quilômetros relativos aos limites do Parque. Entretanto, a empresa deixou de entregar o produto referente ao georreferenciamento na forma como exigido no contrato, tendo o valor respectivo sido glosado, no valor de R\$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais). O serviço de georreferenciamento será contratado posteriormente.

Ressalto que houve também a contratação da fiscalização do serviço por meio do Contrato n.º 119/2021, firmado com a empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda, que realizou a análise das propostas durante a licitação e, quando da execução do Contrato n.º 049/2022, sete medições de acompanhamento do contrato, atestando o cumprimento do objeto contratado, ressalvado o produto relacionado ao georreferenciamento.

Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para construção da Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de serviços e um pequeno receptivo.

Para a execução do item 19, foi contratado inicialmente a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da sede, pórtico e guarita do PEPT, além de apoio na seleção das empresas que seriam contratadas para o cercamento e obra e da fiscalização da obra e dos serviços de cercamento do Parque quando da sua execução, tudo através do Contrato n.º 119/2021, firmado com a empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda., no valor de R\$229.400,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais), valor após a realização de dois aditamentos.

Os produtos relacionados à elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares foram entregues e serviram como base para a elaboração da Carta Convite 188/2023, licitação da qual derivou o contrato 121/2023, firmado com a empresa GMC Engenharia para construção da sede, pórtico e guarita do Parque Estadual Ponta da Tulha, no valor total de R\$ 764.587,35 (setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), após dois aditivos, que atualmente está na 8ª medição, aguardando apenas a conclusão da etapa de acabamento e desmobilização do canteiro de obras, com previsão de finalização em junho/2024. Seguem fotos da obra:



Itens 21, 22 e 24 - Contratação de serviços gráficos para sinalização e demarcação de limites para a APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, APA Costa de Itacaré- Serra Grande e Parque Estadual Serra do Conduru

Ante a semelhança do objeto, foi elaborado um termo de referência para a contratação conjunta dos serviços de elaboração do layout das placas de sinalização para as três unidades de conservação, com edital publicado e que se encontra em análise da melhor proposta.

Está em fase final de elaboração o termo de referência para a contratação dos serviços de confecção e instalação das placas de sinalização, também de forma conjunta para otimizar a

execução, uma vez que as três unidades de conservação são contíguas, que usará como insumo o layout produzido pela contratação acima informada.

Itens 22, 23, 25, 26 e 27 - Revisão e elaboração dos planos de manejo da APA Costa de Itacaré Serra Grande, APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, Parque Estadual Serra do Conduru e Parque Estadual Ponta da Tulha, e Planos de Uso Público do Parque Estadual Serra do Conduru e Parque Estadual Ponta da Tulha.

Para a execução conjunta dos itens 22, 23, 25, 26 e 27 foi elaborado um único Termo de Referência, com o objetivo de otimizar a realização do levantamento de dados e realização de oficinas, além de obter instrumentos de gestão com uma visão integrada do território, refletindo o trabalho de integração realizado pelos servidores responsáveis pelas Unidades de Conservação. O Edital para a contratação foi publicado em maio sob o n. 222/2023 e dele derivou o contrato n.º 197/2023, firmado com o Consórcio de empresas Seleção Natural e Bioteia.

Na presente data, foram concluídas as ações: (1) Reconhecimento de Campo e elaboração do Plano de Trabalho; (2) Caracterização das Unidades de Conservação; (3) Realização das Reuniões Preparatórias; (4) Elaboração dos Cadernos Orientadores e; (5) Realização das Oficinas Prévias e (6) realização das Oficinas de Elaboração dos Planos de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha e da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada e do Rio Almada (APA LERA) e do Parque Estadual Ponta da Tulha (PEPT)

Destacamos neste relatório realização das Oficinas de Elaboração dos planos de manejo acima, que ocorreram no período de 5 a 8 de maio de 2025 para o Parque e de 12 a 15 de maio de 2025 para a APA, em formato de imersão de acordo com o Roteiro Metodológico do ICMBio (2018). Destacamos que no dia 09 de maio de 2025, foi realizada a elaboração do Plano de Uso Público Simplificado para o PEPT.

As oficinas contaram com a participação média de 25 a 30 atores sociais, por oficina, que possuem relação com o território cuja participação foi essencial para o planejamento pois, além de conhecerem o território, participaram ativamente na proposição dos componentes fundamentais, componentes dinâmicos e componentes normativos, com destaque para o zoneamento e as normas que incidirão sobre as áreas protegidas.


Como participantes das oficinas, além dos gestores das unidades, tivemos membros do poder público das esferas municipal, estadual e federal, pesquisadores, empreendedores, sociedade civil organizada, pequenos proprietários de terra, atores sociais ligados às atividades turísticas, dentre outros. Ressaltamos que para a execução das oficinas, houve um intenso trabalho interno das equipes da SEMA e do INEMA junto a consultoria Seleção Natural/Bioteia na elaboração dos Guias dos Participantes sendo este material disponibilizado aos oficineiros previamente a realização dos trabalhos.

Além disso, encontra-se em planejamento a execução das Oficinas de Revisão dos Planos de Manejo do Parque Estadual da Serra da do Conduru e da Área de Proteção Ambiental

Costa de Itacaré/Serra Grande (APA CISG), que ocorrerão do dia 07 a 11 de julho de 2025 para o Parque, sendo o último dia dedicado a elaboração do Plano de Uso Público Simplificado. Já a Oficina de Revisão do Plano de Manejo da APA CISG, será realizada do dia 14 ao dia 17/07/2025, ambas oficinas na cidade de Itacaré.



1 - Registro da Oficina de Elaboração do Plano de Manejo da APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada em maio de 2025, Ilhéus Bahia.

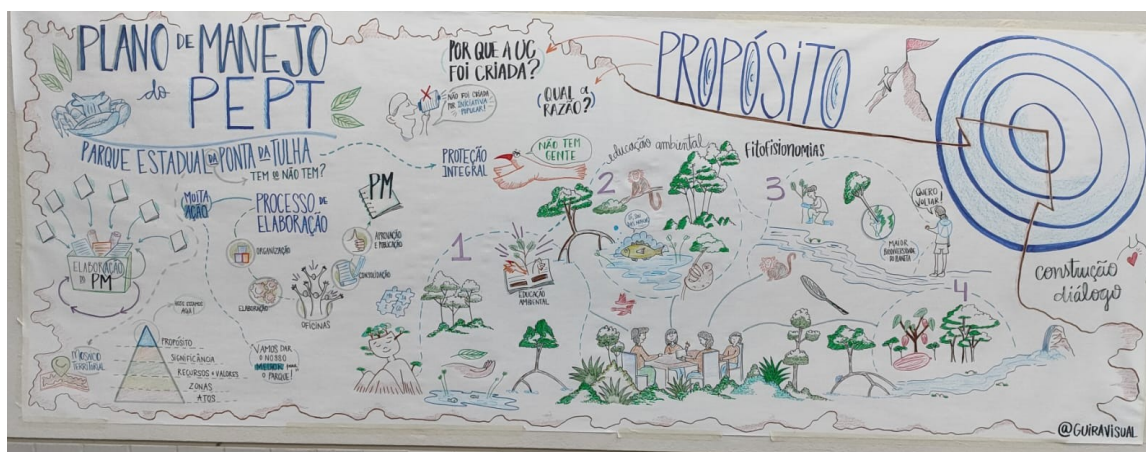

2 – Painel da facilitação gráfica construído durante a oficina de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ponta da Tulha.



3 – Exemplo de Guia do Participante elaborado para cada uma das unidades de conservação para utilização durante as oficinas principais.

Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)

Em janeiro de 2025, foi encaminhada ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) a versão final do Termo de Referência contendo a Especificação Técnica para a contratação dos Projetos Executivos destinados à construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres Sul (CETAS Sul) e à reforma do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM), incluindo também os serviços de assessoria técnica para a contratação das obras e a fiscalização de sua execução.

Na sequência, o FUNBIO promoveu a publicação da Carta Convite referente ao processo seletivo de empresas interessadas na execução dos referidos serviços, cujo período de seleção se estendeu até o mês de março de 2025. Em fevereiro, foi realizada visita técnica com a participação das empresas proponentes no local de implantação dos CETAS.

Em 02 de maio de 2025, a empresa Margem Arquitetura firmou o Contrato nº 117/2025 com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), tendo como objeto a elaboração dos Projetos Executivos para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres Sul (CETAS Sul) e reforma do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM). O contrato também contempla a prestação de assessoria técnica para o processo de seleção das propostas relativas à contratação das obras e a subsequente fiscalização da sua execução.

Nos dias 13 e 14 de maio de 2025, foi realizada a primeira visita técnica presencial obrigatória ao local de implantação dos empreendimentos (Centro Ambiental do Porto Sul – CAPS). A equipe técnica da Margem Arquitetura, composta por duas arquitetas e um engenheiro civil, participou da visita, acompanhada pelo ponto focal do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), responsável pelo acompanhamento técnico do contrato (Foto 1).



Foto 1. 1ª Visita Técnica presencial obrigatória da empresa contratada no local de implantação do CETAS Sul e CETAM (CAPS).

Em conformidade com o cronograma previamente pactuado, até 31 de maio de 2025, a Margem Arquitetura entregou, dentro dos prazos estipulados, os seguintes produtos:

- **Produto 1** – Plano de Trabalho (PT), aprovado em 27 de maio de 2025. Este produto não está vinculado a desembolso financeiro.
- **Produto 2** – Serviços Preliminares referentes ao CETAS Sul e ao CETAM, aprovado em 10 de junho de 2025. As informações relativas ao pagamento correspondente serão apresentadas no próximo relatório de execução.

ANEXO I - Plano de Ações Atualizado

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL - Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	R\$3.500.000,00		R\$1.750.000,00	R\$1.750.000,00			
	Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	R\$2.000.000,00			R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00		
EIXO 2 - MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL - Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos	R\$297.450,00	R\$297.450,00					
	Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos	R\$348.750,00	R\$348.750,00					
	Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	R\$770.000,00		R\$770.000,00				
	Item 6 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	R\$390.000,00		R\$390.000,00				
	Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal AÇÃO CANCELADA - SALDO REMANEJADO	R\$0,00						
	Item 08 - Aquisição de imagens de alta resolução	R\$961.926,00			R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00
	Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	R\$2.059.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 3 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	R\$1.560.000,00				R\$780.000,00	R\$780.000,00	
	Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais denominada SEIA	R\$3.900.000,00		R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		
	Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$3.120.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00			
	Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/NEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema)	R\$1.393.400,00	R\$1.393.400,00					
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	R\$1.141.100,00	R\$570.550,00	R\$570.550,00				
	Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	R\$539.000,00		R\$539.000,00				
	Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	R\$500.000,00			R\$500.000,00			
	Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$1.000.000,00			R\$1.000.000,00			

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 5 - FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00					
	Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$350.000,00	R\$350.000,00					
	Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$200.000,00					R\$200.000,00	
	Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$200.000,00					R\$200.000,00	
	Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
	Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$400.000,00		R\$400.000,00				
	Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$100.000,00					R\$100.000,00	
	Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
	Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
	Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
	Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$1.100.000,00						R\$1.100.000,00
	Item 29 - Repasse de recurso para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	R\$6.000.000,00		R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 6: MEDIDA DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO SUPLEMENTAR À FAUNA/FLORA	Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para Implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)	R\$5.678.325,80						R\$5.678.325,80
	Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho <i>CANCELADA - VALOR REMANEJADO</i>	R\$0,00					R\$0,00	R\$0,00
	Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção do CETAS Marinho <i>CANCELADA - VALOR REMANEJADO</i>	R\$0,00					R\$0,00	R\$0,00
	Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação	R\$1.403.952,87			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	
EIXO 7 - GOVERNANÇA AMBIENTAL	Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental	R\$450.559,67	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28
	TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES	R\$43.013.664,34	R\$6.452.049,65	R\$8.602.732,87	R\$8.602.732,87	R\$6.452.049,65	R\$6.452.049,65	R\$6.452.049,65
	TAXA ESTIMADA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) PERCENTUAL MÁXIMO	R\$4.505.596,68	R\$675.839,50	R\$901.119,34	R\$901.119,34	R\$675.839,50	R\$675.839,50	R\$675.839,50
	TOTAL PREVISTO	R\$45.055.966,82	R\$7.127.889,15	R\$9.503.852,20	R\$9.503.852,20	R\$7.127.889,15	R\$7.127.889,15	R\$7.127.889,15

ANEXO II – Parecer Técnico

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 22, 23, 25, 26, 27, 33; acumulados. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, especialmente em virtude de imprevistos operacionais, inerentes ao gerenciamento de qualquer projeto.

ITEM 1

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 – Fortalecimento Dos Corredores Ecológicos –	Contratação de serviço para a realização da caracterização socioambiental de imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, <u>para subsidiar ações de regularização ambiental, preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites legalmente estabelecidos e recuperação de áreas degradadas.</u>			R\$3.500.000,00/4 R\$875.000,00 por parcela
	Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Para a caracterização socioambiental deverão ser coletados dados geoespaciais de pontos relevantes, como os limites individualizados dos imóveis, as Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal; as áreas habitadas, com especificação das formas de utilização da terra nestas áreas, as quais serão utilizadas para a confecção de mapas temáticos e como subsídio para o planejamento, indicando eventuais incompatibilidades entre os objetivos e zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental (APA).			
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00			

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que o levantamento de dados primários visando o fortalecimento dos corredores ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA, para possibilitar a recepção dos dados primários que serão produzidos.

ITEM 7

JUSTIFICATIVAS:

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 07 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação envolvendo um Time de desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com enfoque na região de referência. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$1.560,00/2 R\$ 780.000,00 por parcela
ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00			
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) proposta do item 7 para o item 11 busca uma melhor execução dos recursos financeiros disponíveis.

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01.

ATUALIZAÇÕES

Considerando os avanços na estabilidade do ambiente da aplicação TerraAmazon, assegurando o bom andamento das atividades do projeto, além do fato de que as novas versões possuem funcionalidades para as quais necessitaríamos de formação técnica específica para utilização, e que tal mudança de versão poderá ocasionar riscos de descontinuidade no monitoramento, concluímos que não há a necessidade de atualização de versão da referida ferramenta. Portanto foi proposto em dezembro de 2024, o remanejamento do saldo de R\$ 780.000,00 para o novo item 30, aprovador pelo CTE e submetido à não objeção dos COMPROMITENTES.

ITEM 10

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação por 24 meses para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos com enfoque na região de referência, com o objetivo de detectar, alertar e publicar de maneira contínua, sistemática e didática, áreas com provável decrémento de vegetação nativa e pontos com redução da qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os agentes de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, de informações de alta precisão.			R\$1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil reais) /2
		OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais a parcela)
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$780.000,00	R\$780.000,00		
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
			R\$780.000,00	R\$780.000,00	

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que o desenvolvimento do Paine de Monitoramentos previsto no item 10, por sua natureza de utilização de dados e informações espaciais, depende do prévio aprimoramento da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG Geobahia) previsto no item 12, entendemos como necessária a prorrogação sugerida, sem prejuízos aos monitoramentos previstos no TCSA, que, cumpre esclarecer, serão realizados pela execução imediata dos itens 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

Diante do exposto, além do remanejamento dos valores inicialmente previstos, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 12, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

Valor CONTRATO: R\$ 1.756.248,43

ITEM 11

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses) para aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos –SEIA, de maneira a tornar mais consistente com posterior publicização as informações sobre os empreendimentos licenciados pelo Estado com enfoque na região de referência.			R\$3.120.000,00/2
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
				R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		

JUSTIFICATIVAS:

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e seis) meses.

Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se apresentou necessário o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal.

VALOR CONTRATADO R\$3.972.853,44

ITEM 12

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das informações específicas da região de referência sobre regras de uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com a respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão ambiental e a tomada de decisão. - A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão permanente de alertas <i>online</i> de supressão de vegetação, aos COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO; - Publicação contínua e sistemática das áreas de decréto de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas áreas de referência, entre todos os Entes Federativos e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$3.120.000,00/2
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
				R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$1.040.000	R\$1.040.000	R\$1.040.000			

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG Geobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais).

Diante do exposto, além da redistribuição dos valores inicialmente previstos entre as parcelas, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 10, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

VALOR CONTRATADO R\$3.261.604,22

ITEM 14

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 – Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação de todos os seguimentos responsáveis pela fiscalização na região de referência, quais sejam, IBAMA, ICMBIO, INEMA, DPA.			R\$ 1.141.100,00/3 R\$380.366,67 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67			
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 570.550,00	R\$ 570.550,00				

JUSTIFICATIVA:

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos.

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação de veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

ITEM 15

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 15 – Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação dos órgãos ambientais dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré.			R\$ 539.000,00/ 2
					R\$ 269.500,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$269.500,00	R\$269.500,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 539.000,00				

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 2.

ITEM 16

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 16 – Aquisição de bens para estruturação da Polícia Rodoviária Federal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a estruturação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para fiscalização na região de referência, sobretudo tráfico de madeira e de animais. OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, competência da Justiça Federal.			R\$ 500.000,00 / 2 R\$250.000,00 a parcela a ser dividida entre as duas Polícias.
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$250.000,00	R\$250.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$500.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor estimado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITEM 17

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 17 – Apoio estruturante ao Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação do Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus.			R\$1.000.000,00 / 2 R\$ 500.000,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$ 1.000.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITENS 18 e 19

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 18 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.			R\$2.000.000,00
	Item 19 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para construção da Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de serviços e um pequeno receptivo.			R\$350.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3(Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00			
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3(Item 19)	ANO 4 (Item 19)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00					
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADAPELO CTE					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3(Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
R\$2.000.000,00					
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3(Item 19)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00					

JUSTIFICATIVA:

Considerando o avanço das tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para o início da recuperação de áreas degradadas no interior do Parque Estadual da Ponta da Tulha com recursos externos ao TCSA, e com o intuito de obter economia nas contratações de serviços de engenharia para o cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha, as contratações do cercamento e da elaboração dos projetos de engenharia e fiscalização dos contratos de cercamento e execução da obra foram feitas concomitantemente e a execução da obra (item 19) foi realizada posteriormente.

ITENS 22, 23, 25, 26 e 27

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO			
ESPECIFICAÇÕES			
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.	R\$500.000,00
	Item 23 – Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Lagoa Encantada e Rio Almada: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão e elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha, tudo de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.	R\$400.000,00
	Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Conduru.: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.	R\$500.000,00
	ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Elaboração de Estudo visando a elaboração do Plano de Uso Público Parque Estadual Ponta da Tulha, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado	325.000,00
	ITEM 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	Elaboração de Estudo visando a elaboração do Plano de Uso Público do Parque Estadual Serra do Conduru. de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado	325.000,00

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
		R\$500.000,00			
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
		R\$400.000,00			
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
		R\$500.000,00			
ANO 1 (Item 26)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
			R\$325.000,00		
ANO 1 (Item 27)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
			R\$325.000,00		

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
	R\$400.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
	R\$325.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
	R\$325.000,00				

JUSTIFICATIVA:

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo e Planos de Uso Público das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23, 25, 26 e 27), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado. Foi alterada a ação 23 - Implementação do Plano de Manejo da APA Costa de Itacaré-Serra Grande para Revisão do Plano de Manejo da APA Lagoa Encantada e Rio Almada e Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha e integrada a contratação dos Itens 26 e 27 para otimizar a utilização do recurso.

ITEM 33

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 6: MEDIDA DEMITIGAÇÃO ECOMPENSAÇÃO COMPLEMENTAR FAUNA/FLORA	Item 33 –Contratação de serviço de recomposição de vegetação	Contratação de serviço para executar a recomposição de 100 (cem) hectares de vegetação, relacionado ao plantio compensatório complementar, considerando a supressão de, no máximo, 484 ha (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares de vegetação durante a fase de implantação do empreendimento.			R\$R\$1.403.952,87/ 3 R\$467.984,29a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100ha (cem hectares) por meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos da CLÁUSULA 20ª.
