



TCSA Porto Sul

10º Relatório de Execução



Comitê Técnico de Execução - CTE



Foto: Fabiana Salamene (membro CTE)

Período: 01/06/2025 a 30/11/2025

10º Relatório de Execução

TCSA Porto Sul

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 10º Relatório de Execução acerca das obrigações estipuladas em cumprimento do TCSA, referentes às ações previstas no Eixo 1 – Planejamento Territorial (item 1), Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental Integrada (itens 10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29), Eixo 6 - Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna e Flora (itens 30 e 33) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a proposição de atualização do Plano de Ações (ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II).

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo III) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas a melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33; acumulados. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes de cronograma, especialmente em virtude do gerenciamento de qualquer projeto.

Em outubro de 2024 foi concedida pelos COMPROMITENTES, a não objeção para contratação direta da Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP), da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), para execução da recomposição vegetal de 49 hectares em unidade de Conservação Federal, proposta pelo ICMBio no âmbito do item 33 conforme plano de ação apresentado pela Instituição para execução dos recursos destinados à aplicação em Unidades de Conservação Federais.

Em dezembro de 2024 foi concedida pelos COMPROMITENTES, a não objeção para inclusão da construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), a partir da unificação dos itens 30, 31 e 32 do Plano de Ação, Anexo 3 do TCSA Porto Sul, passando a ser apenas item 30 com a seguinte redação: Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM). Foi aprovado ainda o remanejamento de recursos no montante de R\$ 3.243.288,20 oriundos do item 7 (R\$ 780.000,00) e de rendimentos (2.463.288,20) para complementar a previsão orçamentária para execução da nova ação.

Com relação ao Protocolo de Fiscalização, esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no IBAMA o processo 02006.001564/2021-78 para assinatura do Termo de Adesão. Foram acatadas pela SEMA as sugestões de ajustes no instrumento de adesões encaminhadas pelo IBAMA, entretanto, recebemos nova solicitação de ajuste informando que conforme entendimento interno, a espécie de ato negocial tratada é um Acordo de Cooperação Técnica e não Termo de Adesão e Compromisso, portanto o processo encontra-se em trâmite visando instrução para análise da definição do ato negocial

Ratificamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da CLÁUSULA 29ª, que houve variação cambial em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços dos itens 13, 14 e 15, base 2018, comprometendo a aquisição do conjunto de equipamentos que compõem as especificações dos itens supracitados, exigindo a deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para adequação e suplementação com recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em conta) dos aportes anuais para sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª.

Não obstante, registramos o comprometimento de **R\$ 30.216.020,78** (trinta milhões duzentos e dezesseis mil vinte reais e setenta e oito centavos) correspondentes a **59,77%** (cinquenta e nove vírgula setenta e sete por cento) do montante de **R\$ 50.552.726,45** (cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

No que concerne ao total de despesas pagas, registramos o correspondente a **R\$ 26.314.549,52** (vinte e seis milhões, trezentos e catorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), equivalentes a **52,05%** (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) do montante depositado pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

Vale destacar, que foi realizado o 1º Seminário do TCSA Porto Sul que ocorreu no dia 30 de julho de 2025 no Salão Nobre do MPBA, o objetivo do encontro foi dialogar sobre a experiência exitosa do TCSA Porto Sul como modelo replicável em outras temáticas e territórios. Reuniu membros do Comitê Técnico do TCSA, servidores da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), servidores dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, servidores da Procuradoria Geral do estado da Bahia (PGE), representantes do FUNBIO, além de integrantes dos órgãos envolvidos e convidados.



1 – Registro Seminário do TCSA Porto Sul



2 – Registro da abertura do Seminário TCSA Porto Sul

Nos termos da Cláusula 28ª do TCSA Porto Sul e do Manual Operacional do Projeto (MOP), os rendimentos e eventuais saldos remanescentes deverão ser utilizados, mediante deliberação do CTE e com ciência dos Compromitentes, para o custeio das seguintes ações e medidas complementares, observada a ordem estabelecida:

- i. complementação do valor planejado para a realização de aquisições e contratações, incluindo ações complementares, desde que aderentes ao escopo do TCSA;
- ii. apoio ao custeio das fiscalizações ambientais;
- iii. prorrogação ou majoração dos prazos de contratos de tecnologia da informação, aquisição e tratamento de imagens (Planet) ou outros serviços previstos nos anexos do TCSA, quando necessário, respeitado o prazo total de 72 (setenta e dois) meses de execução;
- iv. projetos de criação de RPPNs e outras medidas de compensação ambiental em áreas de significância ecológica, no Bioma Mata Atlântica, localizadas na Região de Referência e no Corredor Sul;
- v. apoio aos Planos da Mata Atlântica dos Municípios da Região de Referência e do Corredor Sul.

Para atendimento à esta cláusula, neste segundo semestre de 2025 foi elaborado o Plano de Ações para execução dos recursos de correção monetária e rendimentos que dará subsídio ao aditivo do Acordo de Cooperação nº 002/2020 celebrado com o FUNBIO.

Quadro 1 - Descrição das Ações – (Execução / Concluídos)

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
1	ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Em elaboração de proposta em conjunto com o item 2 para contratação direta da UESC.	-
	ITEM 02: Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	Em elaboração de proposta em conjunto com o item 1 para contratação direta da UESC.	-
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	Contrato firmado <i>Equipamentos instalados</i>	080/2021-ATIVA
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	Contrato firmado <i>8ª manutenção realizada em setembro/2025</i>	
	ITEM 05: Aquisição de Equipamentos para Coleta de Dados da Qualidade da Água	Concluído	-
	ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	Contrato concluído	167/2023- PCT
	ITEM 07: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Ação cancelada, recurso remanejado para novo item 30	-
	ITEM 08: Aquisição de serviço de imagens de alta resolução	Aquisição se mostrou inviável, o recurso deverá ser remanejado (aguardando definição)	-
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	Contrato firmado	105/2021- GEOAMBIENTE
3	ITEM 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação unificada com o item 12	106/2021-AVANSYS (Mudou para NETRA)
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	Contrato concluído	121/2021-AVANSYS
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	Contratação unificada com o item 10	106/2021-AVANSYS (Mudou para NETRA)
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	Concluído	063/2021, 064/2021, 073/2021

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual.	Concluído	-
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	Concluído	-
	ITEM 16: Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	Concluído	-
	ITEM 17: Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	Finalizando aquisições, aguardando indicação de aquisições para o saldo restante	
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Contrato concluído	019/2021 Peixoto Monteiro Eng. Ltda - 049/2022 ENGETELA COM e SERV EIRELI
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Contrato concluído	121/2023 - GMC Construções
	ITEM 20 - Sinalização da APA Lagoa Encantada-Rio Almada	Contratação unificada, objetivando a padronização otimização dos serviços Layout das placas contratado Confecção e Instalação das placas a contratar	Layout das Placas -Pedido de Compra n.º 656091 – Fino Traço Artes Visuais Ltda.
	ITEM 21 - Sinalização da APA Costa de Itacaré-Serra Grande		
	ITEM 24 - Demarcação física e sinalização do PE da Serra do Conduru		
	ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Contratação unificada, objetivando a realização de um planejamento territorial integrado. Contrato em execução conforme planejado	197/2023 - Seleção Natural
	ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande		
	ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha		
	ITEM 27 -Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 29: Destinação de recursos para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	Plano de aquisições e contratações apresentado pelo ICMBio em execução	-

Eixo	Item / Ações	Status	Nº do Contrato
6	ITEM 30: Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)	Contrato em execução Obras a contratar	117/2025 - Margem Arquitetura
6	ITEM 33: Contratação de serviço de recomposição de vegetação	Ação foi subdividida em duas: 1 - ICMBio - contratação direta da UFSB para executar projeto de recuperação em conclusão e 2 – INEMA - Processo de contratação sem sucesso, analisando possibilidade de contratação direta para recuperação de 51ha	-
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	Concluído Repasse efetuados, conforme programação de execução.	005/2021 - Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia

Quadro 2 – Demonstrativo dos Valores Executados: Comprometidos e Pagos:

Eixo	Item / Ações	Valor Estimado INICIAL (R\$)	Valor Estimado ATUAL (R\$)	Valor Comprometido (R\$)	Valor Pago (R\$)
1	ITEM 01: Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	ITEM 02: Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	297.450,00	354.590,00	339.495,00	339.495,00
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	348.750,00	348.750,00	449.725,01	416.825,00
	ITEM 05: UMRs para coleta de dados da qualidade da água	770.000,00	608.090,00	709.854,08	707.104,08
	ITEM 06: Monitoramento da Água	390.000,00	390.000,00	340.000,00	340.000,00
	Item 07 - Consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
	ITEM 08: Imagens de alta resolução	2.059.200,00	924.808,12	0,00	0,00
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	961.920,00	2.246.504,74	1.872.465,78	1.398.955,01
3	ITEM 10: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para desenvolvimento do painel de monitoramentos.	1.560.000,00	1.582.089,92	1.778.338,35	944.065,82
	ITEM 11: Contratação de	3.120.000,00	3.209.299,08	3.898.421,19	3.809.122,11

	serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.				
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	3.120.000,00	3.533.205,54	3.674.809,76	3.261.604,22
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	1.393.400,00	1.792.702,77	1.357.658,44	1.354.658,44
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal e estadual.	1.141.100,00	1.353.785,40	1.355.110,45	1.355.110,37
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	539.000,00	843.240,42	937.965,82	933.590,82
	ITEM 16: Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	500.000,00	467.921,00	536.120,76	536.120,76
	ITEM 17: Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	1.000.000,00	781.222,00	669.662,22	669.662,22
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	2.000.000,00	2.134.790,00	1.529.129,10	1.529.129,10
	ITEM 19: Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	350.000,00	850.007,34	778.412,09	778.412,09
	ITEM 20, 21 e 24: Sinalização das APAs Lagoa Encantada-Rio Almada, Costa de Itacaré-Serra Grande e Demarcação física e sinalização do PE da Serra do Conduru	500.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	ITEM 22/23/25/26 e 27: Revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	2.050.000,00	2.089.520,00	2.122.131,34	1.339.677,72

	Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ITEM 29:Apoio à UCs federais do Corredor-PMBE-Lontras	6.000.000,00	3.052.765,89	1.216.389,07	1.062.832,07
6	ITEM 30: Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)	2.435.037,60	460.000,00	444.200,00	39.978,00
	ITEM 33: Recomposição de vegetação	1.403.952,87	1.399.776,44	697.800,00	314.010,00
7	ITEM 34: Repasse de recurso p/ a implementação de um Observatório Socioambiental.	450.559,67	450.559,67	450.559,67	450.559,66
	ITEM 36: Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)	4.505.596,68	4.505.596,68	5.055.272,65	4.730.918,43
	Tarifas Serviços Bancário				2.718,60
	TOTAL ==>	45.055.966,82	33.404.225,01	30.216.020,78	26.314.549,52

DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS

Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14ª e 15ª, o PRIMEIRO e o SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos de fiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro (CIPPA/Porto Seguro), a Delegacia de Proteção Ambiental/Ilhéus (DPA/Ilhéus) e os Municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus e o ICMBio formalizaram a adesão ao referido PROTOCOLO.

Cumprе ressaltar que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) indicou o interesse de promover a assinatura de Termo de Adesão ao supracitado PROTOCOLO, contudo até o momento ainda não concluiu as tratativas, aguardando definição sobre questionamento do IBAMA acerca da espécie de ato negocial solicitado via Ofício 402/2024/SUPES-BA. Cumprе registrar que os Termos de Adesão, em questão, estão relacionados ao Processo SEI nº 027.13520.2021.0000742-14 que trata do Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada.

Com relação à CLÁUSULA 9ª, parágrafo único, vale ressaltar que os dados já produzidos até o momento são lançados nos sistemas informatizados permitindo desta forma, que sejam observados pelas equipes técnicas tempestivamente nas situações em que haja necessidade de consultá-los.

Com relação à CLÁUSULA 11ª cumprе informar que ações estão sendo executadas no sentido de atender aos subitens: I, II e III e parágrafos: primeiro, segundo e terceiro. O SIGWeb Geobahia, cuja manutenção e evolução foi executada através do Contrato 106/2021, disponibiliza os dados/indicadores ambientais produzidos e utilizados pelo INEMA, relativos a todo o território do estado da Bahia, incluindo a área de abrangência do Porto Sul. Os dados relativos ao monitoramento do decrémento de vegetação nativa, produzidos através do projeto Harpia, estão disponíveis no SIGWeb Geobahia.

O Projeto de Painel de Monitoramento encontra-se em execução, com recurso alocado por meio do Contrato 106/2021, integrado ao SIGWeb Geobahia. Atualmente, o projeto do Painel de Monitoramento encontra-se em fase de homologação do primeiro *dashboard* de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV); encontra-se em desenvolvimento o *dashboard* de Áreas Protegidas e em definição de escopo do *dashboard* de Recursos Hidrometeorológicos.

O INEMA tem disponibilizado, ao Observatório Socioambiental, os dados de monitoramento da vegetação (Harpia), bem como os dados de ASV (Autorização de Supressão Vegetal). Foram solicitadas também informações de outorgas e áreas embargadas, as quais o INEMA está viabilizando a disponibilização. Além disso o projeto de Painel de Monitoramento prevê a disponibilização de demais dados à Sociedade.

Quanto à CLÁUSULA 13ª, parágrafo único, informamos que a listagem de informações foi encaminhada por e-mail nas seguintes datas: 15/12/2021, 18/02/2022, 01/07/2022, 13/10/2022, 26/01/2023, 08/09/2023, 11/12/2023, 08/03/2024, 10/06/2024, 11/09/2024, 07/01/2025, 30/04/2025, 22/08/2025 e 30/10/2025.

Em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 16ª, informamos a realização pelo SEGUNDO COMPROMISSÁRIO das ações de fiscalização nos municípios incluídos na Região de Referência do TCSA Porto Sul, quais sejam: Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Barro Preto, Aurelino Leal, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itapitanga, Maraú e Ubaitaba. Foram obtidos através da consulta aos Sistemas SEI e CERBERUS, em pesquisa realizada para os meses de junho a dezembro de 2025, o quantitativo de 23 denúncias recepcionadas, sendo deste quantitativo, 01 identificadas, conforme Lei Complementar nº 140/2011, como de competência municipal e direcionadas mediante envio de Ofício, conforme previsto no PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul. Cabe registrar, ainda, que foram recebidas 28 demandas judiciais do Ministério Público Federal e Estadual, em análise e atendimento pelos técnicos da fiscalização tanto da sede quando da Unidade Regional Sul.

Adiciona-se a este levantamento a realização de 01 operação planejada denominada Operação Poços, relacionada a fiscalização da captação irregular de Recursos Hídricos das portarias de Outorga INEMA no município de Itabuna, realizado pela UR Sul; 01 operação planejada, denominada, Operação TRPP com a Polícia Rodoviária Federal e IBAMA em parceria com a equipe da UR Sul em Itabuna, visando a fiscalização de transportes rodoviários de produtos perigosos; 01 Operação TCSA Sul nos temas Florestal e Fauna, nos municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, sendo realizadas por técnicos da Unidade Regional - UR Sul e equipe técnica da Sede do INEMA atuando conjuntamente na apuração aos alertas de desmatamento e apuração aos ilícitos relacionados à fauna (incluindo resgate da fauna por equipe especializada da Coordenação de Gestão de Fauna _ CGFAU) nas Unidades de Conservação na região como em Ponta da Tulha, em Ilhéus e APA Serra Grande/Itacaré.

Sobre o PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul, foi realizado planejamento para mobilização em 2026 visando a participação dos municípios envolvidos, para a devida atualização do Protocolo, com envolvimento do consócio vinculado ao Programa GAC - Gestão Ambiental Compartilhada.

DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO

Considerando os desembolsos anteriores o total desembolsado até a presente data corresponde ao montante de **R\$ 50.552.726,45** (cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), contemplando as devidas correções e os itens I, II, III, IV e V da Cláusula 27ª do TCSA.

Cabe informar que em 20/05/2025 foi enviado para a BAMIN com cópia para os compromitentes e demais compromissários, o Ofício nº 006/2025 SEMA/CTE solicitando o pagamento do 6º desembolso pelo fato de ter sido atendida a meta de 51,48% de execução do valor até então depositado pela empresa.

A BAMIN respondeu ao Ofício por meio da Carta nº 22/2025, na qual apresenta solicitação formal de parcelamento do pagamento da 6ª e última parcela prevista no Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul.

A proposta apresentada pela empresa detalha a divisão do valor atualizado de R\$ 9.406.843,77 (nove milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) em quatro parcelas sucessivas, a serem quitadas entre setembro de 2025 e abril de 2026, conforme cronograma e justificativas constantes na referida correspondência

Diante das justificativas apresentadas, a proposta de parcelamento da sexta e última parcela do TCSA Porto Sul, submetida ao Comitê Técnico de Execução - CTE, por meio da Carta, foi devidamente analisada e aprovada pelo referido Comitê. Além disso, a proposta foi submetida à deliberação do Ministério Público da Bahia e do Ministério Público Federal, tendo obtido a não objeção à sua aceitação.

Portanto ficou definido que o pagamento da sexta parcela, devidamente corrigida até a data do pagamento passou a ser da seguinte forma:

- i) 50% (cinquenta por cento) do valor corrigido da sexta parcela, a serem pagos em duas parcelas iguais nos dias 30 de setembro e 28 de outubro de 2025;
- ii) os restantes 50% (cinquenta por cento), também corrigidos, a serem pagos em duas parcelas iguais nos dias 24 de fevereiro e 28 de abril de 2026.

Diante do exposto, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO realizou o depósito no montante de **R\$ 4.745.406,91** (quatro milhões setecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos), realizado em duas parcelas; sendo a primeira no valor de R\$ 2.710.673,00 (dois milhões setecentos e dez mil seiscentos e setenta e três reais.) em 23/09/2025 e a segunda no valor de R\$ 2.034.733,91 (dois milhões, trinta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) em 28/10/2025, devidamente corrigidos, referente a 50% do 6º desembolso previsto com valor nominal de R\$ 6.758.395,02 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos) conforme cópia dos extratos abaixo:


Consultas - Extrato de conta corrente

 G336011131927914009
 01/10/2025 11:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.039.295	2.710.673,00 C	2.711.027,69 C
341 6547 07392063000180 BAHIA MINERACA							

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

 G333031638839613011
 03/11/2025 16:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.724.070	2.034.733,91 C	2.042.935,43 C
341 6547 07392063000180 BAHIA MINERACA							

DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO

O QUARTO COMPROMISSÁRIO recebeu o Relatório de Acompanhamento Parcial referente ao 1º semestre de 2025, das atividades desenvolvidas pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, tendo sido aprovada a prestação de contas apresentada pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento da CLÁUSULA 25^a, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul.

O último aporte de recurso previsto no valor de R\$ 75.093,26 foi pago em 23/10/2025, portanto foi repassado o montante de R\$ 450.559,66 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) ao OBSERVATÓRIO SOCIAL sendo concluído o item 34 do Anexo 3.

DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

A Prestação de Contas recepcionada em 04/12/2025, formalizada pela Carta nº 920_2025 expedida pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), em determinação da CLÁUSULA 33ª do TSCA, contendo os documentos financeiros referentes ao período compreendido entre 01 de junho 2025 a 30 de novembro de 2025.

Após ingresso na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 3519-X, de 50% da sexta parcela depositada pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO totalizamos o montante de R\$ 50.552.726,45 (cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), contabilizando nas duas carteiras de aplicação financeira a rentabilidade líquida obtida foi de R\$ 8.524.036,66 (oito milhões quinhentos e vinte e quatro mil trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) acumulados até 30 de novembro de 2025.

As tarifas bancárias cobradas a cada pagamento efetuado totalizam em 30/11/2025 o montante de R\$ 2.718,60 (dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta centavos); que na prestação de contas da FUNBIO são deduzidos dos rendimentos auferidos para apuração dos rendimentos líquidos.

TCSA - PORTO SUL

Acompanhamento FINANCEIRO

Período	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
ago/20	6.758.395,02	84.417,42	9.756,83	153,00	-	9.603,83	-	159,44	6.852.416,27
set/20	-	-	6.686,34	-	-	6.686,34	-	159,44	6.859.102,61
out/20	-	-	10.750,38	-	-	10.750,38	-	159,44	6.869.852,99
nov/20	-	-	12.075,99	-	5.175,54	6.900,45	-	159,44	6.876.753,44
1a PC	6.758.395,02	84.417,42	39.269,54	153,00	5.175,54	33.941,00	-		6.876.753,44
dez/20	-	-	14.413,63	-	-	14.413,63	-	159,44	6.891.167,07
jan/21	-	-	12.136,21	-	-	12.136,21	-	159,44	6.903.303,28
fev/21	-	-	9.669,16	8,20	-	9.660,96	75.093,28	109,26	6.837.870,96
mar/21	-	-	17.141,48	-	-	17.141,48	-	109,26	6.855.012,44
abr/21	-	-	15.397,16	8,20	-	15.388,96	35.970,74	478,80	6.834.430,66
mai/21	-	-	7.559,35	-	-	7.559,35	570.234,34	7.722,86	6.271.755,67
2a PC	-	-	76.316,99	16,40	-	76.300,59	681.298,36		6.271.755,67
jun/21	-	-	23.144,03	11,60	-	23.132,43	535.598,49	4.368,86	5.759.289,61
jul/21	-	-	19.933,14	6,80	-	19.926,34	393.546,87	5.462,84	5.385.669,08
ago/21	9.011.193,36	1.029.935,25	24.508,42	16,40	-	24.492,02	8.000,00	10.041.129,10	15.443.289,71
set/21	-	-	60.674,42	8,20	-	60.666,22	242.445,42	4.391,72	15.261.510,51
out/21	-	-	73.957,08	3,40	-	73.953,68	261.889,99	180,80	15.073.574,20
nov/21	-	-	92.653,49	3,40	40.401,46	52.248,63	87.226,07	628,79	15.038.596,76
3a pc	9.011.193,36	1.029.935,25	294.870,58	49,80	40.401,46	254.419,32	1.528.706,84		15.038.596,76
dez/21	-	-	117.769,07	64,20	-	117.704,87	578.983,57	4.017,66	14.577.318,06
jan/22	-	-	104.293,50	67,60	-	104.225,90	1.540.229,32	1.983,08	13.141.314,64
fev/22	-	-	102.752,75	59,00	11.251,03	91.442,72	573.856,37	194,85	12.658.900,99

TCSA - PORTO SUL

Acompanhamento FINANCEIRO

Período	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
mai/22	-	-	123.899,46	39,60	87.932,01	35.927,85	239.274,42	1.890,91	11.303.945,72
4a pc	-	-	666.897,72	301,40	99.183,04	567.413,28	4.302.064,32		11.303.945,72
jun/22	-	-	115.071,60	28,00	1.683,67	113.359,93	319.737,42	313,94	11.097.568,23
jul/22	-	-	111.483,82	56,00	21.376,95	90.050,87	687.189,39	555,53	10.500.429,71
ago/22	-	-	114.515,62	31,40	-	114.484,22	565.874,36	760,27	10.049.039,57
set/22	-	-	105.546,92	67,60	-	105.479,32	644.091,37	2.755,92	9.510.427,52
out/22	-	-	94.279,33	31,40	-	94.247,93	367.547,34	1.006,84	9.237.128,11
nov/22	-	-	91.609,24	31,40	75.557,88	16.019,96	341.193,64	1.068,39	8.911.954,43
5a pc	-	-	632.506,53	245,80	98.618,50	533.642,23	2.925.633,52		8.911.954,43
dez/22	-	-	99.038,05	64,20	-	98.973,85	695.421,77	9.047,32	8.315.506,51
jan/23	9.011.193,36	2.148.108,10	76.296,39	11,60	3.796,30	72.488,49	419.530,29	120,23	19.127.766,17
fev/23	-	-	139.133,67	26,20	-	139.107,47	446.013,76	748,03	18.820.859,88
mar/23	-	-	199.384,78	28,00	-	199.356,78	391.430,90	628,99	18.628.785,76
abr/23	-	-	150.174,71	31,40	-	150.143,31	366.988,37	798,52	18.411.940,70
mai/23	-	-	214.062,99	26,60	116.513,91	97.522,48	359.264,88	651,82	18.150.198,30
6a pc	9.011.193,36	2.148.108,10	878.090,59	188,00	120.310,21	757.592,38	2.678.649,97	N/A	18.150.198,30
jun/23	-	-	199.314,16	44,40	-	199.269,76	384.675,34	563,10	17.964.792,72
jul/23	-	-	192.242,88	49,80	-	192.193,08	700.816,06	1.828,56	17.456.169,74
ago/23	-	-	211.892,26	95,60	-	211.796,66	583.753,32	1.524,45	17.084.213,08
set/23	-	-	166.932,51	41,00	6.234,39	160.657,12	462.072,91	915,28	16.782.797,29
out/23	-	-	169.019,21	80,60	-	168.938,61	605.896,51	1.949,60	16.345.839,39
nov/23	-	-	159.843,27	59,40	154.030,06	5.753,81	169.375,07	656,38	16.182.218,13
7a PC	-	-	1.099.244,29	370,80	160.264,45	938.609,04	2.906.589,21	N/A	16.182.218,13

TCSA - PORTO SUL

Acompanhamento FINANCEIRO

Período	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
jan/24	-	-	155.120,19	71,00	-	155.049,19	209.766,12	629,44	15.181.929,97
fev/24	6.758.395,02	1.997.844,42	161.356,24	31,40	-	161.324,84	490.241,13	974,78	23.609.253,12
mar/24	-	-	213.837,83	47,80	5.497,23	208.292,80	460.766,63	444,63	23.356.779,29
abr/24	-	-	194.359,87	39,60	-	194.320,27	409.030,31	469,52	23.142.069,25
mai/24	-	-	197.528,10	43,00	150.369,30	47.115,80	1.001.827,20	237.966,71	22.187.357,85
8a PC	6.758.395,02	1.997.844,42	1.070.731,46	303,80	155.866,53	914.561,13	3.665.660,85	N/A	22.187.357,85
jun/24	-	-	178.789,65	90,80	5.733,06	172.965,79	662.455,88	254,77	21.697.867,76
jul/24	5.000.000,00	-	208.357,10	95,60	-	208.261,50	652.671,21	90.967,49	26.253.458,05
ago/24	1.758.395,02	2.249.442,57	234.034,07	69,00	-	233.965,07	483.907,29	81,14	30.011.353,42
set/24	-	-	240.363,73	26,60	-	240.337,13	119.579,90	167,85	30.132.110,65
out/24	-	-	269.294,34	97,00	-	269.197,34	595.356,72	126,75	29.805.951,27
nov/24	-	-	226.464,01	47,80	179.346,86	47.069,35	242.024,82	2.360,50	29.610.995,80
9a PC	6.758.395,02	2.249.442,57	1.357.302,90	426,80	185.079,92	1.171.796,18	2.755.995,82	N/A	29.610.995,80
dez/24	-	-	217.271,67	41,60	-	217.230,07	348.697,72	468,51	29.479.528,15
jan/25	-	-	312.049,42	79,20	-	311.970,22	512.900,65	2.812,49	29.278.597,72
fev/25	-	-	295.796,50	23,20	-	295.773,30	163.635,24	2.085,88	29.410.735,78
mar/25	-	-	288.764,65	39,60	-	288.725,05	184.658,37	1.885,88	29.514.802,46
abr/25	-	-	287.136,07	38,20	-	287.097,87	435.084,79	R\$ 46,13	29.366.815,54
mai/25	-	-	345.421,92	56,00	232.089,43	113.276,49	488.188,33	25,15	28.991.903,70
10a PC	-	-	1.746.440,23	277,80	232.089,43	1.514.073,00	2.133.165,10	N/A	28.991.903,70
jun/25	-	-	313.655,80	71,00	-	313.584,80	521.853,79	1.789,49	28.783.634,71
jul/25	-	-	366.416,25	46,40	-	366.369,85	329.628,05	341,55	28.820.376,51

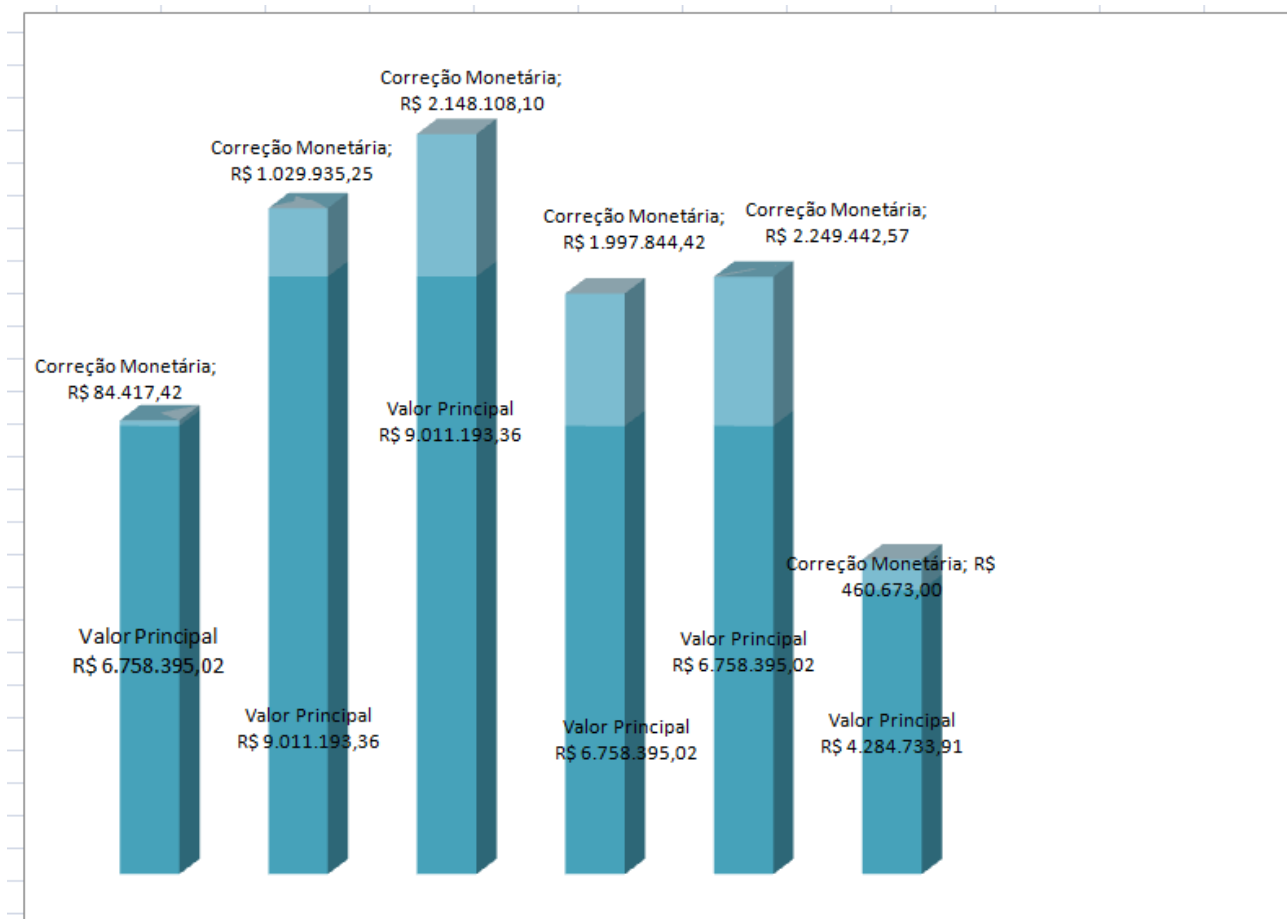
TCSA - PORTO SUL

Acompanhamento FINANCEIRO

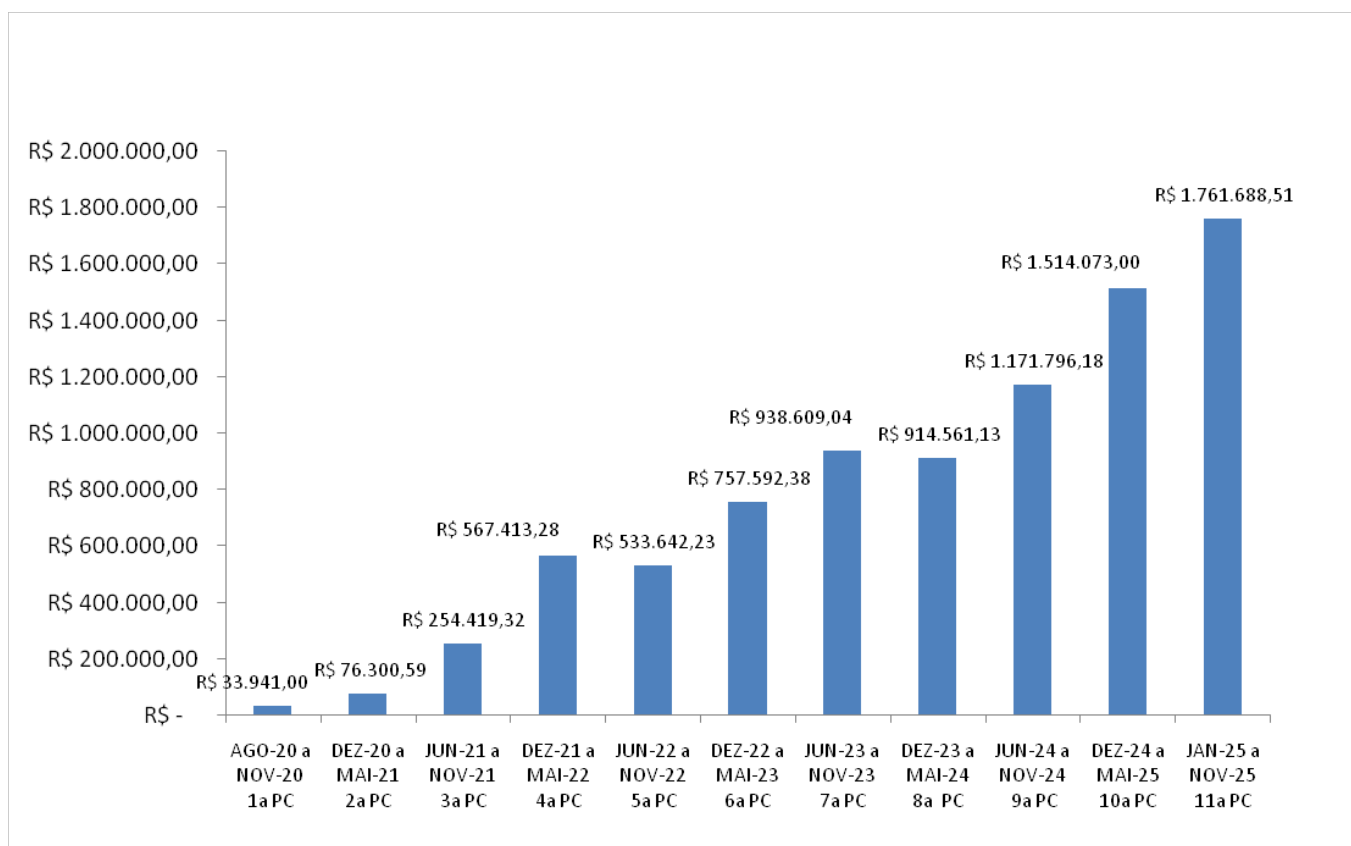
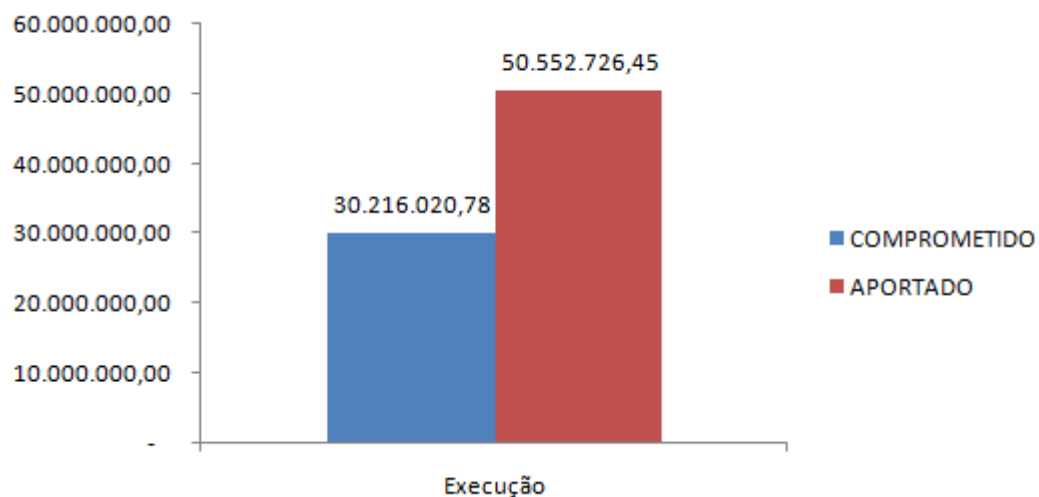
Periodo	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
set/25	2.250.000,00	460.673,00	340.290,58	62,80	-	340.227,78	617.148,12	209,79	31.213.335,35
out/25	2.034.733,91		359.930,38	56,00	-	359.874,38	316.912,10	231,23	33.291.031,54
nov/25	-	-	329.080,06	97,60	280.622,01	48.360,45	574.459,80	11.027,26	32.764.932,19
11a.PC	4.284.733,91	460.673,00	2.042.695,52	385,00	280.622,01	1.761.688,51	2.734.066,93	N/A	n/a
TOTAL	42.582.305,69	7.970.420,76	9.904.366,35	2.718,60	1.377.611,09	8.524.036,66	26.311.830,92	N/A	
	50.552.726,45		8.524.036,66						
SALDO DISPONÍVEL (Saldo Consolidado+ saldo em conta-corrente)									28.820.376,51
Pagamentos Acumulados			Aporte Acumulado			PAGAMENTOS ACUMULADO (incluindo Tarifas Serv Bancário)		% de Execução /Aporte	
			Após 1a. Parcela do 6º Desembolso BAMIN			50.552.726,45	26.314.549,52		52,05%

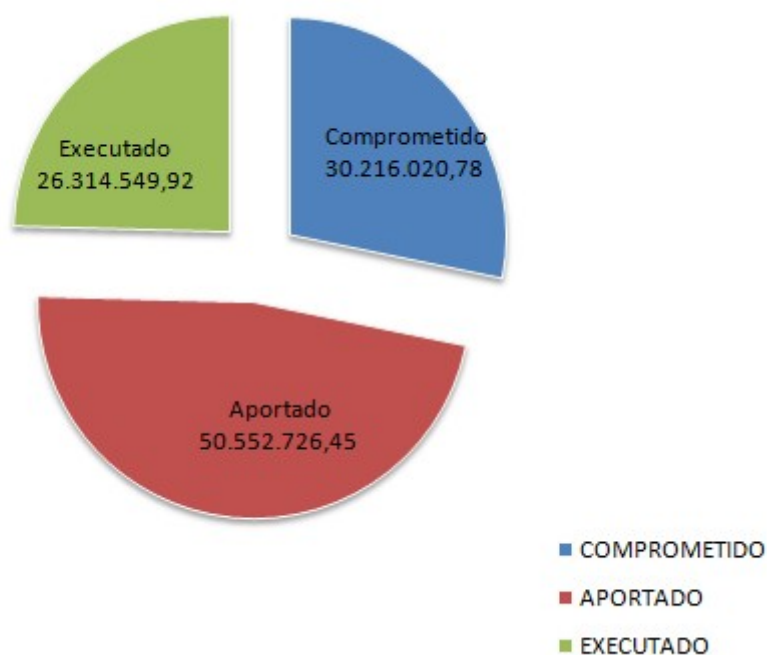
Resumo Financeiro – Detalhamento por Período das Prestações de Contas

	<i>Prestação de Contas</i>	<i>Período</i>	<i>Aporte Acumulado</i>	<i>Total Executado no Período</i>	<i>Pagamentos Acumulados</i>	<i>% de Execução / Aporte</i>
RESUMO - APORTES X EXECUÇÃO	1ª	AGO/2020 a NOV/2022	6.842.812,44	153,00	153,00	0,00%
	2ª	DEZ/2020 a MAI/2021		681.314,76	681.467,76	9,96%
	3ª	JUN/2021 a NOV/2021	16.883.941,05	1.528.756,64	2.210.224,40	13,09%
	4ª	DEZ/2021 a MAI/2022		4.302.365,72	6.512.590,12	38,57%
	5ª	JUN/2022 a NOV/2022		2.925.879,32	9.438.469,44	55,90%
	6ª	DEZ/2022 a MAI/2023	28.043.242,51	2.678.838,37	12.117.307,81	43,21%
	7ª	JUN/2023 a NOV/2023		2.906.960,01	15.024.267,82	53,58%
	8ª	DEZ/2023 a MAI/2024	36.799.481,95	3.665.964,65	18.690.232,47	50,79%
	9ª	JUN/2024 a NOV/2024	45.807.319,54	2.756.422,62	21.446.655,09	46,82%
	10ª	DEZ/2024 a MAI/2025		2.133.442,90	23.580.097,99	51,48%
	11ª	JUN/2025 a NOV/2025	50.552.726,45	2.734.451,93	26.314.549,92	52,05%

Gráfico 1 – Aportes Efetivados 1º ao 6º (50%) (em R\$)


No período de 01 de junho de 2025 a 30 de novembro de 2025 foram realizados pagamentos no montante de **R\$ 2.734.451,93** (dois milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), que somados aos anteriores na ordem de **R\$ 23.580.097,99** (vinte e três milhões quinhentos e oitenta mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos) totalizam **R\$ 26.314.549,92** (vinte e seis milhões trezentos e catorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos); correspondendo a **52,05%** (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) o total de despesas pagas em relação ao total de aportes.

Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação (em R\$)

Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado (em R\$):

Gráfico 4 – Total Executado x Aportado x Comprometido (em R\$):


Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA

TOTAIS	R\$
APORTADO	50.552.726,45
COMPROMETIDO	30.216.020,78
EXECUTADO	26.314.549,92
% Comprometido X Aportado	59,77%
% Executado X Aportado	52,05%

DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Harpia, no período de novembro de 2021 (início do projeto) à 30 de novembro de 2025.

Contextualização do Projeto

O Projeto Harpia tem por objetivo o monitoramento da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, compreendendo as seguintes atividades: interpretação visual e restituição de imagens orbitais através do software TerraAmazon 7, processamento, tratamento de imagens orbitais, validação da qualidade do mapeamento e produção de documentos técnicos (relatórios e pareceres técnicos). A área de abrangência dos trabalhos está compreendida pelos tiles (parte das cenas) do satélite Sentinel2 e que se sobrepõem à faixa Leste da Lei da Mata Atlântica da Bahia.

Atividades Previstas

Lote 1 – Produção do dado vetorial de vegetação nativa de referência do monitoramento (tempo zero do monitoramento – t0)

Este lote é composto pelos produtos 1 e 2, sendo eles:

- Produto 1

As atividades inerentes à entrega deste produto incluem a interpretação visual de imagens de orbitais (Sentinel2) fornecidas pelo INEMA, prontas para análise a ser realizada através do software TerraAmazon 7. Este produto tem como objetivo produzir dado vetorial de vegetação nativa de referência do monitoramento (tempo zero do monitoramento – T0).

- Produto 2

Compreende o reconhecimento e validação em campo dos produtos vetoriais produzidos. Deverão ser realizadas pelo menos 02 (duas) campanhas de 10 (dez) dias cada para levantamentos de campo na área de mapeada, objetivando a validação dos produtos vetoriais produzidos para toda a área de abrangência do projeto, garantindo a qualidade da informação, controlando erros de omissão e comissão, através da análise dos pontos de levantamento de campo previamente levantados.

Lote 2 – Monitoramento da supressão de vegetação, por interpretação visual de imagens orbitais

Este lote é composto pelos produtos 3, 4 e 5, sendo eles:

- Produto 3

Este produto é composto por interpretação visual das imagens Sentinel2 coletadas entre a data da máscara do monitoramento (tabela 1 – coluna data imagem T0) e o momento do quase tempo real. Este produto tem como objetivo compatibilizar temporalmente os dados de decremento produzidos, de tal maneira que o monitoramento quase tempo real tenha maior acurácia temporal dos polígonos gerados.

- Produto 4

Envolve a interpretação visual de imagens orbitais (monitoramento quase em tempo real) – dados vetoriais e relatório técnico mensal. Este produto é composto por interpretação visual das imagens Sentinel2 coletadas quase tempo real. Este produto tem como objetivo acompanhar o decremento de vegetação nativa na área de abrangência do projeto.

As entregas referentes ao monitoramento quase em tempo real serão feitas por cenas previamente definidas pelo INEMA, considerando os dados históricos de desmatamento até o período anterior ao que será interpretado, de forma regular, enquanto perdurar o contrato. A frequência de mapeamento será semanal, seguindo a frequência de geração de dados pelos satélites.

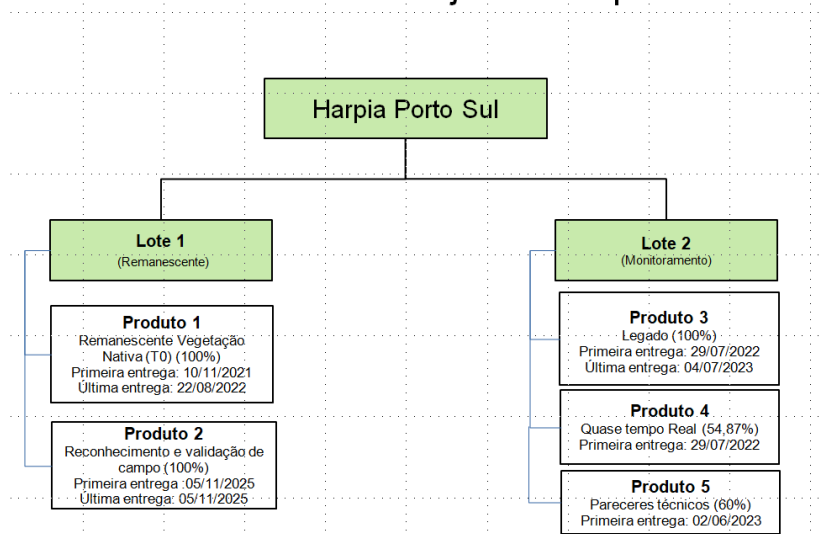
- Produto 5

As atividades inerentes à entrega deste produto incluem a elaboração de pareceres técnicos que detalhem e subsidiem as ações da fiscalização com informações para a instrução do processo (administrativo e/ou judicial). Tais documentos serão produzidos sob demanda, sendo estimado 6 (seis) pareceres no período de 12 (doze) meses, visando confrontar os resultados parciais ou totais do monitoramento de decremento da vegetação relacionando-os com os resultados de operações planejadas, denúncias ambientais.

Evolução das Entregas

Conforme descrito nos relatórios de entregas, apensados a este documento, o processo de evolução dos produtos previstos no escopo do projeto vem sendo garantido. Na execução do projeto, composto por cinco produtos conforme detalhado na imagem abaixo, foram atingidos os seguintes percentuais de execução: 100% do Produto 1 (Remanescente de Vegetação Nativa), 100% do Produto 2 (Reconhecimento e Validação de Campo), 100% do Produto 3 (Legado), 54,87% do Produto 4 (Quase Temporal) e 60% do Produto 5 (Pareceres Técnicos).

Estrutura Analítica do Projeto – Harpia Porto Sul



Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel de Monitoramento

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Painel de Monitoramento.

Contextualização do Projeto

Pretende-se que o Painel de Monitoramento Ambiental viabilize a visualização de dados autorizados ao longo do tempo referentes aos atos ambientais concedidos pelo INEMA de forma individualizada conforme a natureza de cada um destes. Além disso, o módulo possibilitará a geração de informações a partir desses dados, aprimorando assim a análise e a tomada de decisões no contexto ambiental.

Atividades Previstas

O projeto prevê a criação de painéis distintos, conforme listados abaixo, cada um com temáticas específicas, que possibilitarão o monitoramento detalhado dos atos ambientais. Considerando a restrição de tempo disponível para o desenvolvimento, será priorizado o atendimento aos painéis conforme a ordem estabelecida pelo ponto focal de negócio. Dessa forma, o projeto será desenvolvido até o limite do tempo disponível, e caso não seja possível concluir todos os painéis previstos, a prioridade será dada aos de maior relevância, sendo os de menor prioridade não desenvolvidos neste ciclo, conforme a necessidade de otimização dos recursos e prazos. Atualmente, os painéis idealizados são os elencados a seguir:

- I. Painel de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa
- II. Painel de Áreas Protegidas
- III. Painel de Recursos Hidrometeorológicos
- IV. Painel de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR)

Essa abordagem assegura que as demandas mais urgentes sejam atendidas de forma eficaz dentro do prazo estipulado, garantindo a entrega de um sistema robusto e de valor para o INEMA.

Evolução das Entregas

O projeto do Painel de Monitoramento teve início em 14 de novembro de 2024, com Luiz Araújo designado como ponto focal na área de negócios. As prioridades foram devidamente estabelecidas, e a equipe iniciou a fase de levantamento de requisitos, para o painel de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV) & Desmatamento Ilegal, além da estruturação básica do sistema. Esse estágio inicial visa garantir que as necessidades essenciais sejam atendidas e que a base técnica do sistema esteja sólida, permitindo uma evolução progressiva conforme o andamento do projeto.

Na execução do projeto Painel de Monitoramento de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV), o time concluiu 100% do escopo essencial e 67% do escopo desejável. Enquanto para a execução do Painel de Monitoramento de Áreas Protegidas, após algumas redefinições de escopo e reorganização das atividades, o grau de conclusão do escopo atualmente definido como essencial é de 19% e 26% do atualmente definido como desejável.

O Painel de Monitoramento de Recursos Hidrometeorológicos ainda está em fase de definição do escopo essencial e do escopo desejado para o projeto.

Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto SEIA.

Contextualização do Projeto

O SEIA (Sistema Estadual de Informações Ambientais) é um instrumento único de informações, capaz de proporcionar agilidade no atendimento ao cidadão e garantir a gestão eficiente dos processos ambientais por parte do governo do Estado da Bahia.

O SEIA consolidou-se como a ferramenta responsável pela operacionalização e modernização da gestão ambiental na Bahia, não só por permitir o trâmite online e centralizado dos atos autorizativos e dos cadastros ambientais, mas também por apoiar os processos de monitoramento e fiscalização ambiental, fornecendo informações relevantes para a gestão do meio ambiente.

Para proceder com uma melhoria tecnológica no SEIA, com relação aos dados geográficos do CEFIR, foi necessária a remodelagem básica do banco de dados do módulo CEFIR, em seus dados espaciais, com o intuito de melhorar o desempenho, manutenibilidade e escalabilidade, e otimizar recursos. Esta etapa tem sido denominada de Estabilização do CEFIR e é predecessora e necessária para que o sistema esteja compatível à integração com o SIGWEB Geobahia.

Além disto, o projeto visa desenvolver o Módulo de Dados Concedidos (Tipologia Autorização de Supressão de Vegetação - ASV) de forma a possibilitar a geração de dados a serem utilizados em relatórios gerenciais e, posteriormente, no projeto de Painel de Monitoramento, aperfeiçoando a gestão ambiental pelo Estado.

Atividades Previstas

O escopo das atividades desenvolvidas foi dividido em 02 (dois) grupos, conforme a seguir: Estabilização do CEFIR e Desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos.

Em relação à etapa de “Estabilização do CEFIR” foram previstas atividades relacionadas ao planejamento da remodelagem básica e a migração de tabelas. Em relação ao desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos (ASV), foram previstas atividades relacionadas à correção de erros e a inclusão de novos campos que permitirão a implementação de relatórios gerenciais.

Evolução das Entregas

Na execução do projeto de Dados Concedidos de ASV, foram concluídos 100% do escopo essencial e 12% do escopo desejável, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1	Essencial		
100%	NA	NA	
1.1	Estruturação Básica - Infraestrutura		
100%	05/07/2022	27/09/2022	
1.2	Criação do Formulário de Dados Concedidos em Novo Módulo		
100%	03/01/2023	09/08/2024	
1.3	Ajustes e Evoluções na Tela de Análise Técnica de Processos		
100%	30/09/2022	17/05/2024	
1.4	Ajustes e Evoluções na Tela de Aprovação de Análise Técnica de Processos de Atos ASV		
100%	03/05/2024	28/05/2024	
1.5	Criação de Relatório Gerencial em Novo Módulo		
100%	03/05/2024	09/08/2024	

2	Desejável
12%	NA NA
2.1	Evolução nas Telas de Notificação de Prazo
28%	NA NA
2.2	Ajustes e Evoluções na Tela de Aprovação de Análise Técnica de Processos de Atos ASV
0%	NA NA

Quanto ao projeto da remodelagem básica do CEFIR, 100% das atividades do time Porto Sul foram finalizadas, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1	Equipe Porto Sul
100%	22/11/2024 20/02/2024
1.1	Migração do Banco de Dados
100%	22/11/2021 14/07/2023
1.2	Melhorias Evolutivas no SEIA
100%	21/02/2022 22/08/2022
1.3	Testes COTIC
100%	14/07/2023 18/10/2024

Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais

O presente tópico tem por objetivo elencar as principais atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Geobahia, no período de setembro de 2021 (início do projeto) a novembro de 2025.

Contextualização do Projeto

O Geobahia tornou-se uma ferramenta indispensável à realização das atividades das áreas do INEMA. Na direção de um caminho ainda mais promissor, o projeto envereda para uma concepção que extrapola o entendimento de um SIG convencional para visualização e manipulação de dados e acrescenta a vertente das temáticas do negócio voltadas para a análise e interpretação de dados, definindo interfaces específicas de acordo com o perfil de usuário. Com o amplo leque de atividades do Instituto, que passa pelas atividades de Regulação, Fiscalização, Monitoramento, Unidades de Conservação e Biodiversidade e Gestão das Águas, as diferentes áreas técnicas que possuem a componente espacial fortemente presente em suas ações, foi necessário pensar em um modelo de negócio de SIG web que estivesse integrado e agregasse valor ao negócio do INEMA. Para isso, algumas diretrizes foram consideradas no projeto Geobahia, tais como: a gestão inteligente da informação espacial, segurança da informação, aumento do desempenho e implementação de interfaces/módulos personalizados.

Tais diretrizes visam alcançar um cenário de gestão integrada da informação espacial, até então não explorado nas instituições públicas da Bahia, a partir da utilização de ferramentas *Open Source*.

Atividades Previstas

O projeto previu a atualização tecnológica do SigWebGeobahia, bem como o desenvolvimento de novas funcionalidades, como as listadas a seguir:

- Atualização tecnológica dos módulos do Geobahia;
- Atualização da interface de usuário possibilitando melhor organização das informações e melhor experiência dos usuários no uso das ferramentas e módulos do Geobahia;
- Desenvolvimento de análise automatizada de consultas espaciais;
- Criação de novas ferramentas de apoio à análise técnica ambiental;
- Disponibilização de temas e serviços ambientais;
- Módulo de Administração, para gestão dos dados e controles de usuários e permissões.

Evolução das Entregas

Na execução do projeto Geobahia, o time concluiu 100% do escopo essencial e 51% do escopo desejável, conforme detalhado nas imagens abaixo.

1 Escopo essencial 100%	2 Melhorias desejáveis 54%	
1.1 Melhorar interação com as camadas do mapa 100%	2.1 Melhorar interação com as camadas do mapa 40%	
1.2 Layout de impressão (escopo essencial) 100%	2.2 Ferramentas de geoprocessamento 62%	
1.3 Ferramentas de geoprocessamento 100%	2.3 Aplicação Geodados 100%	
1.4 Desativar o Geobahia I3Geo 100%	2.4 Ferramentas de Análise 66%	
1.5 Construção da landing pages para divulgação do Geobahia 100% 20/09/2022 27/03/2023 OES: 006/2022	2.5 Implementar ferramenta de medição que gere estatística para gestão da usabilidade do sistema 0% NA NA OES:	
1.6 Aplicação Geodados 100%	2.6 Substituir o I3Geo pelo Geobahia 50%	
1.7 Módulo de administração 100%	2.7 Solução para download das camadas dinâmicas do CEFIR 0% NA NA	
1.8 Dados Concedidos - ASV no Geobahia 100%	2.8 Leitura e exibição dos dados espaciais do CEFIR (com remodelagem) 0% NA NA	

Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.

A execução do Contrato n.º 049/2022 (serviços de cercamento da poligonal do PEPT), no valor total de R\$1.358.039,10 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, trinta e nove reais e dez centavos), firmado com a empresa Engetela Comércio e Serviços Ltda., já acrescido de um aditivo para a elaboração do georreferenciamento do cercamento do Parque, foi concluída com o cercamento de aproximadamente 25,8 (vinte e cinco vírgula oito) quilômetros relativos aos limites do Parque. Entretanto, a empresa deixou de entregar o produto referente ao georreferenciamento na forma como exigido no contrato, tendo o valor respectivo sido glosado, no valor de R\$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais). O serviço de georreferenciamento será contratado posteriormente.

Ressalto que houve também a contratação da fiscalização do serviço por meio do Contrato n.º 119/2021, firmado com a empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda, que realizou a análise das propostas durante a licitação e, quando da execução do Contrato n.º 049/2022, sete medições de acompanhamento do contrato, atestando o cumprimento do objeto contratado, ressalvado o produto relacionado ao georreferenciamento.

Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para construção da Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de serviços e um pequeno receptivo.

Para a execução do item 19, foi contratado inicialmente a elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da sede, pórtico e guarita do PEPT, além de apoio na seleção das empresas que seriam contratadas para o cercamento e obra e da fiscalização da obra e dos serviços de cercamento do Parque quando da sua execução, tudo através do Contrato n.º 119/2021, firmado com a empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda., no valor de R\$229.400,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais), valor após a realização de dois aditamentos.

Os produtos relacionados à elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares foram entregues e serviram como base para a elaboração da Carta Convite 188/2023, licitação da qual derivou o contrato 121/2023, firmado com a empresa GMC Engenharia para construção da sede, pórtico e guarita do Parque Estadual Ponta da Tulha, no valor total de R\$ 764.587,35 (setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), após dois aditivos. A obra foi finalizada em junho/2025 e a sede foi inaugurada no mesmo mês, estando equipada com área de trabalho, cozinha/copa, quarto de apoio a pesquisadores, sala de reunião e três sanitários, sendo um deles com acessibilidade para cadeirantes. Seguem fotos da sede:



1 – Sede do Parque Estadual Ponta da Tulha - PEPT



2 – Portal de entrada do Parque Estadual Ponta da Tulha – PEPT

Itens 21, 22 e 24 - Contratação de serviços gráficos para sinalização e demarcação de limites para a APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, APA Costa de Itacaré- Serra Grande e Parque Estadual Serra do Conduru

Ante a semelhança do objeto, foi elaborado um termo de referência para a contratação conjunta dos serviços de elaboração do layout das placas de sinalização para as três unidades de conservação, firmado em 18/06/2025 com a empresa Fino Traço Artes Visuais Ltda. cujo contrato se encontra concluído, com layouts e manual de aplicação entregues.

Com a entrega dos layouts das placas de sinalização, será dado andamento à contratação dos serviços de confecção e instalação das placas de sinalização, também de forma conjunta para otimizar a execução, uma vez que as três unidades de conservação são contíguas.

Itens 22, 23, 25, 26 e 27 - Revisão e elaboração dos planos de manejo da APA Costa de Itacaré Serra Grande, APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, Parque Estadual Serra do Conduru e Parque Estadual Ponta da Tulha, e Planos de Uso Público do Parque Estadual Serra do Conduru e Parque Estadual Ponta da Tulha.

Para a execução conjunta dos itens 22, 23, 25, 26 e 27 foi elaborado um único Termo de Referência, com o objetivo de otimizar a realização do levantamento de dados e realização de oficinas, além de obter instrumentos de gestão com uma visão integrada do território, refletindo o trabalho de integração realizado pelos servidores responsáveis pelas Unidades de Conservação. O Edital para a contratação foi publicado em maio sob o n. 222/2023 e dele derivou o contrato n.º 197/2023, firmado com o Consórcio de empresas Seleção Natural e Bioteia.

Na presente data, foram concluídas as ações: (1) Reconhecimento de Campo e elaboração do Plano de Trabalho; (2) Caracterização das Unidades de Conservação; (3) Realização das Reuniões Preparatórias; (4) Elaboração dos Cadernos Orientadores e; (5) Realização das Oficinas Prévias e (6) realização das Oficinas de Elaboração dos Planos de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha e da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada e do Rio Almada (APA LERA) e do Parque Estadual Ponta da Tulha (PEPT), (7) a realização das oficinas de revisão do Parque Estadual da Serra do Conduru e a oficina de revisão do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental da Costa de Itacaré/Serra Grande.

Cumprir informar que para a APA da Costa de Itacaré/Serra Grande, em função da não conclusão da oficina de forma presencial, foi planejada a conclusão das atividades de forma remota. Ressalta que no tempo programado, a discussão de algumas zonas do zoneamento proposto se estendeu mais do que o esperado. Isso tem como pano de fundo a complexidade do território e seus diversos interesses.

A atividade remota foi planejada em basicamente três etapas a saber - consulta por meio de formulários; reunião virtual com uso de software de geolocalização; e em desenvolvimento na presente data, uma nova consulta através de formulários para definição das zonas para algumas porções do distrito de Serra Grande.

As oficinas contaram com a participação média de 25 a 30 atores sociais, por oficina, que possuem relação com o território cuja participação foi essencial para o planejamento pois, além de conhecerem o território, participaram ativamente na proposição dos componentes

fundamentais, componentes dinâmicos e componentes normativos, com destaque para o zoneamento e as normas que incidirão sobre as áreas protegidas.

Como participantes das oficinas, além dos gestores das unidades, tivemos membros do poder público das esferas municipal, estadual e federal, pesquisadores, empreendedores, sociedade civil organizada, pequenos proprietários de terra, atores sociais ligados às atividades turísticas, dentre outros. Ressaltamos que para a execução das oficinas, houve um intenso trabalho interno das equipes da SEMA e do INEMA junto a consultoria Seleção Natural/Bioteia na elaboração dos Guias dos Participantes sendo este material disponibilizado aosicineiros previamente a realização dos trabalhos.

Destacamos que foram entregues as primeiras versões dos planos de manejo da APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, do Parque Estadual da Serra do Conduru e do Parque Estadual Ponta da Tulha que estão em revisão pela equipe da SEMA e do INEMA.



1 –Participantes da Oficina de Revisão do Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental da Costa de Itacaré/Serra Grande



2 – Painel da facilitação gráfica construído durante a oficina de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ponta da Tulha.



3 – Exemplo de Guia do Participante elaborado para cada uma das unidades de conservação para utilização durante as oficinas principais.

Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)

Em janeiro de 2025, foi encaminhada ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) a versão final do Termo de Referência contendo a Especificação Técnica para a contratação dos Projetos Executivos destinados à construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres Sul (CETAS Sul) e à reforma do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM), incluindo também os serviços de assessoria técnica para a contratação das obras e a fiscalização de sua execução.

Na sequência, o FUNBIO promoveu a publicação da Carta Convite referente ao processo seletivo de empresas interessadas na execução dos referidos serviços, cujo período de seleção se estendeu até o mês de março de 2025. Em fevereiro, foi realizada visita técnica com a participação das empresas proponentes no local de implantação dos CETAS.

Em 02 de maio de 2025, a empresa Margem Arquitetura firmou o Contrato nº 117/2025 com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), tendo como objeto a elaboração dos Projetos Executivos para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres Sul (CETAS Sul) e reforma do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM). O contrato também contempla a prestação de assessoria técnica para o processo de seleção das propostas relativas à contratação das obras e a subsequente fiscalização da sua execução.

Nos dias 13 e 14 de maio de 2025, foi realizada a primeira visita técnica presencial obrigatória ao local de implantação dos empreendimentos (Centro Ambiental do Porto Sul – CAPS). A equipe técnica da Margem Arquitetura, composta por duas arquitetas e um engenheiro civil, participou da visita, acompanhada pelo ponto focal do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), responsável pelo acompanhamento técnico do contrato (Foto 1).

O contrato se encontra em execução sendo registrada a entrega dos seguintes produtos: Plano de Trabalho, Levantamento topográfico, Estudo preliminar arquitetônico, Anteprojeto CETAS, Anteprojeto CETAM, Projeto legal do CETAS, Projeto legal CETAM, Projeto Executivo CETAS Sul. Além disso, o TDR para contratação das obras está em fase de elaboração.



Foto 1. 1ª Visita Técnica presencial obrigatória da empresa contratada no local de implantação do CETAS Sul e CETAM (CAPS).

ANEXO I - Plano de Ações Atualizado

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL - Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	R\$3.500.000,00		R\$1.750.000,00	R\$1.750.000,00			
	Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	R\$2.000.000,00			R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00		
EIXO 2 - MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL - Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos	R\$297.450,00	R\$297.450,00					
	Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos	R\$348.750,00	R\$348.750,00					
	Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	R\$770.000,00		R\$770.000,00				
	Item 6 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	R\$390.000,00		R\$390.000,00				
	Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal AÇÃO CANCELADA - SALDO REMANEJADO	R\$0,00						
	Item 08 - Aquisição de imagens de alta resolução	R\$961.926,00			R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00
	Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	R\$2.059.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 3 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	R\$1.560.000,00				R\$780.000,00	R\$780.000,00	
	Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais denominada SEIA	R\$3.900.000,00		R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		
	Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$3.120.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00			
	Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/NEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema)	R\$1.393.400,00	R\$1.393.400,00					
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	R\$1.141.100,00	R\$570.550,00	R\$570.550,00				
	Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	R\$539.000,00		R\$539.000,00				
	Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	R\$500.000,00			R\$500.000,00			
	Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$1.000.000,00			R\$1.000.000,00			

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 5 - FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00					
	Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$350.000,00	R\$350.000,00					
	Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$200.000,00					R\$200.000,00	
	Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$200.000,00					R\$200.000,00	
	Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
	Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$400.000,00		R\$400.000,00				
	Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$100.000,00					R\$100.000,00	
	Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
	Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
	Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
	Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$1.100.000,00						R\$1.100.000,00
	Item 29 - Repasse de recurso para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	R\$6.000.000,00		R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00

EIXO	AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
EIXO 6: MEDIDA DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO SUPLEMENTAR À FAUNA/FLORA	Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para Implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) Sul e do Centro de Triagem de Animais Marinhos (CETAM)	R\$5.678.325,80						R\$5.678.325,80
	Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho <i>CANCELADA - VALOR REMANEJADO</i>	R\$0,00					R\$0,00	R\$0,00
	Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção do CETAS Marinho <i>CANCELADA - VALOR REMANEJADO</i>	R\$0,00					R\$0,00	R\$0,00
	Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação	R\$1.403.952,87			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	
EIXO 7 - GOVERNANÇA AMBIENTAL	Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental	R\$450.559,67	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28
	TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES	R\$43.013.664,34	R\$6.452.049,65	R\$8.602.732,87	R\$8.602.732,87	R\$6.452.049,65	R\$6.452.049,65	R\$6.452.049,65
	TAXA ESTIMADA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) PERCENTUAL MÁXIMO	R\$4.505.596,68	R\$675.839,50	R\$901.119,34	R\$901.119,34	R\$675.839,50	R\$675.839,50	R\$675.839,50
	TOTAL PREVISTO	R\$45.055.966,82	R\$7.127.889,15	R\$9.503.852,20	R\$9.503.852,20	R\$7.127.889,15	R\$7.127.889,15	R\$7.127.889,15

ANEXO II – Parecer Técnico

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 22, 23, 25, 26, 27, 33; acumulados. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, especialmente em virtude de imprevistos operacionais, inerentes ao gerenciamento de qualquer projeto.

ITEM 1

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 – Fortalecimento Dos Corredores Ecológicos –	Contratação de serviço para a realização da caracterização socioambiental de imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, <u>para subsidiar ações de regularização ambiental, preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites legalmente estabelecidos e recuperação de áreas degradadas.</u>			R\$3.500.000,00/4 R\$875.000,00 por parcela
	Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Para a caracterização socioambiental deverão ser coletados dados geoespaciais de pontos relevantes, como os limites individualizados dos imóveis, as Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal; as áreas habitadas, com especificação das formas de utilização da terra nestas áreas, as quais serão utilizadas para a confecção de mapas temáticos e como subsídio para o planejamento, indicando eventuais incompatibilidades entre os objetivos e zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental (APA).			
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00			

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que o levantamento de dados primários visando o fortalecimento dos corredores ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA, para possibilitar a recepção dos dados primários que serão produzidos.

ITEM 7

JUSTIFICATIVAS:

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 07 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação envolvendo um Time de desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com enfoque na região de referência. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$1.560,00/2 R\$ 780.000,00 por parcela
ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00			
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) proposta do item 7 para o item 11 busca uma melhor execução dos recursos financeiros disponíveis.

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01.

ATUALIZAÇÕES

Considerando os avanços na estabilidade do ambiente da aplicação TerraAmazon, assegurando o bom andamento das atividades do projeto, além do fato de que as novas versões possuem funcionalidades para as quais necessitaríamos de formação técnica específica para utilização, e que tal mudança de versão poderá ocasionar riscos de descontinuidade no monitoramento, concluímos que não há a necessidade de atualização de versão da referida ferramenta. Portanto foi proposto em dezembro de 2024, o remanejamento do saldo de R\$ 780.000,00 para o novo item 30, aprovador pelo CTE e submetido à não objeção dos COMPROMITENTES.

ITEM 10

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação por 24 meses para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos com enfoque na região de referência, com o objetivo de detectar, alertar e publicar de maneira contínua, sistemática e didática, áreas com provável decrémento de vegetação nativa e pontos com redução da qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os agentes de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, de informações de alta precisão.			R\$1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil reais) /2
		OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais a parcela)
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$780.000,00	R\$780.000,00		
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
			R\$780.000,00	R\$780.000,00	

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que o desenvolvimento do Painel de Monitoramentos previsto no item 10, por sua natureza de utilização de dados e informações espaciais, depende do prévio aprimoramento da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG Geobahia) previsto no item 12, entendemos como necessária a prorrogação sugerida, sem prejuízos aos monitoramentos previstos no TCSA, que, cumpre esclarecer, serão realizados pela execução imediata dos itens 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

Diante do exposto, além do remanejamento dos valores inicialmente previstos, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 12, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

Valor CONTRATO: R\$ 1.756.248,43

ITEM 11

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses) para aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos –SEIA, de maneira a tornar mais consistente com posterior publicização as informações sobre os empreendimentos licenciados pelo Estado com enfoque na região de referência.			R\$3.120.000,00/2
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
				R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		

JUSTIFICATIVAS:

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e seis) meses.

Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se apresentou necessário o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal.

VALOR CONTRATADO R\$3.972.853,44

ITEM 12

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das informações específicas da região de referência sobre regras de uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com a respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão ambiental e a tomada de decisão. - A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão permanente de alertas <i>online</i> de supressão de vegetação, aos COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO; - Publicação contínua e sistemática das áreas de decrémento de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas áreas de referência, entre todos os Entes Federativos e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$3.120.000,00/2
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
				R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$1.040.000	R\$1.040.000	R\$1.040.000			

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG Geobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais).

Diante do exposto, além da redistribuição dos valores inicialmente previstos entre as parcelas, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 10, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

VALOR CONTRATADO R\$3.261.604,22

ITEM 14

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 – Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação de todos os seguimentos responsáveis pela fiscalização na região de referência, quais sejam, IBAMA, ICMBIO, INEMA, DPA.			R\$ 1.141.100,00/3 R\$380.366,67 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67			
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 570.550,00	R\$ 570.550,00				

JUSTIFICATIVA:

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos.

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação de veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

ITEM 15

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 15 – Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação dos órgãos ambientais dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré.			R\$ 539.000,00/ 2
					R\$ 269.500,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$269.500,00	R\$269.500,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 539.000,00				

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 2.

ITEM 16

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 16 – Aquisição de bens para estruturação da Polícia Rodoviária Federal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a estruturação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para fiscalização na região de referência, sobretudo tráfico de madeira e de animais. OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, competência da Justiça Federal.			R\$ 500.000,00 / 2 R\$250.000,00 a parcela a ser dividida entre as duas Polícias.
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$250.000,00	R\$250.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$500.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor estimado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITEM 17

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 17 – Apoio estruturante ao Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação do Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus.			R\$1.000.000,00 / 2 R\$ 500.000,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$ 1.000.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITENS 18 e 19

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 18 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.			R\$2.000.000,00
	Item 19 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para construção da Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de serviços e um pequeno receptivo.			R\$350.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3(Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00			
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3(Item 19)	ANO 4 (Item 19)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00					
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADAPELO CTE					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3(Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
R\$2.000.000,00					
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3(Item 19)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00					

JUSTIFICATIVA:

Considerando o avanço das tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para o início da recuperação de áreas degradadas no interior do Parque Estadual da Ponta da Tulha com recursos externos ao TCSA, e com o intuito de obter economia nas contratações de serviços de engenharia para o cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha, as contratações do cercamento e da elaboração dos projetos de engenharia e fiscalização dos contratos de cercamento e execução da obra foram feitas concomitantemente e a execução da obra (item 19) foi realizada posteriormente.

ITENS 22, 23, 25, 26 e 27

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO			
ESPECIFICAÇÕES			
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.	R\$500.000,00
	Item 23 – Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Lagoa Encantada e Rio Almada: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão e elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha, tudo de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.	R\$400.000,00
	Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Conduru.: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.	R\$500.000,00
	ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Elaboração de Estudo visando a elaboração do Plano de Uso Público Parque Estadual Ponta da Tulha, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado	325.000,00
	ITEM 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	Elaboração de Estudo visando a elaboração do Plano de Uso Público do Parque Estadual Serra do Conduru. de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado	325.000,00

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
		R\$500.000,00			
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
		R\$400.000,00			
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
		R\$500.000,00			
ANO 1 (Item 26)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
			R\$325.000,00		
ANO 1 (Item 27)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
			R\$325.000,00		

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
	R\$400.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
	R\$325.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
	R\$325.000,00				

JUSTIFICATIVA:

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo e Planos de Uso Público das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23, 25, 26 e 27), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado. Foi alterada a ação 23 - Implementação do Plano de Manejo da APA Costa de Itacaré-Serra Grande para Revisão do Plano de Manejo da APA Lagoa Encantada e Rio Almada e Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Ponta da Tulha e integrada a contratação dos Itens 26 e 27 para otimizar a utilização do recurso.

ITEM 33

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 6: MEDIDA DEMITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO COMPLEMENTAR FAUNA/FLORA	Item 33 –Contratação de serviço de recomposição de vegetação	Contratação de serviço para executar a recomposição de 100 (cem) hectares de vegetação, relacionado ao plantio compensatório complementar, considerando a supressão de, no máximo, 484 ha (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares de vegetação durante a fase de implantação do empreendimento.			R\$R\$1.403.952,87/ 3 R\$467.984,29a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100ha (cem hectares) por meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos da CLÁUSULA 20ª.
