GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Salvador/Ba
Maio/2022

AGERSA

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Relatório: Fiscalização dos serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Finalidade: Cumprir a determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água do município inspecionado.

Município: Teodoro Sampaio

Prestadora: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA.

Presidente: Rogério Costa Cedraz

Endereço (sede): 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP 41.745-002, Salvador, Bahia, Brasil.

Telefone: (71) 3372-4842 **Home Page**: http//www.embasa.ba.gov.br

Escritório Local: Teodoro Sampaio

Unidade Regional: UNF

Assistente de Saneamento: Marcos Paulo Gomes

E-mail: marcos.pena@embasa.ba.gov.br **Telefone**: 75 3237 2315

Período: 16 a 20 de maio de 2022

Responsáveis pelas Inspeções: Guilherme Dourado e Télkia Rios

Data de Conclusão da inspeção: 16 a 20 de maio de 2022

Revisão do relatório: Télkia Rios

ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

EEAB- Estação Elevatória de Água Bruta

EEAT- Estação Elevatória de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

NR - Normas Regulamentadoras

RAP - Reservatório Apoiado

RCC - Relatório de Cumprimento de Condicionantes

RCE - Roteiro de Caracterização de Empreendimento

REL- Reservatório Elevado

SIAA- Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SES- Sistema de Esgotamento Sanitário

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

AGERSA

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 5
2. OBJETIVOS 6
3. METODOLOGIA 7
3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE 8
3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS 10
4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 12
5. CONTEXTUALIZAÇÃO 13
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 14
6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14
6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 16
7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES 17
7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 18
7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA 199
7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO 201
7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO 202
8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO 203
9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES 209

AGERSA

1. APRESENTAÇÃO

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, autarquia em regime especial criada pela Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS e sujeita ao regime jurídico-administrativo próprio das entidades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, informa que deu início a uma ação de fiscalização de acompanhamento dos serviços públicos de abastecimento de água, bem como de esgotamento sanitário.

Neste sentido, este relatório apresenta os levantamentos e as análises realizadas pela AGERSA com referência aos serviços prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA no município de **Teodoro Sampaio**, no período compreendido entre os dias 16 e 20 de maio de 2022.

Como resultado desses trabalhos, são apontadas determinações à Prestadora, considerando a necessidade de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, especialmente quanto à satisfação de condições como as de regularidade, continuidade, qualidade, eficiência e segurança, à luz das leis, das normas e dos regulamentos aplicáveis.

Ressalta-se que ao longo do relatório, a AGERSA apresenta uma compilação de não conformidades, como instalações físicas, continuidade no fornecimento, manobras, qualidade da água, manutenção e operação do sistema entre outros, sobre as quais a EMBASA deverá se manifestar e corrigir, nos prazos assinalados neste documento.

AGERSA

2. OBJETIVOS

2.1 O **objetivo geral** desta ação foi o de obter um conjunto de evidências físicas, documentais e analíticas das condições técnicas, operacionais e comerciais com que o serviço de saneamento básico, na sua componente de abastecimento de água potável, é prestado no município de **Teodoro Sampaio**, o qual seja apto a dar suporte às conclusões exaradas.

2.2 Como **objetivos específicos**, têm-se verificar: a adequação da oferta à demanda de água; a eficiência das atividades técnico-operacionais; a qualidade da água disponibilizada à população, com atenção às normas de vigilância em vigor; o estado de conservação de instalações e equipamentos, bem como a sua atualidade; o cumprimento das normas de segurança do trabalho; a existência de certificações de qualidade de processos operacionais; a regularidade dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das suas condicionantes; a atenção aos usuários, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos para o atendimento; a existência de monitoramento de disponibilidade hídrica e de planos de manutenção e de expansão dos sistemas; a quantificação das perdas reais e aparentes, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução; a eficácia do controle pitométrico; a eficiência na resposta às interrupções dos sistemas.

AGERSA

3. METODOLOGIA

Neste processo de fiscalização, foram cumpridas as seguintes etapas:

a) Solicitação prévia de informações técnicas e operacionais à Prestadora dos serviços objetos de estudo;

b) Formalização de processo administrativo;

c) Inspeções in loco, levantamentos em campo, coleta de informações em nível local e registro fotográfico;

d) Processamento e análise das informações levantadas em campo e obtidas diretamente da Prestadora;

e) Elaboração de relatório;

f) Notificação da Prestadora*.

**A etapa 'f' é cumprida após a conclusão do presente relatório.*

AGERSA

3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE

São objetos de verificação os seguintes itens e segmentos de análise (listas não exaustivas):

3.1.1 Nos Sistemas de Abastecimento de Água:

I Técnico-Operacional:

- Manancial/Captação:
  - *Preservação e proteção;*
  - *Operação e manutenção;*
- ETA:
  - *Segurança, conservação E limpeza;*
  - *Filtração;*
  - *Casa de química;*
  - *Laboratório;*
- Adução:
  - *Operação, manutenção E controle de perdas;*
- Reservatórios:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e desinfecção;*
  - *Controle de perdas;*
- Estações Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- Rede de Distribuição:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Continuidade;*
  - *Pressões disponíveis na rede;*

II Gerencial:

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de universalização;*
  - *Plano de expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

III Qualidade e Controle:

- Qualidade da Água Distribuída à População:
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na saída da ETA;*
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na rede de distribuição;*

IV Comercial:

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

3.1.2 Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário:

I Técnico-Operacional:

- Rede Coletora:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Emissário Submarino:
  - *Operação e manutenção (captação, processamento, ociosidade, exclusive a parte marítima);*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- ETE:
  - *Segurança, operação e manutenção;*
  - *Corpo receptor;*
  - *Saúde ocupacional dos operadores;*

II Gerencial:

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de cobertura e atendimento;*
  - *Plano de implantação/expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

III Qualidade e Controle:

- Controle da qualidade do esgoto tratado:
  - *Monitoramento sistema de tratamento de esgotos;*
  - *Laudos gerados pelo monitoramento da EMBASA;*

IV Comercial:

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

AGERSA

3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Descrição	*Status*
I. Informações gerais sobre os sistemas, tais como: nome, localidades atendidas, índice de atendimento, número de ligações e economias, vazões do sistema, índices de perdas, relatórios de interrupções, etc.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
II. Informações sobre produtos químicos utilizados.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
III. Certificados de Qualidade.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
IV. Relatórios mensais detalhados de calibração de equipamentos.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
V. Descritivos de projetos de ampliação ou de melhoria de sistemas.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
VI. Relatórios detalhados de higienização das redes e reservatórios.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
VII. Regularidade jurídica ambiental, contemplando os licenciamentos, o roteiro de caracterização do empreendimento e o relatório de cumprimento de condicionantes para obtenção da última licença.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
VIII. Relatório de ocorrências operacionais e comerciais, contendo todas as tipologias de serviços cadastradas na Prestadora.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
IX. Plano de segurança das instalações.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
X. Relatório de disponibilidade hídrica de mananciais.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
XI. Relatório com a quantificação das perdas reais e aparentes, desde a sua captação, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução. Relatórios de quantificação das reduções já obtidas.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
XII. Relatório de monitoramento da eficiência do tratamento de esgoto e da situação do corpo receptor. OBS.: O município não possui esgotamento sanitário.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☑ Outros
XIII. Relatório das análises de qualidade da água bruta e tratada. Plano de Amostragem, definido no capítulo VI da Portaria de Consolidação N° 5/2017 do Ministério da Saúde.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
XIV. Catálogo dos Sistemas (conforme já produzido pela Prestadora)	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
XV. Plano de Emergência e Contingência.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros

De acordo com o quadro acima, observa-se a ausência de alguns itens. A Prestadora deve apresentar os dados e os documentos apontados, ou mesmo as justificativas para a sua falta ou inexistência, alimentando o SITO no prazo de **até 10 (dez) dias a partir do recebimento deste relatório.**

4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

O quadro abaixo expõe as informações fornecidas pela Prestadora sobre a situação contratual da prestação dos serviços de água e esgoto:

Quadro 1: Situação da contratação dos serviços para o município de Teodoro Sampaio.

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tipo de contratação	**Data de assinatura do Contrato**	**Situação do contrato**
Contrato de Programa	28/05/2019	**VIGENTE**

Fonte: EMBASA, 2022.

Com o propósito de atender ao disposto do art. 11 da Lei Federal nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, em especial o disposto no art. 11-B § 1° de referida lei, que trata da obrigatoriedade de incorporação de metas de universalização aos contratos em vigor, **foi celebrado em 10 de setembro de 2021 o Termo Aditivo ao Contrato de Programa**, com a revisão do plano de metas e do plano de investimentos, aprovados pelo município.

As tabelas apresentadas a seguir trazem as projeções dos investimentos necessários para a expansão dos serviços de água e esgotamento sanitário durante o período do contrato.

Quadro 01 - Previsão de Investimentos no município para o sistema de abastecimento de água.

ANO	Abastecimento de Água					
	Estruturantes	Reposição	Crescimento Vegetativo	Capital de Giro	Combate à Perdas	Desenvol. Inst
2021	0,00	12.469,35	0,00	83.127,79	4.186,05	2.273,62
2022	0,00	12.855,37	0,00	1.031,19	15.665,42	2.344,01
2023	0,00	13.171,86	0,00	2.734,56	27.144,79	2.401,72
2024	473,59	13.691,99	0,00	2.872,61	31.330,84	2.496,56
2025	3.895,95	14.284,37	0,00	1.802,38	28.899,74	2.606,13
2026	7.570,49	14.829,44	0,00	102,65	16.744,20	2.718,32
2027	11.497,48	15.151,32	0,00	165,19	16.744,20	2.801,67
2028	15.649,87	15.468,92	0,00	230,77	16.744,20	2.896,71
2029	19.994,28	15.790,77	0,00	301,89	16.744,20	3.003,92
2030	24.461,81	16.170,14	0,00	365,87	285.575,91	3.123,73
2031	3.863,49	21.467,03	0,00	68,90	419.991,77	4.141,80
2032	0,00	29.270,87	0,00	-194,56	16.744,20	5.535,17
2033	0,00	29.877,84	0,00	-294,03	16.744,20	5.590,35
2034	0,00	30.552,48	0,00	-205,83	16.744,20	5.644,53
2035	0,00	31.296,52	4,69	-3,17	16.744,20	5.697,89
2036	0,00	31.656,82	1.586,04	70,13	16.744,20	5.750,62
2037	0,00	31.963,85	3.162,36	143,17	16.744,20	5.806,61
2038	0,00	32.287,03	4.737,25	216,13	16.744,20	5.865,54
2039	0,00	32.626,04	6.316,15	289,26	16.744,20	5.927,35
2040	0,00	32.980,61	7.892,54	362,25	16.744,20	5.992,00
2041	0,00	33.350,37	9.446,47	434,20	16.744,20	6.059,42
2042	0,00	33.734,55	10.968,61	504,66	16.744,20	6.129,47
2043	0,00	34.132,22	12.474,69	574,37	16.744,20	6.201,98
2044	0,00	34.542,71	13.984,98	644,26	16.744,20	6.276,83
2045	0,00	34.965,69	15.492,98	714,04	16.744,20	6.353,95
2046	0,00	35.400,72	16.982,72	782,96	16.744,20	6.433,28
2047	0,00	35.847,04	18.452,35	850,95	16.744,20	6.514,66
2048	0,00	36.303,85	19.909,02	918,33	16.744,20	6.597,95
2049	0,00	36.770,47	21.360,51	985,46	16.744,20	6.683,03
TOTAL	87.406,95	762.910,21	162.771,36	99.596,39	1.181.166,87	139.868,80

Fonte: Embasa - Anexo IX do Termo Aditivo ao Contrato de Programa, 2021

Quadro 02 - Previsão de Investimentos na sede do município para o sistema de esgotamento sanitário.

ANO	Esgotamento Sanitário					
	Estruturantes	Reposição	Crescimento Vegetativo	Capital de Giro	Combate à Perdas	Desenvol. Inst
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830.553,67	0,00	0,00	5.929,56	0,00	1.368,03
2029	2.102.643,80	0,00	0,00	9.686,58	0,00	4.807,95
2030	2.692.353,80	24,71	0,00	11.758,14	0,00	9.159,95
2031	2.705.385,68	111,53	0,00	10.978,18	0,00	13.457,45
2032	2.709.436,20	276,89	0,00	12.345,59	0,00	17.685,15
2033	2.359.854,34	15.520,71	0,00	7.488,51	0,00	21.285,05
2034	1.516.633,96	53.806,15	0,00	4.336,17	0,00	23.491,15
2035	0,00	102.775,99	196.015,55	4.463,61	0,00	23.557,19
2036	0,00	155.508,90	113.932,17	51,00	0,00	23.565,03
2037	0,00	206.761,01	3.923,03	104,13	0,00	23.467,07
2038	0,00	249.621,56	5.876,74	157,19	0,00	23.435,52
2039	0,00	277.181,72	7.835,43	210,37	0,00	23.443,93
2040	0,00	277.273,95	9.791,02	263,46	0,00	23.446,21
2041	0,00	277.298,89	11.718,73	315,78	0,00	23.442,12
2042	0,00	277.254,01	13.607,00	367,02	0,00	23.431,41
2043	0,00	277.136,56	15.475,36	417,72	0,00	23.413,86
2044	0,00	276.944,14	17.348,93	468,55	0,00	23.389,29
2045	0,00	276.674,76	19.219,66	519,30	0,00	23.357,51
2046	0,00	276.326,30	21.067,74	569,43	0,00	23.318,29
2047	0,00	275.896,25	22.890,88	618,87	0,00	23.271,40
2048	0,00	275.382,06	24.697,93	667,88	0,00	23.216,62
2049	0,00	274.781,33	26.498,57	716,70	0,00	419.010,18
TOTAL	14.916.861,46	3.826.557,40	509.898,75	72.433,74	0,00	

Fonte: Embasa - Anexo IX do Termo Aditivo ao Contrato de Programa, 2021

A Prestadora, no anexo X do aditivo, declara ser o seu principal objetivo ao longo do contrato, a universalização dos serviços e atendimento pleno das metas, o que condiciona à prévia efetivação de políticas públicas e ações inerentes ao Poder Executivo Municipal, que se declara cônscio do seu papel ao assinar o contrato.

A seguir, as metas a serem executadas para o município de Teodoro Sampaio.

3. METAS

	Anos	IAA	IAE	IPD	IPL	QTA	QTE	CSA
1	2021	99,37%	0,00%	26,76%	92,49	95,00%	0,00%	70,00%
2	2022	99,37%	0,00%	26,71%	92,24	95,00%	0,00%	71,67%
3	2023	99,37%	0,00%	26,66%	91,99	95,00%	0,00%	73,33%
4	2024	99,37%	0,00%	26,57%	91,58	95,00%	0,00%	75,00%
5	2025	99,37%	0,00%	26,48%	91,16	95,00%	0,00%	76,67%
6	2026	99,37%	0,00%	26,44%	91,00	95,00%	0,00%	78,33%
7	2027	99,37%	0,00%	26,35%	90,58	95,00%	0,00%	80,00%
8	2028	99,37%	15,00%	26,21%	89,91	95,00%	81,67%	81,67%
9	2029	99,37%	35,00%	25,99%	88,91	95,00%	83,33%	83,33%
10	2030	99,37%	55,00%	25,76%	87,83	95,00%	85,00%	85,00%
11	2031	99,37%	70,00%	25,63%	87,25	95,00%	86,67%	86,67%
12	2032	99,37%	85,00%	25,45%	86,42	95,00%	88,33%	88,33%
13	2033	99,00%	90,00%	25,27%	85,58	95,00%	90,00%	90,00%
14	2034	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	90,41%
15	2035	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	90,82%
16	2036	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	91,24%
17	2037	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	91,65%
18	2038	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	92,06%
19	2039	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	92,47%
20	2040	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	92,88%
21	2041	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	93,29%
22	2042	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	93,71%
23	2043	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	94,12%
24	2044	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	94,53%
25	2045	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	94,94%
26	2046	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	95,35%
27	2047	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	95,76%
28	2048	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	96,18%
29	2049	99,00%	90,00%	25,00%	84,34	95,00%	90,00%	96,59%

Fonte: Embasa - Anexo X do Termo Aditivo ao Contrato de Programa, 2021

Legenda:

IAA: índice de atendimento urbano de água

IAE: índice de atendimento urbano de esgoto

IPD: índice de perdas na distribuição

IPL: índice de perda por ligação

QTA: qualidade da água tratada

QTE: qualidade do esgoto tratado

CSA: continuidade do serviço de abastecimento

Também foi pactuado no contrato uma série de ações explicitadas como parte do escopo de investimentos complementares a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, de modo a assegurar o êxito no alcance das metas e na entrega do melhor serviço à sociedade, a saber:

1) ações ambientais visando à melhoria de balneabilidade das praias, inclusive campanhas educativas e de conscientização da população e limpeza e manutenção de córregos;

2) ações ambientais voltadas à coleta seletiva, à reciclagem e à destinação adequada de resíduos sólidos, inclusive campanhas educativas e de conscientização da população;

3) serviços de coleta, transporte, manejo, tratamento e despejo adequados de resíduos sólidos, inclusive resíduos recicláveis e resíduos sólidos provenientes da rede hospitalar;

4) obras de infraestrutura nos prédios municipais com vistas à redução das perdas de água e implantação de ações voltadas ao uso racional da água;

5) campanhas de conscientização e de educação em prol da redução do desperdício e do uso racional da água junto à população em geral e aos servidores públicos municipais;

6) provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares em áreas de mananciais ou estratégicas par implantação de infraestrutura de saneamento básico;

7) intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda;

8) manter programa de teste de corante em conjunto com a EMBASA para detecção de interferências, ligações clandestinas e imóveis sem conexão à rede de coleta de esgoto;

9) manter equipes de fiscalização para autuação/multa a clientes não conectados à rede coletora e/ou com interferências e acionamento do Ministério Público e órgãos ambientais quando necessário.

A íntegra do contrato está disponível no site da AGERSA na rede mundial, www.agersa.ba.gov.br.

O município dispõe de uma Política Municipal de Saneamento Básico e de Plano Municipal de Saneamento Básico.

5. CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta ação de fiscalização ocorreu em atendimento à determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA em cumprimento ao cronograma de fiscalizações ordinárias, para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água do município de Teodoro Sampaio.

AGERSA

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Sede de Teodoro Sampaio conta com cinco captações subterrâneas, a saber: Poços CSB 01, 02, 03, 04, 05. No momento da fiscalização, o poço CSB 01 estava parado para manutenção da bomba.

Após a captação, a água dos poços é direcionada para a ETA, onde ao chegar recebem tratamento químico de simples desinfecção com aplicação de cloro. Também como parte do processo é adicionado ácido fluossilícico (flúor) na água.

Finalizando o tratamento a água é bombeada para o reservatório elevado REL 300m³ que fica localizado no terreno da Loja de atendimento da Prestadora. Chegando no reservatório elevado a água é disponibilizada por gravidade para a parte da cidade que possui cota abaixo do nível de trabalho do reservatório; o bairro Pau Brasil que possui cota superior ao reservatório é abastecido por intermédio de um boster.

Os distritos de Lustosa e Buracica possuem sistemas próprios de abastecimento. No SAA de Lustosa a água é proveniente da captação superficial instalada sobre o leito do Rio Camarujipe, após a captação a água bruta é direcionada para a ETA. Chegando na ETA a água passa pelo tratamento físico por intermédio do filtro-russo e tratamento químico com adição de cloro.

O abastecimento de Buracica é de responsabilidade do EL de Aramari, administrado pela Unidade Regional de Alagoinhas, sendo apenas a coleta de amostras para a análise realizada pela equipe de Teodoro Sampaio.

AGERSA

Quadro 1: Informações operacionais de Teodoro Sampaio.

SEGMENTO	QUANTIDADE
População do município (IBGE 2020)	7.359
População abastecida	5.874
Índice de Atendimento	79,82
Índice de água não contabilizada (ANC)	17,9
Índice de Perdas na distribuição (IPD)	17,9
Índices atual de micromedição	93,45
Vazão média efetiva do sistema (ETA)	57,6
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	19
Volume médio anual distribuído no município (m^3)	323.970
Volume anual total micromedido no município (m^3)	220.880
Número de pontos de pitometria	01

AGERSA

6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Durante inspeção realizada na sede do município de Teodoro Sampaio foi relatado pela prestadora a inexistência de sistema de esgotamento sanitário operado pela Embasa.

Quadro 1: Informações operacionais de Teodoro Sampaio.

MUNICÍPIO	Teodoro Sampaio
Com coleta sem tratamento	38,83
Sem coleta e sem tratamento	61,17

Fonte: IBGE, 2010.

Ressalta-se que a Lei Federal 11.445/2007 estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico pelo titular, que deve contemplar o diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como, as projeções para a gradual universalização dos serviços no horizonte de 20 anos.

AGERSA

7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

Deve a Prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos a seguir, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

As conformações devem atender às normas de regência (inclusive as técnicas e regulamentares), aos dimensionamentos e às especificações de projeto, assim como às disposições contratualmente definidas com o (s) titular (es) dos serviços.

Para as não conformidades adiante apresentadas e descritas, fica a Prestadora obrigada a corrigi-las de imediato, sempre que as ações não dependam de procedimentos especiais de contratação e/ou de execução como, por exemplo, necessidade de licitação.

No caso em que não se aplique a solução imediata, ficará a Prestadora incumbida de alimentar o sistema de monitoramento de não conformidades online, obedecendo a cada prazo determinado que será contado a partir do recebimento deste documento, incluindo registro probatório documental e fotográfico correspondente.

AGERSA

7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	EL	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Atendimento	EL	15- Destinação inadequada de resíduos.	30





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	26- Ausência de meio de comunicação.	30

Observações:
Internet

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	72- Ausência da tabela de preços e prazos dos serviços exposta para consulta.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Atendimento	**EL**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	60


Especificar:
Organização, Armazenagem, Identificação





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

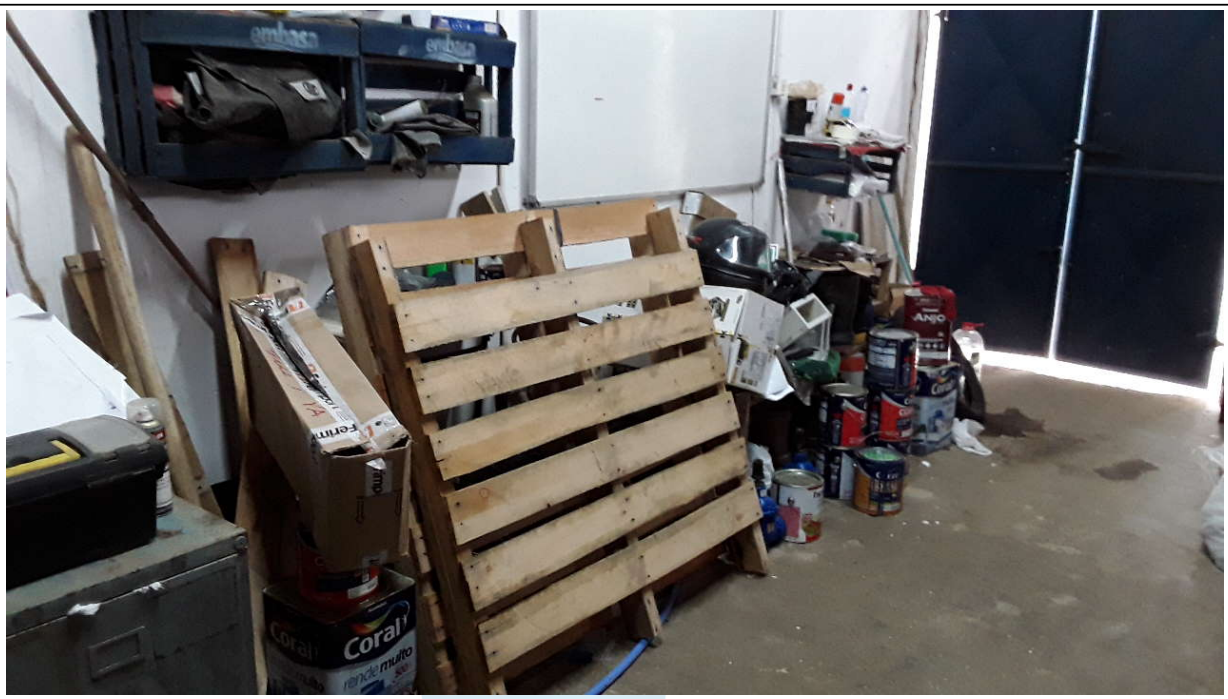



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	2- Falha no isolamento da área.	120



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 03**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60

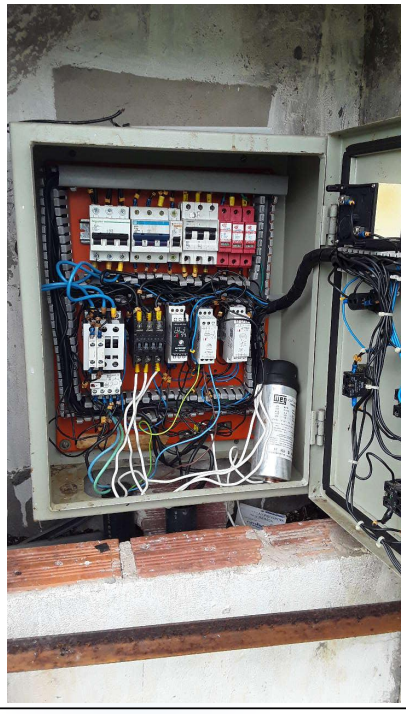

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	41- Ausência de horímetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 06**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 06**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60

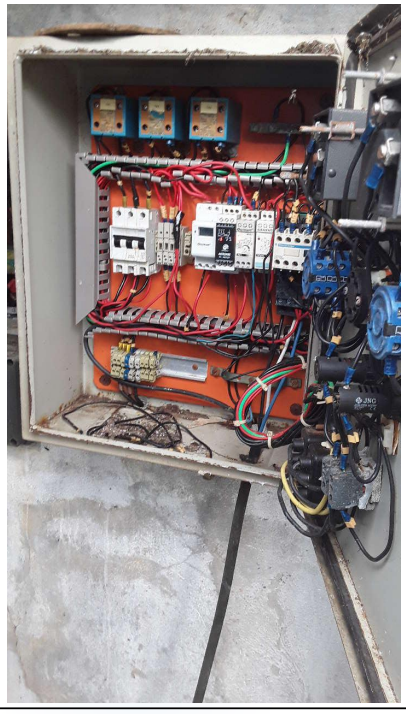

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	41- Ausência de horímetro em funcionamento.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 06**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 04**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	2- Falha no isolamento da área.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 04**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

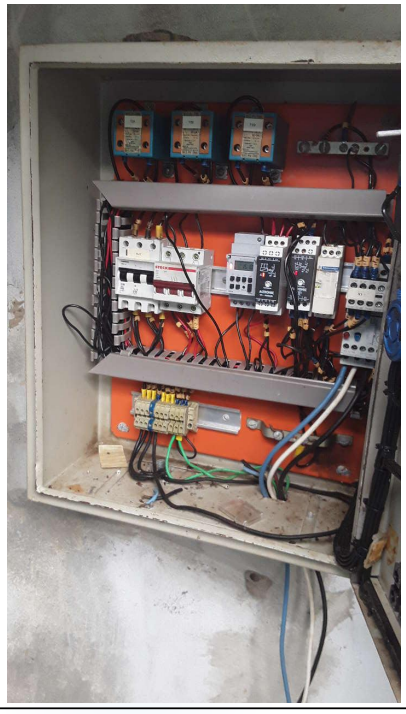

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	9- Indícios ou presença de animais na área.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	39- Poço lacrado inadequadamente	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 04**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

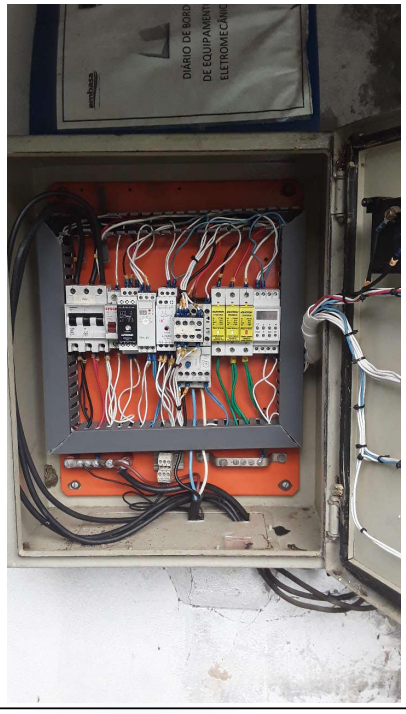

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	9- Indícios ou presença de animais na área.	60

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Rio Camurujipe**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	2- Falha no isolamento da área.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	Rio Camurujipe	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60







AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação, Acesso

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Rio Camurujipe**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	26- Ausência de meio de comunicação.	60
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Deteriorada

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	29- Ausência de macromedidor disponível e/ou em funcionamento.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	60
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	36- Nível de captação inadequada.	360

Especificar:
Abaixo da média

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	38- Presença de atividades potencialmente poluidoras próximas.	360

Especificar:
Agricultura, Pecuária

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Rio Camurujipe	44- Ausência de bomba reserva.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Povoado de Buracica	2- Falha no isolamento da área.	60



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	3- Instalações físicas inadequadas.	60

Observações:
Instalações física e caixas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS







AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	39- Poço lacrado inadequadamente	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm).	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Povoado de Buracica**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60

Observações:
Turbidimetro

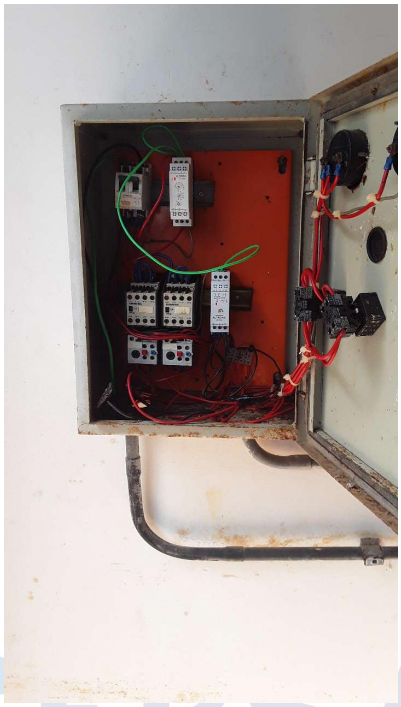

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	30

Especificar:
Organização, Empilhamento



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	12- Presença do acondicionamento de outros materiais.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	14- Caixas de passagem inadequadas.	60

Especificar:
Tampa





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	77- Condições de preparo de produtos químicos inadequadas.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	78- Agitadores indisponíveis e/ou sem funcionamento.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Casa de Química**	79- Ausência de sistema dosador reserva.	30

Especificar:
Cloro, Ácido fluossilícico



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	82- Ausência de sistema de contenção contra vazamento de produtos químicos.	60




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Química**	84- Produtos químicos fora do prazo de validade.	Imediato

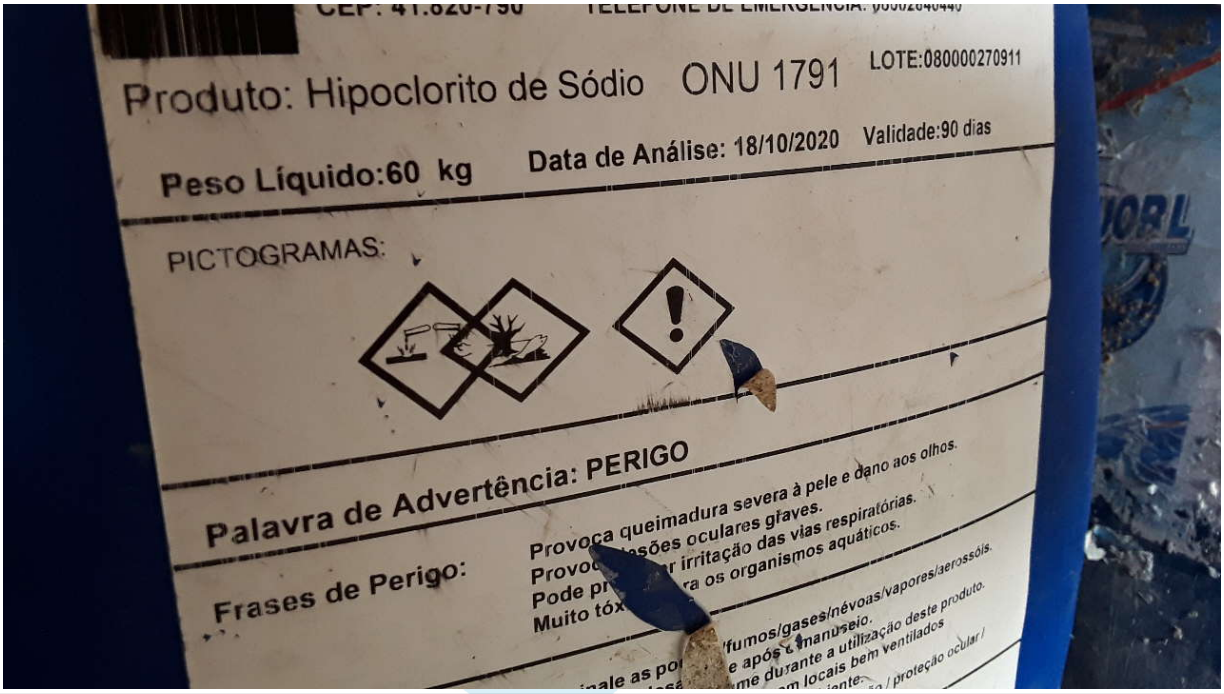

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratório**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratório**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Laboratório**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratório**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Laboratório**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Laboratório**	87- Certificado de calibração dos equipamentos indisponível.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Laboratório**	88- Equipamento de analise laboratorial em mau estado de conservação e/ou sem funcionamento.	30

Especificar:
Turbidímetro



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	3- Instalações físicas inadequadas.	60








Deus é Fiel

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	9- Indícios ou presença de animais na área.	30


Observações:
Presença de passaros no telhado



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA Lustosa**	85- Reagentes fora do prazo de validade e/ou indisponíveis na bancada de trabalho.	Imediato

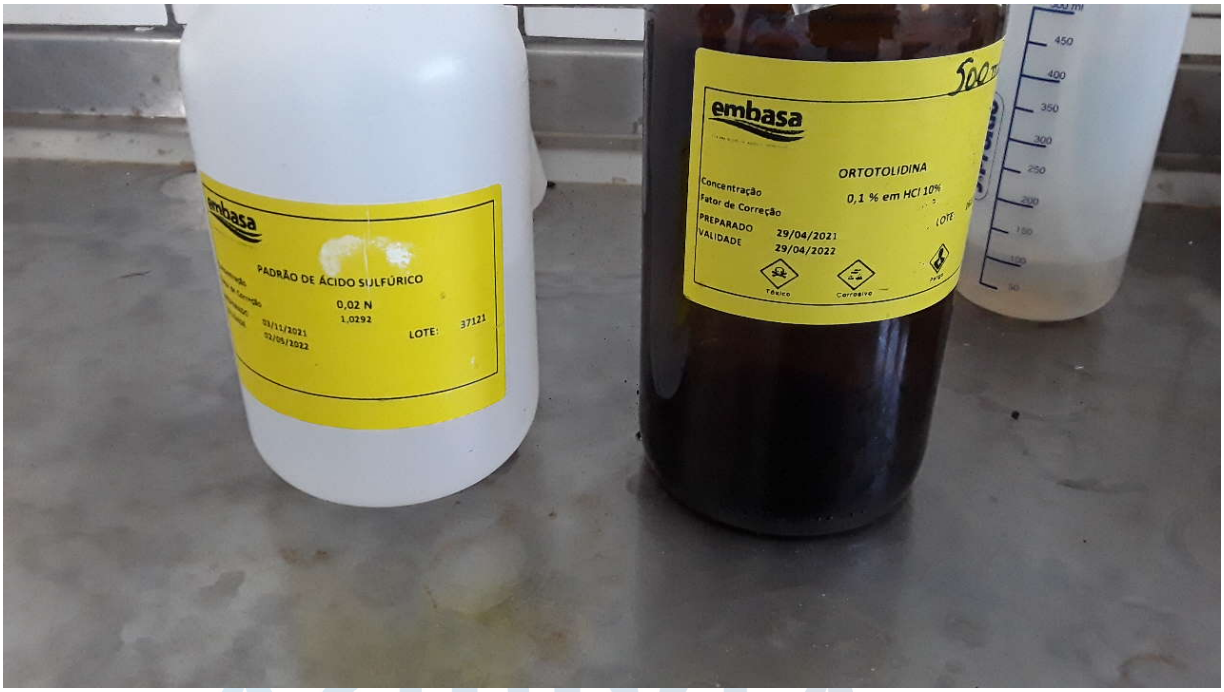

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Lustosa**	87- Certificado de calibração dos equipamentos indisponível.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	12- Presença do acondicionamento de outros materiais.	30







AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60

Especificar:
Carga



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	28- Encaminhamento de linha desprotegido.	60





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento.	120

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	77- Condições de preparo de produtos químicos inadequadas.	60

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	78- Agitadores indisponíveis e/ou sem funcionamento.	60

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	79- Ausência de sistema dosador reserva.	60

Especificar:
Ácido fluossilícico, Sulfato de alumínio

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	82- Ausência de sistema de contenção contra vazamento de produtos químicos.	120




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	84- Produtos químicos fora do prazo de validade.	Imediato



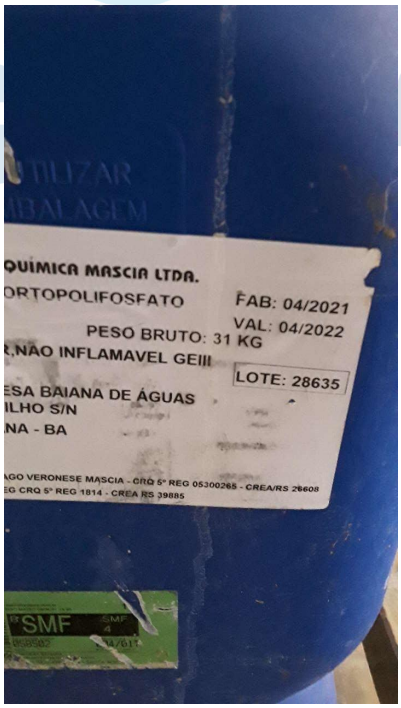

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	9- Indícios ou presença de animais na área.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Guarda-copo



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	29- Ausência de macromedidor disponível e/ou em funcionamento.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Lavagem de Filtro**	44- Ausência de bomba reserva.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	2- Falha no isolamento da área.	120





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	14- Caixas de passagem inadequadas.	60

Especificar:
Tampa, Estrutura, Drenagem, Limpeza

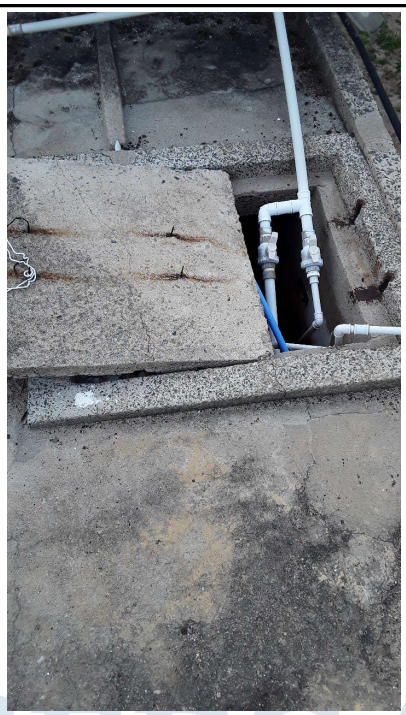



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	15- Destinação inadequada de resíduos.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	16- Destinação Inadequada de resíduos (Lodo).	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	60





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	22- Limpeza irregular no tanque de contato.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	23- Ausência de limpeza regular nos tanques de processo.	120

Observações:
Tanque de reaproveitamento, Floculador, Calha parshall

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	24- Reservatório de lavagem de filtros com ausência de capacidade mínima para limpeza de dois filtros.	360
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Deteriorada



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	28- Encaminhamento de linha desprotegido.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	56- Ausência de guarda-corpo nos tanques de processo instalado e em boas condições.	60



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	ETA	77- Condições de preparo de produtos químicos inadequadas.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	ETA	78- Agitadores indisponíveis e/ou sem funcionamento.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	ETA	93- Eta se encontra instalada dentro da área urbana.	360
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	ETA	105- Ausência de cortina de distribuição de água uniforme na entrada do decantador.	60



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA**	108- Comandos dos filtros não estão situados em área que permita o controle completo da operação.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETA**	115- Capacidade de armazenamento de lodo insuficiente para 60 dias.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	7- Condições de trabalho inadequadas.	30

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	12- Presença do acondicionamento de outros materiais.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60
Especificar: Disponibilizados			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	77- Condições de preparo de produtos químicos inadequadas.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	78- Agitadores indisponíveis e/ou sem funcionamento.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Povoado Buracica**	79- Ausência de sistema dosador reserva.	30
Especificar: Cloro			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Povoado Buracica**	82- Ausência de sistema de contenção contra vazamento de produtos químicos.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	3- Instalações físicas inadequadas.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**REL 300m3**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	120




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

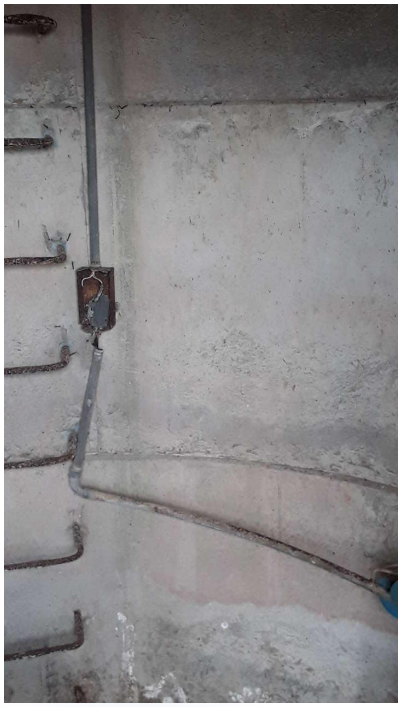



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Inadequada, Deteriorada



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências.	120



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	33- Extravasor inadequado.	120



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento.	60
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	60
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	61- Ausência de ventosa instalada após a válvula de fechamento do reservatório.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	63- Ausência de descarga de fundo disponível e operante.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	66- Dispositivo limitador de nível máximo sem funcionamento.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	67- Ausência de higienização periódica.	120
Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	REL 300m3	68- Para-raio inoperante.	30

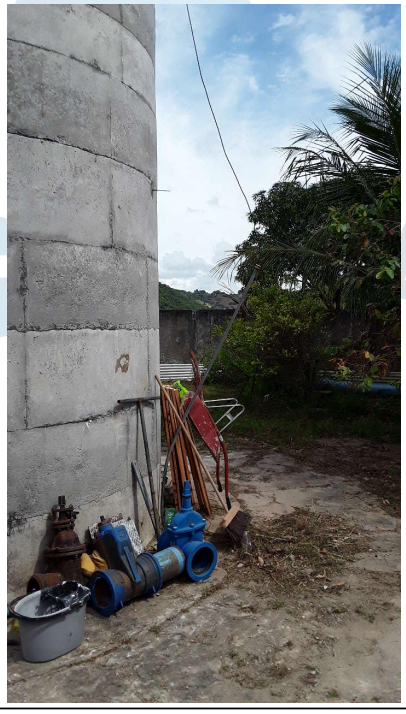

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 300m3**	69- Ausência de sinalização aeronáutica..	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



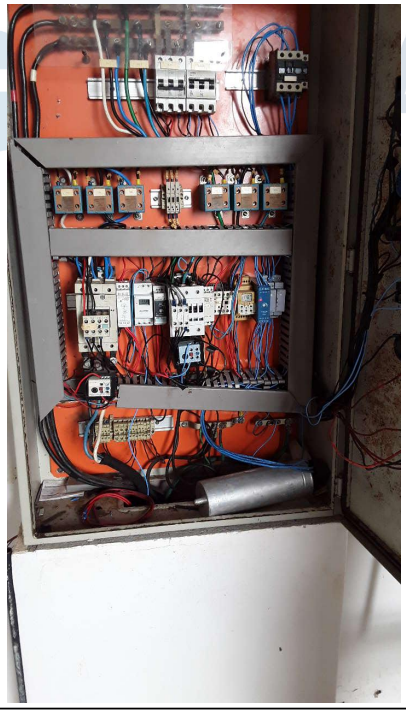

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Outros, Organização





Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 02**	41- Ausência de horímetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	3- Instalações físicas inadequadas.	60

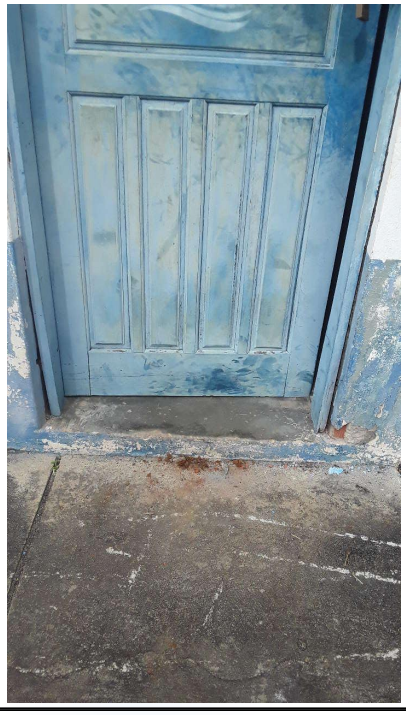



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Outros

Observações:
Guarda corpo



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	29- Ausência de macromedidor disponível e/ou em funcionamento.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de Bombas 01**	44- Ausência de bomba reserva.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	7- Condições de trabalho inadequadas.	30
Especificar: Iluminação			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Ausente

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento.	120

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	120

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	38- Presença de atividades potencialmente poluidoras próximas.	360

Especificar:
Resíduos domésticos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	120



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD**	59- Ventilação inadequada e sem proteção.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD**	66- Dispositivo limitador de nível máximo sem funcionamento.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD**	67- Ausência de higienização periódica.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Riscos Específicos, Restrição do Acesso, Identificação



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	7- Condições de trabalho inadequadas.	120

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Deteriorada, Inadequada

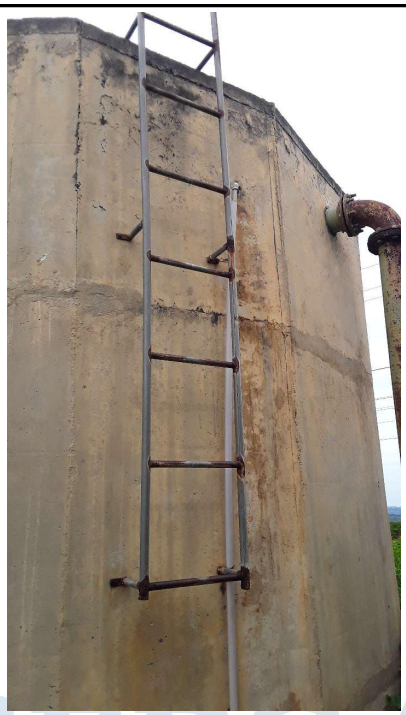

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	38- Presença de atividades potencialmente poluidoras próximas.	120

Especificar:
Resíduos domésticos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	120



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAD Pau Brasil**	67- Ausência de higienização periódica.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	3- Instalações físicas inadequadas.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	7- Condições de trabalho inadequadas.	60

Especificar:
Iluminação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	60

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Booster Pau Brasil**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Poço 01**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	7- Condições de trabalho inadequadas.	30

Especificar:
Iluminação

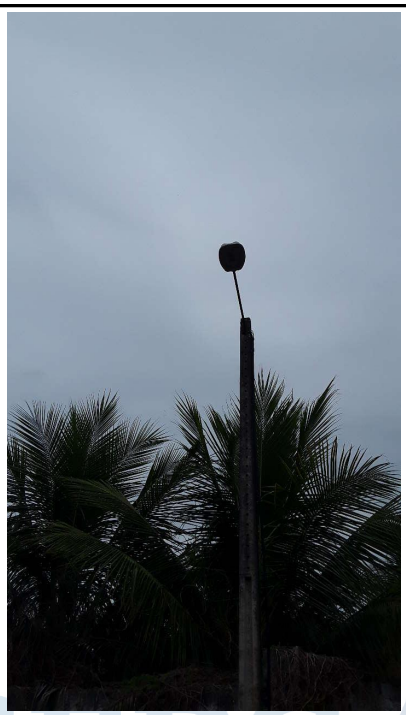

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**Poço 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	39- Poço lacrado inadequadamente	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm).	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poço 01**	44- Ausência de bomba reserva.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	2- Falha no isolamento da área.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	3- Instalações físicas inadequadas.	120



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60







AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	7- Condições de trabalho inadequadas.	120
Especificar: Acesso, Iluminação			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	13- Ausência do registro de ocorrência em livro.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	120

Especificar:
Outros

Observações:
Disponibilidade

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	33- Extravasor inadequado.	120



Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	38- Presença de atividades potencialmente poluidoras próximas.	360

Especificar:
Agricultura, Pecuária

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	120



Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP**	59- Ventilação inadequada e sem proteção.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	66- Dispositivo limitador de nível máximo sem funcionamento.	120
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**RAP**	67- Ausência de higienização periódica.	60

AGERSA

7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA

Análise ETA – Teodoro Sampaio

Através dos dados enviados pela prestadora, referentes ao período entre março de 2021 e abril de 2022, foi possível realizar as seguintes análises.

As análises do bacteriológico mostraram ausência dos parâmetros em todo o período analisado, atendendo às determinações da legislação vigente.

O plano de amostragem referente a amostras para análise bacteriológica corresponde ao determinado pela Portaria nº 888/2021.

Para cloro residual livre também não houve amostras com valores abaixo do limite mínimo e acima do limite máximo estabelecido, estando em conformidade com a legislação.

Sobre o plano de amostragem, segundo a Portaria no anexo 14, na saída do tratamento, para esse parâmetro, deve-se coletar 10 amostras a cada 1 semana. Na planilha enviada em PDF pela prestadora, não houve atendimento dessa determinação.

Para o parâmetro Cor também não houve amostras com valores acima do limite estabelecido, estando assim em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 08/2021.

Para o parâmetro Turbidez, todas as amostras estiveram cumprindo as especificações determinadas pela Portaria 888/2021, estando assim em conformidade

O plano de amostragem para o parâmetro turbidez, segundo a portaria supracitada, no anexo 14, na saída do tratamento para esse parâmetro, deve-se coletar 10 amostra a cada 1 semana. Na análise realizada constatou-se que não houve cumprimento ao número mínimo determinado de amostras.

Rede de distribuição Teodoro Sampaio

Para a análise bacteriológica, foi verificado que nos meses de março a dezembro de 2021, janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 o plano de amostragem atendeu as especificações da Portaria nº 888/2021. No mês de abril de 2022 foi indicado presença, não havendo o cumprimento dessas especificações.

Em todos os meses para coliformes totais, a portaria em seu Anexo 1, determina que pode haver apenas uma amostra com resultado positivo entre todas as analisadas no mês, para sistemas que abastecem menos de 20.000 habitantes. Baseado nas amostras, essa determinação não foi atendida, no mês de abril constatou-se presença, estando assim em não conformidade.

Para a E. Coli a determinação em sistemas de distribuição (rede ou reservatório), deve constar ausência em 100 ml; em todos os meses constatou-se ausência, como especificado pela legislação.

Para o parâmetro cloro residual livre, o plano de amostragem da prestadora atendeu ao estabelecido pela legislação nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro, fevereiro e março de 2022. Nos meses setembro de 2021 e abril de 2022 o plano de amostragem não atendeu às especificações da Portaria nº 888/2021, estando abaixo do valor permitido.

Analisando o padrão de potabilidade tendo como base a Portaria nº 888/2021, em todos os meses os valores não ultrapassaram o máximo permitido e não ficaram abaixo do limite mínimo, estando assim em conformidade.

O plano de amostragem para o parâmetro cor, corresponde ao estabelecido em todos os meses analisados, estando assim em conformidade com a legislação. Na análise do padrão de potabilidade, foi verificado que em todos os meses os valores não ultrapassaram o valor máximo permitido, estando assim em conformidade.

Ao analisar o parâmetro turbidez verificou-se o cumprimento do plano de amostragem, atendendo as especificações da Portaria nº 888/2021.

A seguir estão apresentados os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas durante a fiscalização *in loco*.

Resultados de análise físico-química e bacteriológica

Identificação	Ponto de Coleta	Data	Hora	Pressão (mca)	Cor Aparente (uH)	Turbidez (uT)	PH	Fluoreto (mb/l)	Cloro Residual (mg/l)	Bacteriológico
TDS011	Rua Castelo Branco	16/5/2022	15:28	48	20	-	6,8	0,6	5	Ausente
TDS002	Rua da Matriz	16/5/2022	15:48	38	2,5	-	6,8	0,69	5	Ausente
Água Bruta	ETA	17/5/2022	14:10	0	150	6,77	6,14	-	-	Ausente
Água Tratada	ETA	17/5/2022	14:11	0	2,5	0,04	6,23	0,72	3	Ausente
LUS006	Rua do Bambu	17/5/2022	14:37	25	2,5	0,04	-	-	-	Ausente
LUS005	Rua Cecilia Lopes	17/5/2022	14:50	22	2,5	5,68	-	-	0.2	Ausente

LEGENDAS E NOMENCLATURAS

Cor:	ocorre devido a partículas dissolvidas na água.
Turbidez:	ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva.
Cloro:	produto químico utilizado para eliminar bactérias.
pH:	valores para especificar a acidez da água.
Coliformes Totais (C.Totais):	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias.
Escherichia Coli (E.Coli):	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal.

7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO

Durante inspeção realizada na sede do município de Teodoro Sampaio foi relatado pela prestadora a inexistência de sistema de esgotamento sanitário operado pela Embasa

AGERSA

7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO

Durante inspeção realizada na sede do município de Teodoro Sampaio foi relatado pela prestadora a inexistência de sistema de esgotamento sanitário operado pela Embasa

AGERSA

8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO

A equipe de fiscalização AGERSA foi recebida pelo Assistente de Saneamento Marcos Paulo Gomes, uma vez que o gerente local, José Nílson Alves de Lima estava em Terra Nova, município do qual também é gerente.

O sistema conta com escritório local e foi mencionado que o quadro de funcionários atualmente atende às demandas, sendo sete (07) funcionários terceirizados e dois (02) funcionários próprios da prestadora. Também foi informado que o município opera em regime de manobra. Segundo o Marcos Paulo, a principal reclamação do consumidor está atrelada a pedidos de revisão de conta.

Verificando o painel de ocorrências operacionais, que tem informações atualizadas pela Prestadora do período de abril de 2020 a agosto de 2022, o município de Teodoro Sampaio apresentou as seguintes ocorrências, totalizando 70:00 horas de paralização no sistema de abastecimento de água.

Cod IBGE	Município	UR	Data de Início	Data Término	Total de Horas	Motivo
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021	sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021	49,70	12 - FALTA DE ENERGIA
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021	sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021	4,02	12 - FALTA DE ENERGIA
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	domingo, 28 de fevereiro de 2021	domingo, 28 de fevereiro de 2021	6,23	12 - FALTA DE ENERGIA
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	terça-feira, 13 de abril de 2021	terça-feira, 13 de abril de 2021	3,48	12 - FALTA DE ENERGIA
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	terça-feira, 13 de abril de 2021	terça-feira, 13 de abril de 2021	3,82	12 - FALTA DE ENERGIA
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	terça-feira, 7 de dezembro de 2021	terça-feira, 7 de dezembro de 2021	1,08	MANUTENCAO DE REDES DISTRIBUIDORAS
2931400	TEODORO SAMPAIO	FEIRA SANTANA	sexta-feira, 17 de dezembro de 2021	sexta-feira, 17 de dezembro de 2021	1,67	MANUTENCAO DE ADUTORAS E SUB ADUTORAS
Total					**70,00**	

Fonte: Power BI de Ocorrências Operacionais desenvolvido pela AGERSA, alimentado pela Embasa; acesso 25/08/2022.

A localização do EL de Teodoro Sampaio dificulta que haja muita demanda por atendimento presencial, pois localiza-se no alto de uma travessa bastante íngreme, a Travessa Joaquim Nabuco, como se pode ver pelas imagens do Google Maps apresentadas a seguir:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA









Por essa peculiaridade, os usuários preferem buscar a Embasa através do whatsapp corporativo; quando há sepultamento, considerando a proximidade do cemitério à Embasa, muitos usuários aproveitam para ao final do rito, parar no EL e resolver quaisquer pendências.

No momento da fiscalização, o whatsapp não estava funcionando em razão de ter sido retirado o sinal de wi-fi pela própria Embasa; a população desconhece o problema, ficando apenas com a constatação de que "a Embasa nunca responde whatsapp, faz muito tempo que parou de responder", deixando os usuários de Lustosa e os da sede que tenham dificuldade de acessar o EL, sem atendimento para suas demandas.

O contato com o titular do serviço foi realizado através da Secretária de Administração, Luana Gaza, a Coordenadora de meio Ambiente Tamires Rodrigues, o Coordenador de Infra Estrutura Nei Valente e o engenheiro civil Marcos Barros. Em reunião foram pontuadas questões relevantes para os representantes do titular, entre elas as apresentadas a seguir:

- Há no município uma extensa área rural, cujo saneamento é feito pela própria prefeitura, abarcando 4 povoados com um total de aproximadamente 800 famílias, sem nenhum ônus para a população;

- Pau Brasil é o ponto crítico para abastecimento de água, é o único bairro que sofre com problemas de interrupção e descontinuidade;

- o esgotamento sanitário é uma urgência para o município, mas só há previsão de investimento pela Embasa a partir de 2028;

- o município não possui LOAS nem PDDU; não entenderam ainda a lógica das microrregiões de saneamento nem o papel da cada ator e não foram contatados para a capacitação da Fundace para a MRS Portal do Sertão que acontecera recentemente;

- 90% de cobertura de água é de responsabilidade da Embasa; cerca de 60% da população dispõe de reservação dimensionada adequadamente.

- a solução de esgotamento sanitário utilizada é a fossa rudimentar; 80% da população rural possui fossa.

- a principal reclamação da população é quanto a recomposição das vias após manutenção corretiva. O coordenador de Infraestrutura entende que como não há usina de asfalto próxima, a Embasa espera juntar certa quantidade de reparos entre as cidades próximas para só então trazer a máquina para recompor o asfalto, o que acaba demorando bastante e causando transtorno à população.



Em reunião com a Secretária de Saúde, Thaíse de Almeida, foi reportado que a Embasa não acompanha a coleta feita pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal, o que considera ser o ideal.

Não utilizam os mesmos pontos de coleta e os técnicos passaram por treinamento junto ao Núcleo Regional de Saúde. Solicita que a Prestadora procure a Secretaria para alinhamento da coleta, que na rotina do município acontece no penúltimo dia útil de cada mês.

É muito raro encontrarem alteração na qualidade da água, apenas o ponto de coleta de Buracica que costuma dar alteração no pH.

Em Lustosa, a equipe foi acompanhada do representante da Prestadora Felipe Carvalho. A captação do sistema é feita no rio Camarujipe, cuja vazão vem diminuindo drasticamente em razão de barramentos irregulares feitos por fazendeiros.







O que deu um incremento recente à vazão foi a "Fonte Azul", identificada em uma fazenda cujos proprietários autorizaram a ligação até o rio (por valeta, sem tubo e por gravidade; vazão de 4 a 5 l/s depois da ligação). O incremento foi também em termos de qualidade, a água da fonte é quase mineral. Precisa de limpeza periódica no clivo da bomba, a sujidade faz a vazão ser reduzida e foi constatada a necessidade dessa limpeza no momento da fiscalização.

O manancial precisa de alternativa urgente, demonstra estar bastante comprometido; a alternativa pensada pela Prestadora é desativar a ETA de Lustosa e receber água do SIAA Amélia Rodrigues/Jacuípe/Coração de Maria/Terra Nova.

A ETA de Lustosa estava passando por pequenos reparos de manutenção no período da inspeção; no laboratório foram identificados reagentes com prazo de validade vencidos (padrão de ácido sulfúrico, ortotolidina).



A estrutura da ETA sofre com infestação de pardais, as paredes estão sempre sujas de fezes. As caixas de inspeção estão com as tampas bastante deterioradas; as que foram trazidas para substituição estão deixadas na área da ETA há pelo menos 3, 4 meses, sem previsão de colocação, já com sinais de deterioração.











Nas amostras coletadas na rede de distribuição, são avaliados os parâmetros cor, turbidez e cloro; é adicionado clorogás na água bruta na pré e pós cloração, apenas quando há presença de ferro. De rotina, utiliza o dicloro.

O kit ar respirável da ETA está com o próximo teste previsto para agosto de 2022 (descartar).



Há em Lustosa 2 setores de manobra, a parte alta e a parte baixa; o operador relata que em geral, em sua rotina, consegue manter os dois setores abastecidos. A rua dos Frades é a zona crítica; é comum que haja necessidade de fechar a parte baixa e a parte alta parcialmente, para que consiga abastecer essa rua e não gerar reclamação.

Possui 1.073 ligações, destas, 746 ativas.

Em caso de reclamações, a população aciona diretamente o operador, em seu celular particular, o que foi confirmado pela população entrevistada na comunidade, que argumenta que além da dificuldade de acesso ao escritório, o sinal de internet não é dos melhores na localidade e o operador Felipe é tratável, educado, mora na comunidade e muitas vezes é abordado em sua casa, no horário de descanso, sempre dispensando tratamento gentil e cordial aos usuários; a principal reclamação é falta de água.

Em Teodoro Sampaio, o poço que opera por mais tempo, opera 17 horas. Segundo relato do gerente local, há folga operacional e o manejo é todo feito pelo EL, diferente de Terra Nova, que depende de articulação com Amélia Rodrigues.

Buracica é uma localidade pertencente a Teodoro Sampaio, mas que é de responsabilidade do EL de Aramari, administrado pela Unidade Regional de Alagoinhas. Possui 324 ligações, sendo 233 ligações ativas.







Há um funcionário da prefeitura, "Seu Tuca", que é o incumbido de cuidar do distrito, o que inclui receber as reclamações referentes ao serviço de abastecimento de água. Há cerca de 800 habitantes; a água é abundante, com pressão forte, quase ninguém possui reservação e nunca falta água.

O poço tem vazão forte, quando a bomba para, a água jorra por cima dela. Ainda há muitos moradores sem hidrômetro, pagando pelo consumo mínimo; "Seu Tuca" relata haver desperdício por parte de quem se encontra nessa condição, muitas vezes necessitando de sua intervenção.







A coleta para análise é feita por Teodoro Sampaio, todo o restante da manutenção é de responsabilidade do EL de Aramari. Acontece de haver vazamentos e necessidade de manutenção corretiva; nesse caso, a intervenção por parte do EL demora muito para acontecer e na maioria das vezes, a própria equipe da prefeitura acaba fazendo o serviço.

A maior dificuldade é quanto à higienização do reservatório elevado, por estar situado em local íngreme e de difícil acesso. Estima-se que há pelo menos 5 anos que não é higienizado.





9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES

Conclui-se que o sistema avaliado apresenta condições de realizar o abastecimento municipal, necessitando realizar intervenções e melhorias em sua estrutura, a fim de adequar-se às normas e legislações.

Certos da importância da prestação dos serviços de abastecimento de água seguindo as normas e legislações, bem como os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e sua relevância para saúde da população, determina-se:

- As manobras em rede de distribuição de água deverão ser adotadas apenas como um recurso provisório, em condições em que o sistema esteja sofrendo com escassez hídrica ou problemas técnicos. Estando o município - sede e a localidade de Lustosa - em condição como a descrita, em que se justifique a real necessidade de implementação de manobras, a Prestadora deverá informar a está Agência Reguladora, apresentando um plano para resolução definitiva do problema e calendário de manobras para validação. Assim validado, a Prestadora deverá promover e difundir as informações juntos aos usuários, para que possam se adequar a oferta momentânea de água. **Tais determinações deverão ser atendidas em um prazo de 1 semana**.

- Considerando a dificuldade de acesso presencial ao EL, recomenda-se que a prestadora restaure **de imediato** o sinal de internet para possibilitar o acesso através do whatsapp local, como vinha funcionando.

- recomenda-se que a prestadora procure a Secretaria de Saúde para alinhamento da rotina de coleta de água para análise da qualidade.

- a prestadora deverá apresentar **em um prazo de até 30 dias**, alternativas para captação em Lustosa, considerando a situação do manancial, já bastante comprometido.

- o descarte **imediato** dos reagentes vencidos e redobrar a atenção para que não se repita a ocorrência.

- a colocação **imediata** das tampas das caixas de inspeção, devendo substituir por um modelo ergonômico, que favoreça o manuseio.



- que o EL de Aramari amplie a frequência de visita à localidade de Buracica, para que a assistência seja mais efetiva e assim, a correção dos problemas ocorra com maior eficiência.

- que a prestadora apresente um plano para ampliação do índice de hidrometração em Buracica, em um **prazo de até 30 dias**.

- que seja realizada a higienização do reservatório elevado de Buracica em **um prazo de até 30 dias,** devendo enviar para este ente regulador, os registros comprobatórios.

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA – Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia		
Autores: Guilherme Dourado e Télkia Rios	**Diretora de Fiscalização:** Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios	**Diretor Geral:** Walter Antonio de Oliveira Júnior
Assinaturas  data: 23/05/2022	Assinaturas  data: 19/01/2023	Assinaturas  data: 20/01/2023

AGERSA

ANEXOS

AGERSA

ANEXO A - LEGISLAÇÃO BÁSICA DE REFERÊNCIA

Apresenta-se um panorama da legislação básica do saneamento básico, a qual subsidia a atuação da Agência:

- **Constituição** da República Federativa do Brasil;

- Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020: **Atualiza o marco legal do saneamento básico;**

- Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007: **Política Nacional de Saneamento Básico;**

- Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010: **Regulamento da Política Nacional de Saneamento Básico;**

- Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005: **Lei de consórcios públicos;**

- Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: Lei de concessões;

- Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho de 1978: **Aprova as Normas Regulamentadoras - NR** - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

- Lei Complementar Estadual nº 41, de 13 de junho de 2014: **Lei de criação da entidade metropolitana;**

- Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012: **Lei de criação da AGERSA;**

- Resolução AGERSA nº 002, de 17 de JULHO de 2017: **Condições gerais da prestação dos serviços de água e de esgoto;**


- Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008: **Política Estadual de Saneamento Básico;**

- Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998: **Lei da obrigatoriedade de ligação à rede de esgoto.**

- Portaria de Consolidação n° 5 de 28 de setembro de 2017: **Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

CROQUI

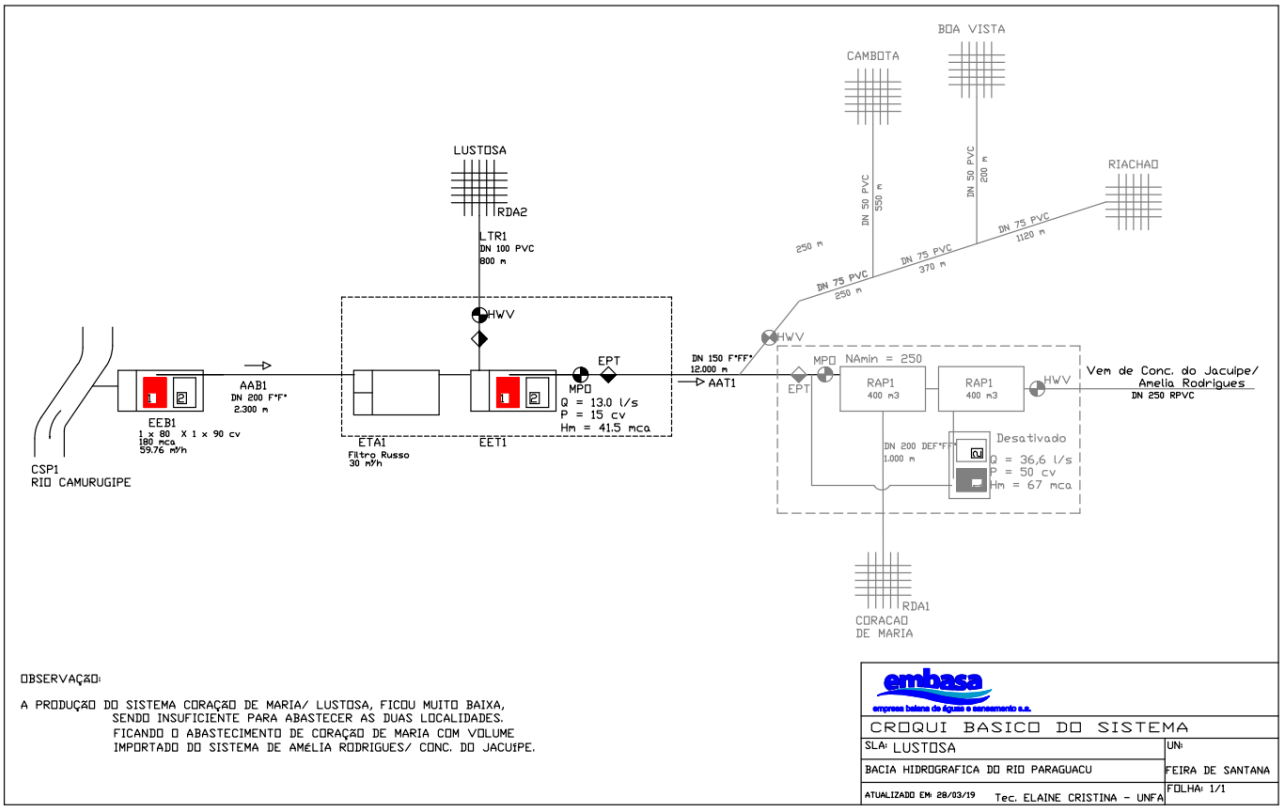

OBSERVAÇÃO:

A PRODUÇÃO DO SISTEMA CORAÇÃO DE MARIA/ LUSTOSA, FICOU MUITO BAIXA, SENDO INSUFICIENTE PARA ABASTECER AS DUAS LOCALIDADES. FICANDO O ABASTECIMENTO DE CORAÇÃO DE MARIA COM VOLUME IMPORTADO DO SISTEMA DE AMÉLIA RODRIGUES/ CONC. DO JACUÍPE.

embasa
empresa baiana de águas e saneamento s.a.

CROQUI BASICO DO SISTEMA	
SLA: LUSTOSA	UN:
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAGUACU	FEIRA DE SANTANA
ATUALIZADO EM: 28/03/19 Tec. ELAINE CRISTINA - UNFA	FOLHA: 1/1

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

OUTORGA

DIÁRIO OFICIAL
Republica Federativa do Brasil • Estado da Bahia

Salvador • Quinta-feira
26 de agosto de 1999
Ano LXXXIII • Nº 17.187

Superintendência de Recursos Hídricos
SRH

PORTARIA Nº386/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC **nº13.504.675/0001-10** com endereço à **Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA**, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do **Poços Tubulares** no entorno das coordenadas geográficas Lat.: **12º 18' 19" S** e Long.: **38º 38' 43" W**, para o Poço 1; Lat.: **12º 18' 19" S** e Long.: **38º 38' 43" W**, para o Poço 2; Lat.: **12º 18' 19" S** e Long.: **38º 38' 43" W**, para o Poço 3, para derivação durante **18:00** hs/dia (dezoito horas por dia) de até **750,00** m³/dia (setecentos e cinqüenta metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de **Teodoro Sampaio**, sendo que os três poços não devem operar simultaneamente. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO **Nº1104/99 - SRH**.

GABINETE DO DIRETOR GERAL, 25 de agosto de 1999

Milton Cedraz
Diretor Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

OUTORGA

DIÁRIO OFICIAL
Republica Federativa do Brasil • Estado da Bahia
Salvador • Quinta-feira
26 de agosto de 1999
Ano LXXXIII • Nº 17.187
43

154/99 – RECONHECER ao servidor UELITON MOREIRA DE ALMEIDA cadastro nº70100358-4, o direito a 01(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1994/1999, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

155/99 – RECONHECER ao servidor MARCELO NEGROMONTE BARRETO cadastro nº70100192-5, o direito a 01(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1991/1996, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

156/99 – RECONHECER ao servidor MÁRIO TADEU VIANA cadastro nº70100284-2, o direito a 01(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1991/1996, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

157/99 – RECONHECER ao servidor VANILDO BARRETO SANTOS, cadastro nº70100185-2, o direito a 03(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1994/1999, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

158/99 – RECONHECER à servidora ELIZETE ALMEIDA OLIVEIRA, cadastro nº70100206-0, o direito a 01(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1993/1998, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

159/99 – RECONHECER à servidora NEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, cadastro nº70100630-5, o direito a 09(nove)meses de licença prêmio, correspondente aos quinquênios 1982/1987, 1983/1993 e 1992/1997, sendo que 03(três)meses serão gozados no período de 01.09.99 a 29.11.99, ficando o restante para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

160/99 – RECONHECER ao servidor CARLOS ALBERTO SIHXAS DANTAS, cadastro nº70100567-8, o direito a 01(três)meses de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1991/1996, para gozo oportuno, tudo na forma do disposto no art. 107, da Lei 6.677/94.

161/99 – PERMITIR o afastamento do servidor JOÃO DA SILVA VASCONCELOS, cadastro nº70100568-6, no período de 21.08.99 a 21.09.99, para gozo de 01(hum)mês de licença prêmio, correspondente ao quinquênio 1991/1996, cujo direito já lhe fora reconhecido.

JORGE ARESTIDES TAVARES SANDE
DIRETOR PRESIDENTE

Centro Industrial do Subaé
CIS

PORTARIA Nº 031/99

O DIRETOR GERAL DO CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ – CIS, resolve:

Conceder Adicional por Tempo de Serviço com base no Art. 84 da lei 6677 de 26/09/94.

NOME	CADASTRO	ACRÉSCIMO	TOTAL	A PARTIR DE
DALMO MATOS VIEIRA	40274200-0	1%	8%	08/99
ELIANA MACEDO VAZ SAMPAIO	40274216-5	1%	18%	04/99
JOSÉ DANTAS DA SILVA	40274211-5	1%	26%	07/99
JOSÉ CLEBER OLIVEIRA SANTA ROSA	40274149-4	1%	8%	08/99
LOURIVAL SANTANA DO CARMO	40274210-7	1%	16%	05/99
MARIA ZULEIDE CRUZ DE ANDRADE	40274146-0	1%	15%	04/99
MARILZE NERY RIOS DE ARAÚJO	40274141-0	1%	8%	08/99

Em, 25 de agosto de 1999

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
Diretor Geral

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO

NOME	DATA DA ASSINATURA
BÁRBARA MYCHELLE SANTA ROSA DA SILVA	25/08/99
LEANDRO SILVA MORBRA	25/08/99
FLÁVIA CUNHA MENDES	25/08/99

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA

PORTARIA Nº 45 DE 25 DE AGOSTO DE 1999

O Diretor Executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

Constituir Comissão de Sindicância composta pelos servidores LUIZ CARLOS RODRIGUES TRINDADE, GERALDO JOAQUIM TELLES DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEIXEIRA REIS, para, sob a Presidência do primeiro,e no prazo de 30 (trinta) dias apurar os fatos constantes do Processo Administrativo AGERBA nº 003258/99.

Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA
Diretor Executivo

Superintendência de Recursos Hídricos
SRH

MORRO DO CHAPÉU / FEDEGOSO

PORTARIA Nº378/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Poço Tubular no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 37' 53" S e Long.: 41° 02' 33" W, para derivação durante 24:00 hs/dia (vinte e quatro horas por dia) de até 432,00 m³/dia (quatrocentos e trinta e dois metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de Morro do Chapéu/Fedegoso. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1102/99 - SRH.

JANGADA

PORTARIA Nº380/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Poço Tubular no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 37' 53" S e Long.: 41° 02'-33" W, para derivação durante 16:00 hs/dia (dezesseis horas por dia) de até 288,00 m³/dia (duzentos e oitenta e não menos cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de Cardeal da Silva/Jangada. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1102/99 - SRH.

CRISTÓPOLIS

PORTARIA Nº381/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Poços Tubulares no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 12° 14' 23" S e Long.: 44° 24' 54" W, para o Poço 1; Lat.: 12° 14' 17" S e Long.: 44° 25' 25" W, para o Poço 2, para derivação durante 24:00 hs/dia (vinte e quatro horas por dia) de até 429,00 m³/dia (quatrocentos e vinte e nove metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de Cristópolis. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1099/99 - SRH.

PORTARIA Nº382/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Nemias Carneiro Dourado e Neemias Ferdnan Dourado Carneiro**, CPF nº009.802.775-15 e 781.997.785-04 com endereço à Rua **Joaquim Augusto Dourado – João Dourado - BA**, autorizar por 04(quatro) anos prorrogável por mais dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH o direito de uso das águas do Poço Tubular no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 24' 09" S e Long.: 41° 32' 34" W, para derivação durante 10:00 hs/dia (dez horas por dia) de até 237,00 m³/dia (duzentos e trinta e sete metros cúbicos por dia). PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº974/99 - SRH.

PORTARIA Nº383/99 DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Paulo de Souza Novaes**, CPF nº047.734.205-10 com endereço à **Rua da Aurora nº13 – Presidente Dutra - BA**, autorizar por 04(quatro) anos prorrogável por mais dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH o direito de uso das águas do Poço Tubular, no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 17' 22" S e Long: 41° 59' 36" W, para derivação durante 10:00 hs/dia (dez horas por dia) de até 57,00 m³/dia (cinquenta e sete metros cúbicos por dia). PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº976/99 - SRH.

PORTARIA Nº384/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Fábrica de Gases Industriais Agro Protetores – FAGIP S/A**, CGC nº16.126.501/0001-96 com endereço à Largo do Papagaio nº18 - Salvador - BA, autorizar por 04(quatro) anos prorrogável por mais dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH o direito de uso das águas do **Poços Tubulares (04)**, no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 12° 55' 25" S e Long.: 38° 30' 10" W, para o Poço nº04, Lat.: 12° 55' 20" S e Long: 38° 30' 05" W, para o Poço nº05, Lat.: 12° 55' 13" S e Long.: 38° 30' 17" W, para o Poço nº06; Lat.: 12° 55' 19" S e Long.: 38° 30' 11" W, para o Poço nº07, para derivação durante 16:00 hs/dia (dezesseis horas por dia) de até 400,00 m³/dia (quatrocentos metros cúbicos por dia), para os 04 poços. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1240/98 - SRH.

DUAS BARRA DO MORRO

PORTARIA Nº385/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Poço Tubular no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 58' 02" S e Long.: 40° 57' 59" W, para derivação durante 24:00 hs/dia (vinte e quatro horas por dia) de até 317,00 m³/dia (trezentos e dezessete metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de Morro do Chapéu/Duas Barras do Morro. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1101/99 - SRH.

TEODORO SAMPAIO

PORTARIA Nº386/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Poços Tubulares no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 12° 18' 19" S e Long.: 38° 36' 43" W, para o Poço 1; Lat.: 12° 18' 19" S e Long.: 38° 36' 43" W, para o Poço 2; Lat.: 12° 18' 19" S e Long.: 38° 36' 43" W, para o Poço 3, para derivação durante 18:00 hs/dia (dezoito horas por dia) de até 750,00 m³/dia (setecentos e cinqüenta metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de Teodoro Sampaio, sendo que os três poços não devem operar simultaneamente. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1104/99 - SRH.

PORTARIA Nº387/99-DG
O Diretor Geral da Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, usando de suas atribuições, resolve revogar a pedido da FAGIP S/A, CGC nº15.126.501/0001-96, Portaria nº055/99 – SRH de outorga de uso das Águas de 04 poços tubulares, Publicada no DOE de 12/02/99. PROCESSO Nº1240/98 – SRH.

STA BERBARA

PORTARIA Nº388/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA**, CGC nº13.504.675/0001-10 com endereço à Av. Luiz Viana Filho s/n - Centro Administrativo da Bahia - BA, conceder por 30 (trinta) anos o direito de uso das águas do Rio **Paraguaçú** no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 12° 45' 25" S e Long.: 40° 19' 23" W, para derivação durante 24:00 hs/dia (vinte e quatro horas por dia) de até 22.245,00 m³/dia (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e cinco metros cúbicos por dia) com a finalidade de abastecimento humano no município de **Iaberaba/ Macajuba/ Baixa Grande/ Rui Barbosa**. PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta concessão sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1044/99 - SRH.

PORTARIA Nº389/99-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO: **Elisio Cardoso Santos**, CPF nº213.310.575-15 com endereço à **Fazenda Tanquinho - Lapão - BA**, autorizar por 04(quatro) anos prorrogável por mais dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH o direito de uso das águas do **Poço Tubular**, no entorno das coordenadas geográficas Lat.: 11° 21' 38" S e Long.: 41° 53' 02" W, para derivação durante 08:00 hs/dia (oito horas por dia) de até 117,00 m³/dia (cento e dezessete metros cúbicos por dia). PRAZO: 01 (hum) ano para execução de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto Federal nº24.643/1934, Decreto Estadual nº4.082/1995, Lei Estadual nº6.855/1995, Decreto Estadual nº 6296/1997 e Lei Federal nº9.433/1997 - PROCESSO Nº1105/99 - SRH.
