






2

EAP do Projeto

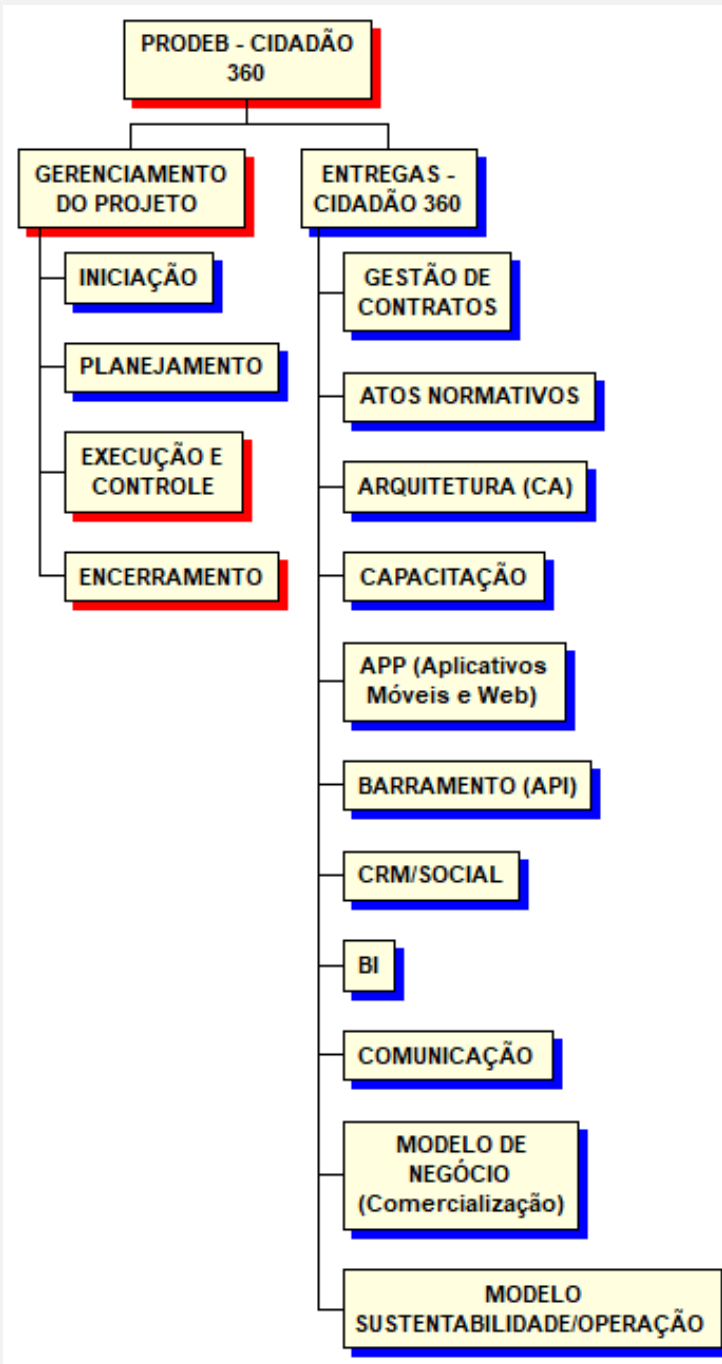

ESCOPO:
SAC, DETRAN,
SEFAZ e
OUVIDORIA



3

Entregas Realizadas do Projeto

EVENTO	DATA
INFRAESTRUTURA	
Arquitetura e Desenho da Solução	06.09.2017
Instalação Ambiente Desenvolvimento (fundação)	14.07.2017
Disponibilização do Serviço de Identidade e Autenticação (Desenvolvimento Escopo Mínimo)	21.07.2017
Modelagem de API (2 serviços) (Desenvolvimento Escopo Mínimo)	18.08.2017
Disponibilização da infraestrutura solicitada para API (Produção)	25.08.2017
CAPACITAÇÃO EQUIPE TÉCNICA	
CA API Gateway v9.x: Foundations 200	08.08.2017
CA Mobile API Gateway v2.x: Foundations 200	10.08.2017
Treinamento da API do Dynamics (hands on)	04.09.2017
APP (Aplicativos Móveis e Web)	
ANDROID - SAC	01.09.2017
BARRAMENTO (API)	
SAC	01.09.2017
CRM/SOCIAL	
Fundação	23.08.2017
Cadastro Único	31.08.2017



4

Marcos do Projeto

EVENTO	DATA (Previsão)
CONTRATOS	
TR TOTEM Licitado (Serviços de Terminais de Autoatendimento)	29.11.2017
ATOS NORMATIVOS	
Confecção do DECRETO (Contemplará também as Políticas TIC e e-GOV)	15.09.2017
INFRAESTRUTURA	
Modelagem de API (5 serviços) (Desenvolvimento Escopo Mínimo)	31.10.2017
Disponibilização da infraestrutura solicitada para SSO (Produção)	27.09.2017
Disponibilização da infraestrutura solicitada para DIRECTOR - Gestão de Identidades (Produção)	18.10.2017
Migração Serviços para Ambiente de Produção	28.11.2017
APP (Aplicativos Móveis e Web)	
PORTAL	
SAC	15.09.2017
DETRAN	17.10.2017
SEFAZ	31.10.2017
OUVIDORIA	17.11.2017
ANDROID	
DETRAN	03.10.2017
SEFAZ	19.10.2017
OUVIDORIA	06.11.2017
iOS	
SAC	26.09.2017
DETRAN	26.10.2017
SEFAZ	13.11.2017
OUVIDORIA	28.11.2017
BARRAMENTO (API)	
DETRAN	26.10.2017
SEFAZ	13.11.2017
OUVIDORIA	28.11.2017
CRM/SOCIAL	
SAC	24.10.2017
SOCIAL – OUVIDORIA	03.10.2017
DETRAN	30.10.2017
SEFAZ	30.10.2017
BI	
DEMANDA DO GOVERNADOR (1º Emprego; Partiu Estágio e Mais Futuro)	09.10.2017
DETRAN	23.10.2017
SAC	27.10.2017
OUVIDORIA	24.11.2017
COMUNICAÇÃO	
REGISTRO DA MARCA	02.01.2018
CAMPANHA	09.01.2018
JORNALISMO	10.01.2018
MODELO DE NEGÓCIO	
Modelo de Negócio aprovado	14.11.2017
MODELO SUSTENTABILIDADE E OPERAÇÃO	
Modelo de Sustentabilidade e Gestão (SGI)	27.11.2017
Modelo de Sustentação Técnica/Operação (PRODEB)	11.10.2017



- A indisponibilidade de acesso às bases de dados e sistemas dos Órgãos devido à falta de alinhamento estratégico ocasiona atraso no desenvolvimento das soluções e consequentemente na entrega dos serviços definidos;
- A não publicação dos instrumentos legais para legitimidade do projeto devido a não priorização da ação pelo Estado pode ocasionar indisponibilidade de acesso às informações dos Órgãos e consequentemente atraso no cronograma do projeto;
- A não dedicação dos órgãos/entidades, decorrente de outras atividades funcionais, pode ocasionar atraso nas entregas do projeto;

5

Principais Riscos



Obrigada!

Lorena Borges
Consultora de Projetos
APC | LPR | PRODEB
Tel.: (71) 3115-5791
lorena.borges@prodeb.ba.gov.br
